

△△△△△△ 상임감사

모범사례

제 목 다양한 생태체험 위한 저지대 체류시설 △△△ △△탐방원 조성
소 관 기 관 △△△△△△△사무소
내 용

가. 추진배경

- △△△△△△△ 인근에 대도시(△△광역시, △△특별자치시 등)가 입지하고 있음에도 불구하고 탐방객 및 미래세대를 위한 생태체험·전시·교육·정보 제공 등을 위한 공간이 없어 구.△△△도여성정책 개발원 부지에 이를 위한 △△탐방원을 조성

나. 추진내용

- [발생 문제] 사업부지에 기존 건축물이 존재하고 실시설계 시 지반조사 결과에 따라 터파기 토질을 전량 ‘토사’로 산정하였으나, 실공사 터파기 중 대량의 암반이 노출되었고, 시공사에서 즉시 자체 시험 결과에 따른 ① ‘경암’ 판정과 ②유압식할암공법* 적용을 제시하며 ③7억원 증액 설계변경 요구

* ‘22년 「△△ 진입도로 조성공사」 시 인접 민가·상가를 고려하여 해당 공법 사용


- [해결 ①] 통합건설사업관리단과 대책 협의하여 「암 판정 위원회」를 구성, 시료 5片을 채취하여 공인기관에 시험 의뢰한 바 총터파기 물량 11,941.7㎥ 중 풍화암 6937.7㎥ 및 풍화토 5004.0㎥로 최종 판정

- [해결 ②] 사업부지 반경 500m 내 민가 등 거주시설물이 전무하여 소음 및 진동 발생에 따른 안전사고 또는 민원 발생 우려가 없다 판단, 백호(1.0㎡)+ 대형브레이커 조합 절토공법으로 결정하여 시공
- [해결 ③] 사실상 '연암'에 가까운 토질 적용과 근거없는 실적단가를 근거로 제시한 시공사 설계변경안을 면밀히 검토하여, 건설공사품셈과 실제 토질에 근거한 일위대가 적용하여 터파기 증액 197백만원과 사토처리 증액 118백만원으로 재산출 합의하였으며, 이와 더불어 수소문하여 풍화암 일부(4,639㎡; 25Ton차량 433대분)를 골재비 정산(1대당 60천원)해 줄 업체((주)주안레미콘)를 찾아 26백만원 감액 정산함
- [해결(기타)] 법적인 근거와 계약변경 절차를 무시하고 터무니없는 설계변경을 요구하며 통합건설사업관리단과 마찰을 빚은 건축공사 현장소장을 공공기관 발주공사 수행에 부적합하다 판단하여 시공사에 정식 요구하여 2차공사 착공 전 교체함

다. 추진실적 및 성과

- △△△△△△△ 접근성이 좋고 관광인프라가 잘 조성되어 있는 △△△지구 초입에 △△탐방원을 조성함으로써 주로 탐방로 이용, 사찰 및 저지대 상권 방문이 주를 이루는 탐방 행태 속에 우리 공원만의 자연학습 및 탐방서비스를 누릴 수 있는 기회를 제공
- 토공사 중 노출 암반 처리 관련 시공사 설계변경 요구액 7억원을 289백만원 증액(減 411백만원)으로 설계변경 반영
- △△권 최초의 △△△△ △△탐방원을 조성함에 따라 지역사회에 △△탐방원 프리뷰 효과 및 인지도 제고로 속리산, 태안해안 등 후속 조성중인 △△탐방원

에도 많은 관심과 긍정적 영향 기대

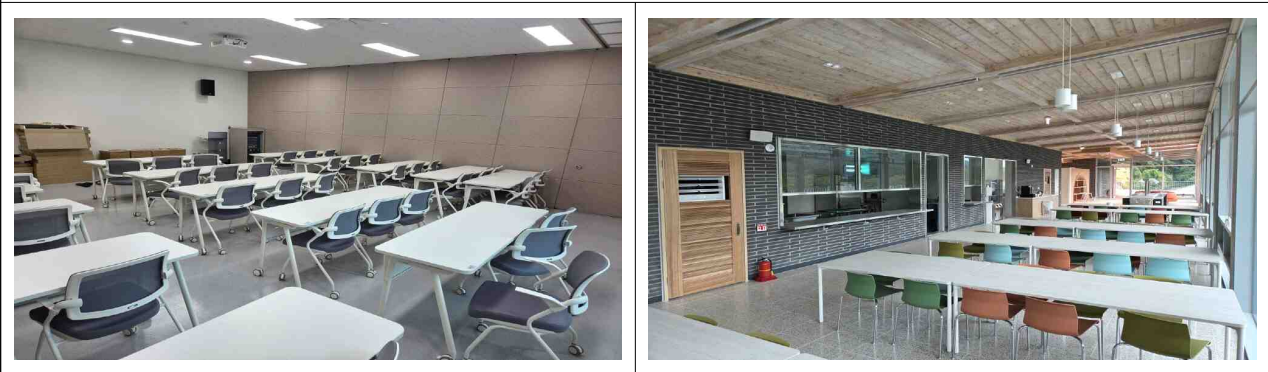

조치할 사항

[모범사례] 위 모범사례는 2026년도 내부감사 우수사례 평가에 반영될 예정이며, 동 평가에서 우수사례로 선정될 경우 감사실에서 직접 포상하거나 인사위원회에 포상을 △△ 할 예정이다.
