

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구

제 목 : [16] 연관사업 병행시공을 통한 투자비 절감

관 계 부 서 : 남부건설본부, 대구본부

조 치 부 서 : 남부건설본부, 대구본부


내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

대구본부와 남부건설본부(대구경북건설지사)는 장기 송변전설비계획에 의거 대구지역의 송전선로 과부하 해소 및 전력계통 보강을 위하여 2027년 12월 준공 목표로 345kV ○○□-♣*T/L 용량증대 선종교체공사 및 2028년 12월 준공목표로 154kV ♣*-⊠&T/L 건설공사를 시행하고 있다.

[그림 1] 송전 계통도



2. 관계 규정 및 판단기준


「공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따라 예산낭비 요소 발굴 등을 통해 지출 구조조정을 적극적으로 추진하여야 한다.

또한, 「송변전 공정관리 절차서」에 따르면 공정계획 수립 및 운영에 있어서 연관사업이 있는 경우에는 연관 프로젝트 수행부서와 사전협의하여 연관사업이 종합적으로 관리되도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

대구본부에서 시행중인 345kV ○○□-♣*T/L 용량증대 선종교체공사의 대상구간 중 일부구간(No.76~85, 4.3km)은 4회선 철탑으로써 상단은 기설 345kV ○○□-♣*T/L을 운영중이고, 하단은 [그림 2]와 같이 현재 철탑암이 비어있어 %☎☒ ○&□ 주관으로 철탑암에 가선작업을 통해 154kV ♣*-☒&T/L 건설공사를 시행할 계획이다.

[그림 2] 345kV ○○□-♣*T/L No.76~85 구간 철탑 전경

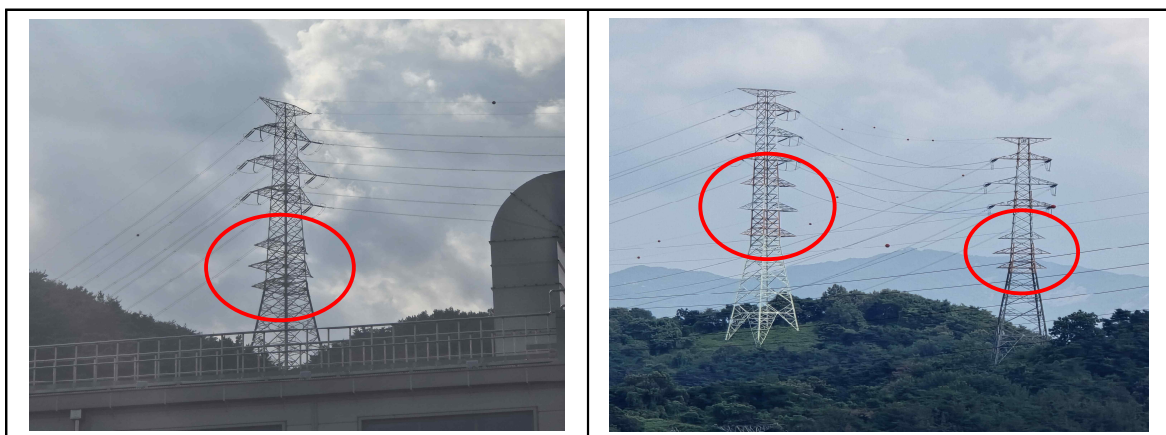

위 2개 사업은 시행 사업소가 달라 병가 구간을 각각 시공하게 되면 발받침 설치, 진입로 및 작업장 개설 비용 등 공사비용이 중복으로 투자되고 그에 따른 작업기간이 개별 소요되는 등 문제점이 있어 상호 일정 협의를 통해 병행 시공

함으로써 공사비 절감 및 작업일정 단축 등 사전 협의가 필요하다고 판단된다.

비록 준공목표가 1년 차이 나지만, 상호 일정 협의를 통해 작업시기를 조율한다면 공사에 수반되는 부대비용을 절감할 수 있을 것으로 판단된다.

[표 1] 병행시공에 따른 절감금액

(단위: 원)

항목	재료비	노무비	경비	일반관리비	이윤	합계
절감금액	10,847,184	115,921,196	30,591,505	7,867,994	23,152,121	188,380,000

관계부서 의견

대구본부와 남부건설본부 업무담당자는 동일 작업구간에 대하여 연관사업 담당자와 향후 작업일정 상호협의를 통해 순차 시공함으로써 공사비용을 절감할 계획이라고 답변하였다.

조치할 사항

대구본부장은 남부건설본부장과 협의하여 동일 작업에 대한 중복투자가 최소화될 수 있도록 작업계획을 변경 후 추진하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
16	개 선 1	예산절감 [188,380,000원]	-	남부건설본부 대구본부	남부건설본부 대구본부
