

[14] [시정] 사항

1. 제 목 : 대피공간 방화구획 설계 및 시공 부적정
2. 조치부서 : 경남지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

‘(주)엔에치에프 제9호 공공임대 개발 전문 위탁관리 부동산 투자회사(이하 “공공임대리츠 제9호”라 한다)’는 2016. 7. 27. **□□□□**주식회사 외 7개 회사¹⁾와 기술공모형입찰²⁾ 방식으로 (공공임대리츠)◇◇◇◇3지구 S-1BL 아파트 건설공사 3공구 계약을 체결하였다.

공공임대리츠 제9호의 입찰안내서 ‘제1장 일반사항’에 따라 계약상대자는 계약 상대방이 작성한 설계도서의 오류·누락, 상호모순 사항이 발견되거나, 관련 법령 등에 위배될 경우 이를 즉시 수정·보완하여야 하며, 이에 대한 비용은 계약상대자의 부담으로 하도록 하고 있다.


「건축법 시행령」 제46에 따르면 아파트 4층 이상에 설치하는 대피공간은 내화 구조로 된 바닥·벽 및 갑종방화문(이하 “방화구획”이라 한다.)으로 구획하여야 한다.

1) (주)외코퍼레이션, (주)종합건축사사무소 h h, (주)평평평엔지니어링건축사사무소, 주식회사ㅍㅍ건축사사무소, 주식회사ㄹㄹ종합건축사사무소, 주식회사ㅇㅇㅇㅇ단, ㅇㅇ엔지니어링(주)
2) 발주기관이 작성하여 교부한 기본설계서와 입찰안내서에 따라 입찰자가 공사비 절감방안, 공기단축 방안, 공사관리방안 등을 제안하는 기술제안서를 작성하여 입찰서와 함께 제출하는 입찰로서, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제98조에 따른 기본설계 기술제안입찰방식이다.

또한, 「발코니 등의 구조변경절차 및 설치기준」 제3조서는 대피공간에 창을 설치하는 경우에는 비상시 외부의 도움을 받을 경우를 대비하여 피난에 장애가 없는 구조로 설치하도록 규정하고 있다.

그런데 (공공임대리츠)◇◇◇◇3지구 S-1BL 아파트 건설공사 3공구에서는 대피공간에 창을 설치하면서 [그림 1]과 같이 가연성 단열재와 창틀이 맞닿도록 계획 및 시공하였다.

[그림 1] 대피공간 벽체 설계 현황

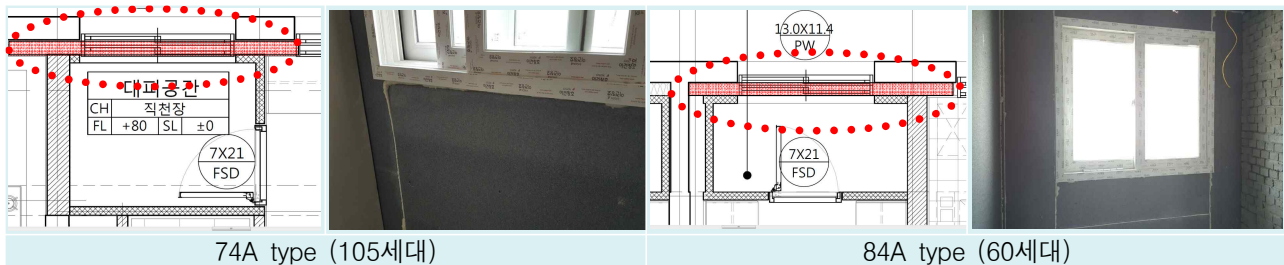

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

* 붉은색 음영()은 가연성 단열재(THK 100 비드법보온판2종3호) 설치 구간임

이에 따라, 화재가 발생할 경우 실내의 다른 부분과 연결된 가연성 단열재의 연소 및 가연성 단열재와 맞닿은 창틀의 연소가 불가피한 것으로 판단된다.

그 결과, 대피공간이 관련 규정에 따라 적절하게 방화구획으로 구획되지 않아 화재 발생시 화염이 대피공간으로 확산되어 입주민의 안전을 담보할 수 없으며, 창틀의 연소로 인해 피난시 장애 발생이 우려된다.

5. 조치할 사항

경남지역본부장은

계약상대자에게 계약상대자의 부담으로 대피공간이 관련 규정에 따라 적정하게
방화구획으로 구획될 수 있도록 보완 시공을 요구하시기 바랍니다(시정).
