

수범사례	제목 : 순환아스콘(건설안전시험사업소) 반입으로 공사비 절감
-------------	--

「부산 에코델타시티 2단계 2공구 조성공사」의 공사용가도(제도로 대체도로) 구간 포장공에 소요되는 기층용 아스콘(지급자재)에 대해 市 건설안전시험사업소에서 생산하는 순환아스콘을 무대 반입하여 자원재활용 및 공사비(지급자재) 절감에 기여함

□ 필요성(현안문제점)

- 「부산 에코델타시티 2단계 2공구 조성공사」의 공사용가도(제도로 대체도로) 구간 포장공에 기층용 아스콘(2,508ton)이 지급자재로 설계되어있음
- 폐아스콘 자원재활용을 통한 온실가스 감축 등 환경개선에 기여하고 공사비 절감을 위해 市 건설안전시험사업소에서 생산하는 순환아스콘을 무대반입 사용필요

□ 개선사항


- 「부산 에코델타시티 2단계 2공구 조성공사」공사용가도의 기층용 아스콘의 50%(1,307ton)를 市 건설안전시험사업소에 순환아스콘 반입 요청('18.10월)하였으며,
- 市 건설안전시험사업소 플랜트 생산량이 제한되어 있어 원활한 현장 반입에 어려움이 있으나,
- 市 건설안전시험사업소와 적극적으로 협의('18.9월 ~ '18.10월)하여 市 건설안전시험사업소에서 생산한 순환아스콘(1,323ton)을 당 현장에 무대(자재비) 반입하여 공사비 절감

□ 개선효과


- 「부산 에코델타시티 친수구역 조성사업」2단계 2공구 공사용가도(제도로 대체도로) 포장공에 市 건설안전시험사업소의 순환아스콘을 무대반입을 함으로써 공사비(지급자재비)를 절감(46,278천원)에 기여하고 적기에 공사용가도 개통하여 인근 마을 통행민원을 사전예방하였음

□ 시공도면 및 시공사진

○ 위치도

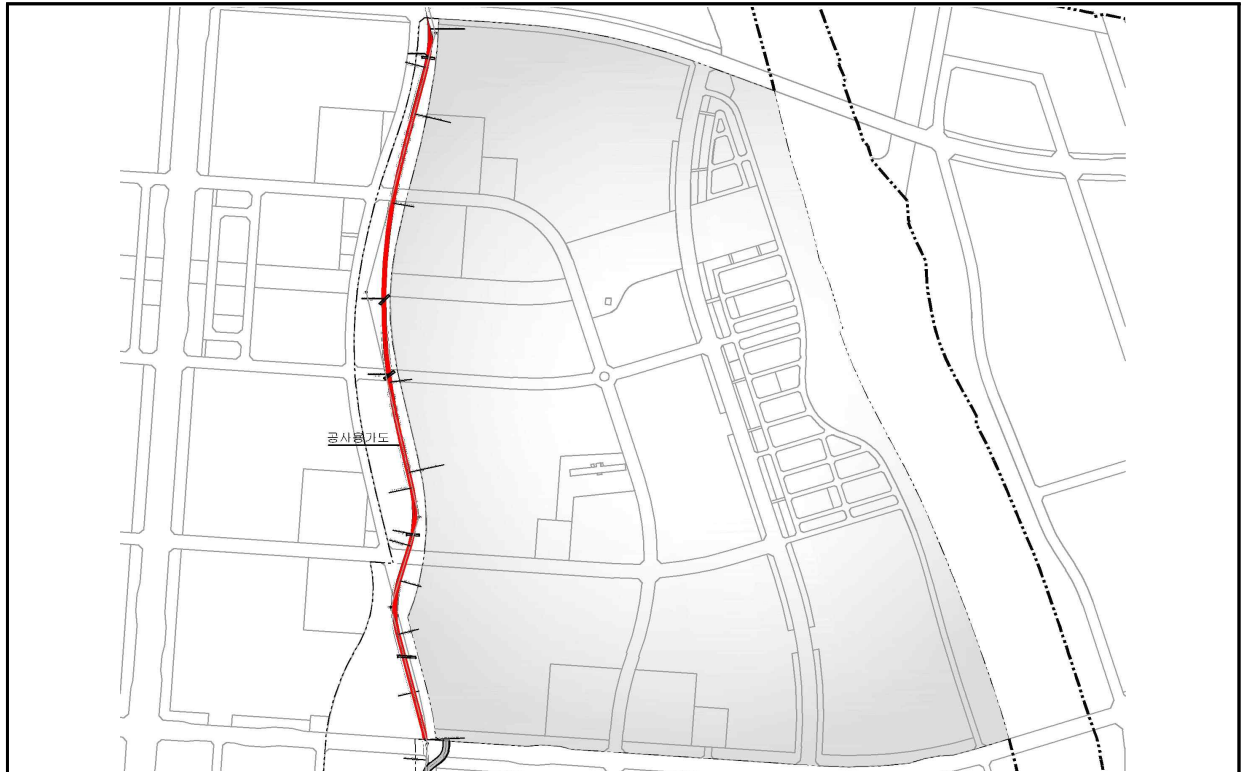

○ 시공사진

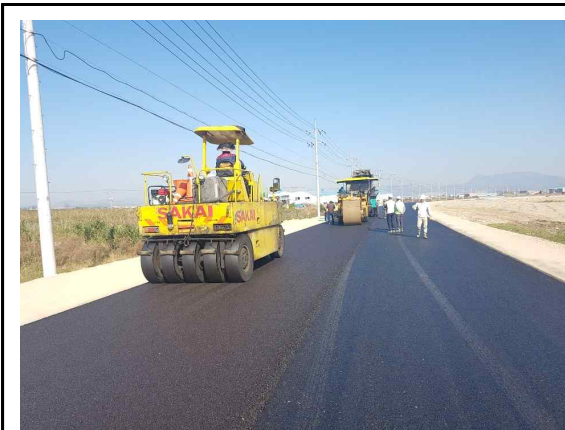

《 계량 전표 》

차량번호 : 6493
 계량일시 : 2018/10/23 000012
 거래처 : 부산도시공사
 납품장소 : 부산 예곡물타시타 2차
 제품명 : 순환88-2(기중용)
 상차시간 : 08:00:56
 중량 : 40,140 kg
 중량일시 : 08:00:56
 임시중량 : 13,900 kg
 중량일시 : 08:00:56
 계 : 0 kg
 동원상 김성현
 관인 박민
 건설안전시험사업소
 Tel : (051) 550-7285, 7366

《 계량 전표 》

차량번호 : 7348
 계량일시 : 2018/10/23 000013
 거래처 : 부산도시공사
 납품장소 : 부산 예곡물타시타 2차
 제품명 : 순환88-2(기중용)
 상차시간 : 08:11:04
 중량 : 39,670 kg
 중량일시 : 08:11:04
 임시중량 : 14,500 kg
 중량일시 : 08:11:04
 계 : 26,240 kg
 동원상 김성현
 관인 박민
 건설안전시험사업소
 Tel : (051) 550-7285, 7366

