

## 주의 및 시정요구

제 목            검사대상 전환시설 검사업무 처리 부적정

관 련 부 서       강원광역본부

관 련 자        4급 ○○○(現 ○○○○지사), 4급 ○○○(現 ○○○○지사)

내 용

### 1. 업무 개요

강원광역본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 강원도 ○○시, ○○시 등 2개시 3개군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있다.

강원광역본부는 관내 도시가스사용시설인 OO빌딩 외 2개소에 대한 검사 업무를 실시하면서 신규 시설을 제외한 기존 시설(지하매설배관, 입상관 등)을 검사대상에 포함시키지 않고 서류심사(기술검토) 및 시설검사를 진행하고 그 결과를 “적합”으로 처리하였다.

### 2. 관련규정 및 판단기준

사규 「도시가스시설 검사업무처리지침(2302-1)」 제4-28조 제1항 및 제3항에 따라 가스사용량의 증가로 인하여 특정가스사용시설로 전환되는 시설은 기존 시설을 포함한 전체 시설에 대하여 기술검토를 실시하여야 하며, 기존 시설은 정기검사 기준에 준하여 검사하고 신설된 부분은 완성검사 기준을 적용하여 검사하도록 하고 있다.


한편, 상세기준(KGS Code를 말한다) KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 2.8.10항 및 4.2.2.2.1항에 따르면 지하에 매설하는 강관에는 부식으로 인한 악영향을 방지하기 위하여 KGS GC202(가스시설 전기방식 기준)에 따라 전기부식방지조치를 하여야 하는데, KGS FU551 4.2.2.2.1항 및 「도시가스시설 검사업무 처리지침」 제5-18조, 「전기방식 검사업무지침」 제18조에 따라 정기검사 시 전위측정기를 사용하여 전기방식조치의 적정 여부를 확인하도록 하고 있다.

따라서, 강원광역본부는 신규 시설의 설치로 인해 특정가스사용시설로 전환되는 검사대상 전환시설에 대한 검사업무를 수행할 경우, 기존 시설에 대해서도 기술검토를 하여야 하고 또한 정기검사 기준을 준용하여 완성검사를 실시하여야 하며, 특히 기존에 설치된 지하매설배관(강관)이 있을 경우 해당 시설의 방식전위를 측정하여 전기방식조치의 적정 여부를 확인하여야 한다.

#### 전기방식 검사업무지침(2306)

##### 제12조(방식전위 측정 및 기록)

- ① 전위 측정은 전위측정기를 사용해 다음 그림1과 같이 측정하여 평균전위를 시설검사 결과등록(가스피아/스마트온)에 기록하고, 측정지는 출력·보관한다.

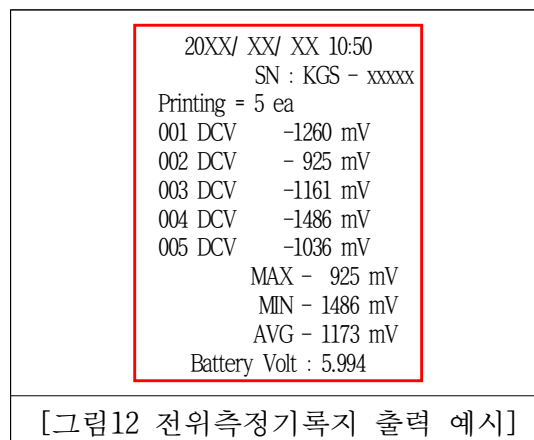

- ② 방식 전위는 전위측정기를 사용하여 측정하고 5회 이상 출력한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 강원광역본부 관련자(4급 ○○○, 4급 ○○○ 차장)는 감사대상 기간 (2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.) 동안 관내 ○○빌딩 등 검사대상 전환시설 3개소에 대한 기술검토를 처리하면서 기존 시설(지하매설배관, 입상관 등)에 대한 기술기준 설명서를 징구하지 않았으며, 기술검토 결과표상에도 “해당없음”으로 기록한 후 기술검토 결과를 “적합”으로 처리하였다.

또한, 해당 시설에 대한 완성검사를 수행하면서 지하매설배관 및 입상관 등 기존 시설에 대한 검사항목에 “해당없음”으로 기록한 후 검사결과를 “적합”으로 처리하였고, 특히 ‘○○○○○○○○○ 외 1’의 경우에는 해당 시설에 지하매설배관(강관)이 설치되어 있음에도 완성검사 및 차기년도 정기검사 시 전기방식 조치(희생양극법)의 적정성을 확인하기 위한 방식전위를 측정하지 않은 채 검사결과를 “적합”으로 처리하였다.

[표 1] 기술검토 및 완성검사 시 기존시설 미확인 내역

| 연번 | 업소명<br>(시설번호) | 업무구분 | 접수번호<br>(검사일자) | 확인된 문제점                                                         | 검사원 |
|----|---------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | A             | 기술검토 | *****          | • 기존 시설(지하매설배관, 입상관 등) 기술기준설명서 미징구<br>• 결과표에 “해당없음”으로 기록 후 적합처리 | ○○○ |
|    |               | 완성검사 | *****          | • 기존 시설 미확인(검사표 상 “해당없음”으로 기록) 후 검사결과 “적합”으로 처리                 |     |
| 2  | B             | 기술검토 | *****          | • 기존 시설(지하매설배관, 입상관 등) 기술기준설명서 미징구<br>• 결과표에 “해당없음”으로 기록 후 적합처리 | ○○○ |
|    |               | 완성검사 | *****          | • 기존 시설 미확인(검사표 상 “해당없음”으로 기록) 후 검사결과 “적합”으로 처리                 |     |

| 연번 | 업소명<br>(시설번호) | 업무구분 | 접수번호<br>(검사일자) | 확인된 문제점                                                                                                                             | 검사원 |
|----|---------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3  | C             | 기술검토 | *****          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기존 시설(지하매설배관, 입상관, 방식전위 등) 기술기준설명서 미징구</li> <li>• 결과표에 “해당없음”으로 기록 후 적합처리</li> </ul>       | ○○○ |
|    |               | 완성검사 | *****          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기존 시설 미확인(검사표 상 “해당없음”으로 기록)</li> <li>• 지하매설배관(강관) 방식전위 미측정 상태에서 검사결과 “적합”으로 처리</li> </ul> |     |
|    |               | 정기검사 | *****          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지하매설배관(강관) 방식전위 미측정 상태에서 검사결과 “적합”으로 처리</li> </ul>                                         |     |

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사-시설검사결과-결과등록-시설검사결과등록(검사원) 및 제출 검사철 자료 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 강원광역본부장은

① 특정가스사용시설 검사대상 전환시설에 대한 기술검토 및 완성검사 등을 수행할 때 기존 시설에 대한 적정성을 확인하지 않고 검사결과를 적합으로 처리하는 등 검사업무를 소홀히 한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하고, 동일한 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 강원광역본부 4급 ○○○(現 ○○○○지사)

강원광역본부 4급 ○○○(現 ○○○○지사)

② 또한, 위 [표 1]의 방식전위 측정을 누락한 시설에 대해서는 방식전위를 측정하여 지하매설배관(강관)의 부식방지조치가 적정한지를 확인하고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)
