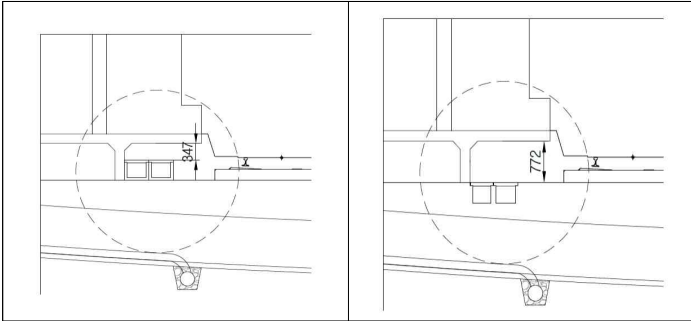


번 호	지 적 사 항	자체처리내용
03	<u>제목 : 승강장 밑 공동관로 유지관리 공간확보 필요</u> ○ 조치부서 : [REDACTED] ○ 지적사항 [REDACTED] (역)시설의 승강장 밑 공간에 설치되는 공동관로와 승강장 바닥면 사이 (공동관로 상부공간)가 협소해 공동관로에 케이블 포설(시공) 및 유지관리에 불편함이 예상됨 인터페이스 협의(2회) 및 실시설계 VE를 통하여, 유지관리가 용이하게 공동관로를 매립(여유높이 34cm→77cm)하여 설치하는 것으로 개선되었음 [그림] 공동관로 유지보수 공간확보 현황 	[REDACTED] 본부장은 향후, 철도건설사업 설계 시 저상홈 승강장 하부에 공동관로가 설치될 경우 공동관로 상단을 F.L(시공기면)에 맞추어 유지보수 공간을 최대한 확보할 수 있게 참고도 등을 개정할 수 있도록 조치
