

일련번호 제25-021-모범-02호

한국가스공사 상임감사위원 모 범 사 례

제 목 기존배관 존치에 따른 예산절감 및 안전사고 예방
소 관 부 서 ㉠지역본부 ㉡부
조 치 부 서 ㉢처 ㉣부
내 용

㉠지역본부 ㉡부는 「직제규정시행세칙」 별표 2 “분장업무”에 따라 관할지역 배관이설공사 관리업무를 담당하면서 “㉤㉥ 배관이설공사(계약상대자: UU(주), 계약기간: 2023. 7. 19. ~ 2024. 4. 30., 이하 “배관이설 공사”라고 한다)” 관리업무를 수행하였다.

公社의 “㉦㉧ 건설공사” 당시(‘07년11월 ~ ‘10년7월) ♣♣시는 같은 구간 “㉨㉩ 도로 개설공사”를 먼저 계획하고 있었으나 세부설계 미확정 상태로 주배관 건설공사의 선시행이 필요하였다.


이에 추후 배관이설 필요 시 公社가 비용을 부담하는 조건으로 주배관 건설공사를 먼저 시행하는 협약서¹⁾를 ♣♣시 ♥♥본부와 당시 ㉠지역본부 간에 체결²⁾하였고, ♣♣시 ♥♥본부는 ‘22년8월 해당 협약서를 근거로 “㉪㉫도로건설공사”(‘22년3월 ~ ‘25년12월)에 저촉되는 가스배관의 이설을 요청을 하였다.

1) ♣♣시 시행 “㉨㉩ 도로개설공사” 구간내 한국가스공사 시행 “㉦㉧ 건설공사”의 천연가스 주배관 건설공사 시행에 따른 협약서(2010년1월)

2) ㉠지역본부 조직 신설 전 ㉤㉥ 건설공사는 ㉠지역본부 소관 이었음

이후 ㉠지역본부 ㉡부는 ‘22년12월 “㉢㉣ 배관이설공사” 발생확정 보고 등 준비과정³⁾을 거쳐 ‘23년10월 배관이설 공사를 착공하였으며 공사개요는 [그림 1]과 같다.

[그림 1] ㉢㉣ 배관이설공사

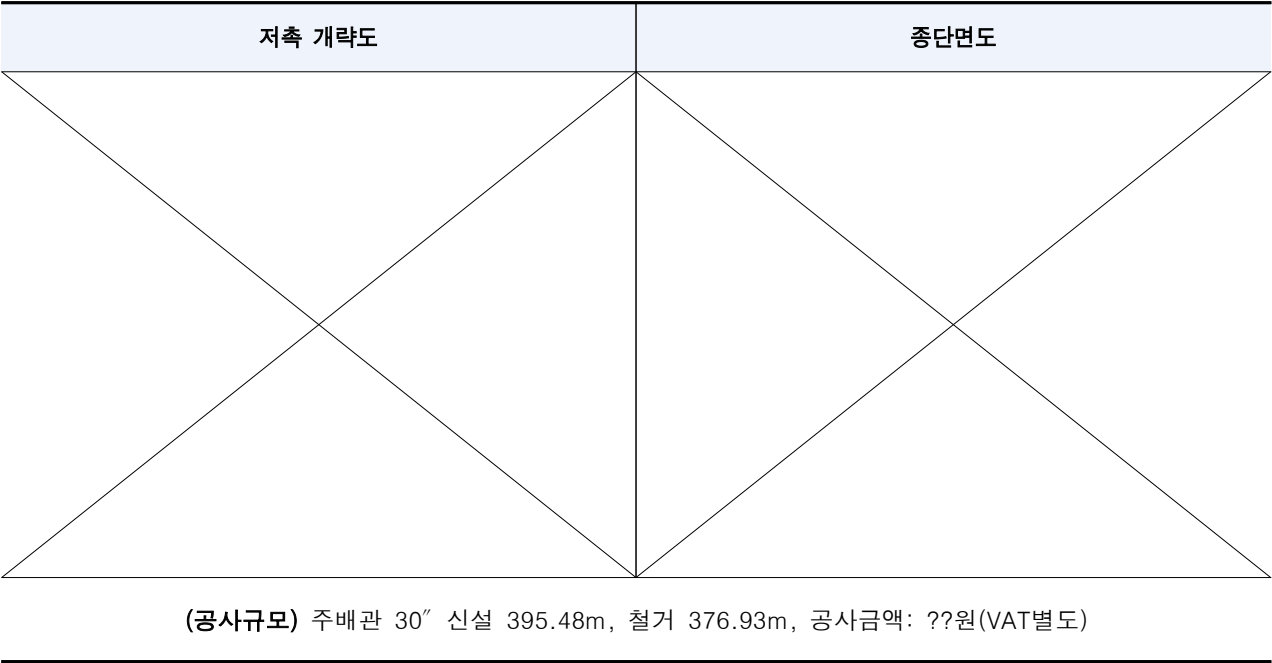


자료: ㉠지역본부-8307 “㉢㉣ 배관이설공사 발생보고” 및 ㉠지역본부-3502 “[긴급] ㉢㉣ 배관이설공사 시행”재구성

그런데 배관이설공사 현장은 ㉤㉤지하차도 공사로 인한 공간협소, 도심지 지하 매설물 및 교통량 과다, 기존 압입구간 매설배관 고심도 등 복합적 요소들에 의해 시·공간적 제약 등 난공사가 예상되었으며, 배관이설공사 관련 건설 및 교통사고 등의 안전사고 발생과 각종 민원발생이 우려되었다.

이에 동부서는 지하차도와 직접 저촉되는 약 20m를 제외한 기존배관 357m철거공사를 제외시킴으로써 위에 열거한 우려를 감소시키고 철거 관련 예산을 절감하고자 [표 1]과 같이 관련업무를 추진하였다.

3) 배관이설기본계획 반영, 심의위원회, 발생보고, 설계 및 공사계획승인(산업부), 건설공사 발주, 도로굴착 심의 및 도로점용허가 등

[표 1] 기존배관 존치(점용연장) 추진 절차

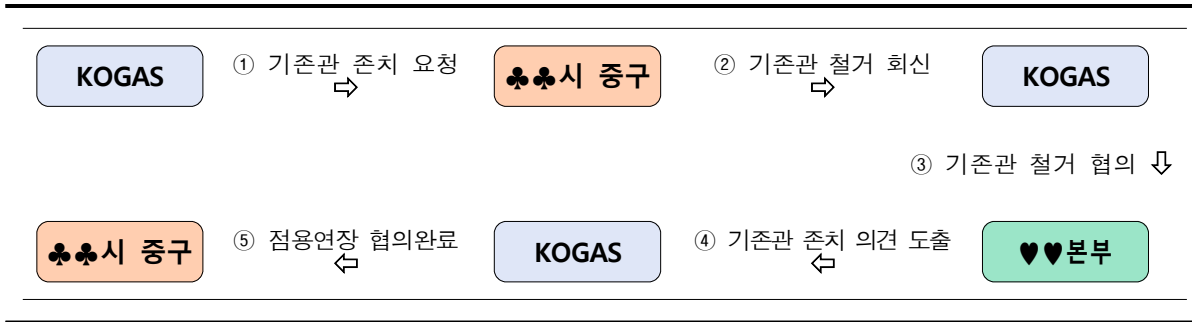

※ **♣♣시 ♥♥본부** : 지하차도 시행자, **♣♣시 ♥♥청** : 도로점용 허가권자

구체적으로 동부서는 도로점용허가권자인 **♣♣시 ♥♥청**에 **♣♣시 ♥♥청**에 **♣♣시 ♥♥청**에 공사로 인한 차선통제와 우회로에 따른 교통량증가 및 혼잡여건 등의 사유로 기존배관 존치 협조 요청⁴⁾을 하였으나 **♣♣시 ♥♥청**은 원상회복 의무면제 부적합 의견 및 구체적 복구계획서 제출을 요구⁵⁾하였다.

그럼에도 불구하고 동부서는 지하차도 건설공사 관계자인 **♣♣시 ♥♥본부**(발주청), 시공사 및 건설사업관리 용역사와 가스배관 철거공사 시 예상되는 문제점⁶⁾에 대해 협의 하였으며 기존배관을 존치하는 것이 지하차도 공사 등에 유리하다는 의견을 도출하였고 이를 바탕으로 지하매설물 및 교통량과다, 매설배관의 고심도, 교통사고 및 각종 민원발생 우려에 대하여 **♣♣시 ♥♥청**과 재협의⁷⁾ 하였다.

그 결과 도로점용 종료시 원상회복이 원칙임에도 허가권자 및 지하차도 건설공사 관계자들과 적극 협의하여 [그림 2]와 같이 기존배관 약 357m를 점용기간 연장 후 존치시킴으로써 건설 및 교통사고, 민원발생 등을 예방하고 [표 2]와 같이 약 ??원(VAT포함)의 공사비를 절감 하였다.

4) **♣♣시 ♥♥청**-1997 “**♣♣시 ♥♥청** 배관이설공사 관련 기존 가스배관 존치 협조 요청”

5) **♣♣시 ♥♥청**-8442 “**♣♣시 ♥♥청** 배관이설공사 관련 기존 가스배관 존치 협조에 따른 회신”


6) 지하차도 공사와 연계한 철거공사 시기조율의 어려움, 안정화된 지반 교란 등 도로공사 하자

7) **♣♣시 ♥♥청**-3334 “**♣♣시 ♥♥청** 배관이설공사기존 가스배관 철거계획 변경 알림”

♣♣시 ♥♥청-21701 “**♣♣시 ♥♥청** 배관이설공사 기존 가스배관 철거 관련 의견 회신”

♣♣시 ♥♥청-4937 “**♣♣시 ♥♥청** 배관이설공사 기존 가스배관 존치확정 관련 회신”

[그림 2] 공기존배관 존치(도로점용연장) 위치도



자료: ㉠지역본부-6510 “도심지 배관이설공사 기존배관 존치에 따른 안전사고 예방 및 예산절감” 일부 발췌

[표 2] 공사비절감 금액

철거 공사구분	내용	절감금액(단위: 원)
직접공사	굴착 및 가시설, 배관절단 등	??
폐기물처리	도로 건설폐기물	??
합계		??

자료: 소관부서 제출 확인서 “기존배관 존치에 따른 예산절감 및 안전사고 예방” 재구성

조치할 사항 △처장은

위 모범사례를 널리 알리고, 위 부서에 대하여는 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 통보(모범사례)]

㉠지역본부 ★부
