

○○○○공단 상임감사

시정, 통보

제 목 재난취약지구 낙석방지책 단부구간 기초 보강 필요

소 관 기 관 ○○○○○○○사무소

조 치 기 관 ○○○○○○○사무소

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

○○○○○○○○사무소에서는 ○○○○○○○ 내 탐방방로중 낙석위험지역에 안전시설물 등을 설치하여 추가 훼손을 방지함으로서 공원자원 보호 및 탐방객의 안전과 편의를 제공하기 위하여 매년 ○○○○○○○ 재난취약지구 정비공사를 시행하고 있다.

이에 따라 2023년도에는 아래 [표1]에서와 같이 「2023년 ○○○○○○○ 재난취약지구 정비공사」를 추진하면서 급경사지 낙석위험지역에 대하여 3개 구간에 낙석방지책을 설치하였다.

[표1] 2023년 ○○○○○○○ 재난취약지구 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주요 사업내용	사업비(천원)	계약업체
2023년 ○○○ 재난취약지구 정비공사	2023. 7. 18. ~ 2023. 12. 4.	- 교량정비, 낙석방지책 설치, 목재계단 등	329,164	주식회사 ○○건설기술단

2. 관계법령 및 판단기준


공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「2023년 ○○○ 재난취약지구 정비공사」에 준공도서(내역서 및 준공사진) 및 현장을 확인한 결과, 낙석방지울타리 설치 3개소 ○○계곡 56m(표준 26경간, 단부 2경간), ○○폭포 30m(표준 13경간, 단부 2경간), 자연관찰로 30m(표준 13경간, 단부 2경간)에 대한 도면에는 아래 [그림1]에서와 같이 단부구간 기초부가 일체형으로 시공되어야 하나 준공검사 시 [그림2]에서 처럼 기초부 시공이 표준 구간처럼 시공되어 있어 미시공된 부분에 대하여 단순 정산처리만 하였다.

[그림1] 2023년 ○○○○○○○○ 재난취약지구 정비공사 설계도면

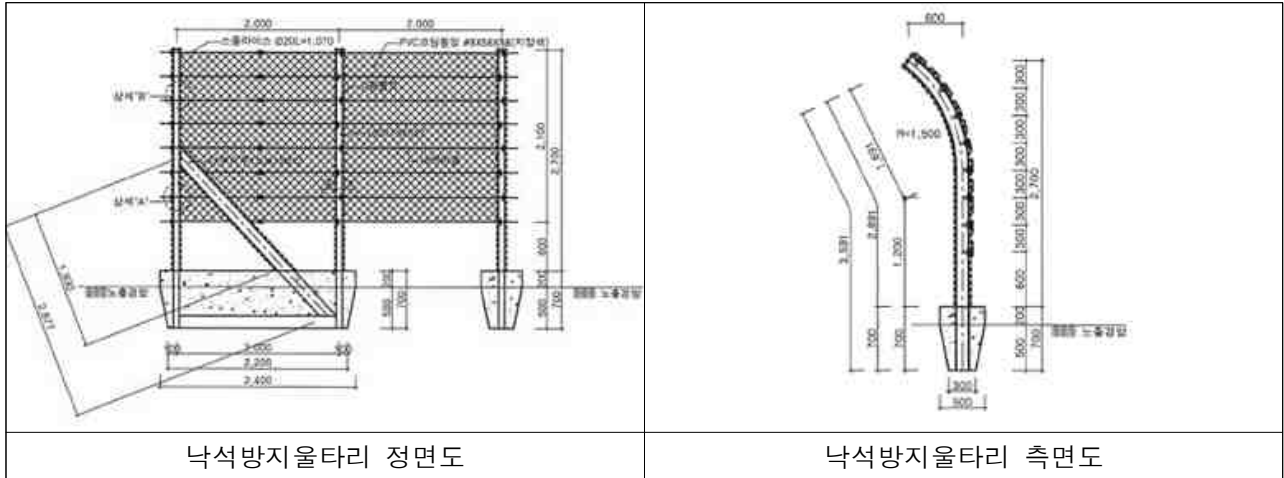

[그림2] 2024년 ○○○○○○○○ 재난취약지구 정비공사 낙석방지울타리 단부구간 현황



그러나 낙석방지책 단부구간 기초부 시공이 표준구간과 동일하게 설치되어 구조적 안전성이 확보되지 않은 단부구간(6경간)에 대해 추가 구조물 안전성 강화를 위하여 기초부 보강을 할 필요가 있다.

4. 관련부서 의견

○○○○○○○○사무소는 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

○○○○○○○○사무소장은 낙석방지책 단부구간 기초부 시공이 표준구간과 동일하게 설치되어 구조적 안전성이 확보되지 않은 단부구간(6경간)에 대해 추가 구조물 안전성 강화를 위하여 기초부를 보강하시기 바랍니다.(시정)

○○○○○○○○사무소장은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)
