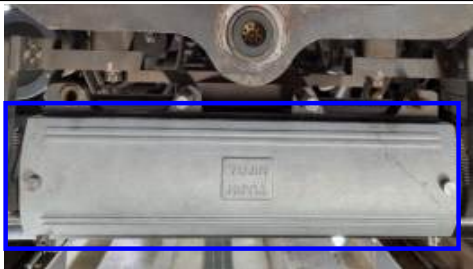


(1) 추진배경

- 2022. 6. 23.(목) 204편성 하선 운행 중 출입문 열림 고장 및 타임아웃 발생
- 원 인 : 전기연결기 고무패킹과 커버 간 밀폐불량으로 빗물 유입

(2) 추진실적

- 전동차 전기연결기 커버 개선품 교체
 - 기 간 : 2023. 6. 5. ~ 7. 25.
 - 대 상 : 전동차 43대(전기연결기 86EA)
 - 소요예산 : 15백만원
 - 내 용
 - 고무패킹 신품 교체
 - 전기연결기 커버 개선품(접촉면 정밀가공 제품)으로 교체

구 분	개선 (前)	개선 (後)
커버 신규 제작		
커버 접촉면 정밀 가공		

(3) 추진성과

- 전동차 전기연결기 커버 개선품 교체 이후 빗물유입으로 인한 고장 미발생
- 전기연결기 빗물유입 차단으로 본선 전동차 운행 안전성 확보
- 기존전동차 하자기간 종료후에도 제작사 하자처리 유도로 비용 절감(15백만원)
