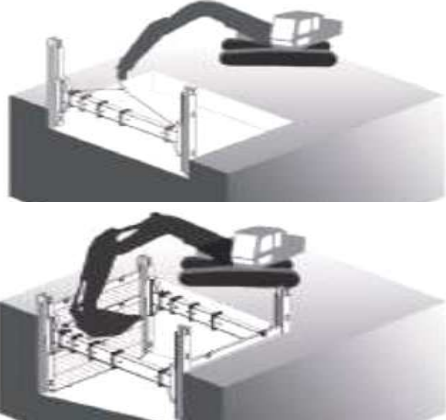


【현황 및 근거】

- 조립식 간이흙막이의 범용성 등에 따라 공급배관 지반 굴착공사 현장에는 조립식 간이흙막이 공법 기준으로 설계 및 시공이 되고 있음

< 간이흙막이 타입 비교 >

공법	조립식 간이흙막이 (굴착 중 조립하며 설치)	박스형 간이흙막이 (상부서 박스조립 후 거치)
적용범위	깊이: 6m 이하, 폭: 6m 이하	깊이: 4m 이하, 폭: 2m 이하
개념도		

※ 굴착 시 가시설 동시 설치 원칙에 따라 박스형 간이흙막이는 설계 미반영

【추진 노력】

- ① (현장 최적 공법 적용) 현장여건에 맞는 가시설 공법인 박스형 간이흙막이('22년 표준 품셈 신설 반영)을 적극 적용하여 건설공사 안전성 확보와 시공효율을 동시에 확보
- 지반조건, 지장물 현황 등을 고려한 효율적인 간이흙막이 타입 선정 노력
 - 근로자 안전성 향상, 시공시간 단축 및 공사비용(1.67억 원) 절감 실현

< 흙막이 타입별 시공비용 비교 >

공사명	시공비용		
	조립식 간이흙막이	박스형 간이흙막이	절감금액
([다]건설) [마]마~[마]마 건설공사	478백만원	311백만원	167백만원

【조치할 사항】

- ▶ 효율적으로 안전성 향상을 실현한 상기 모범사례 전파 및 해당 부서에 포상 상신
- ▶ 위 모범사례가 필요시 적용될 수 있도록 “공급건설 토목분야 공사원가 산정기준”, “배관이설공사 표준설계서”에 박스형 간이흙막이 대가기준 추가 권고
