

시 정 요 구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 징구 도면 확인 미흡

관 련 부 서 제주본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다)에서 정하는 업무의 위탁 조항에 따라 LPG 특정사용시설에 대한 완성검사 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있으며, 제주본부 검사부는 LPG특정사용시설 완성검사 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

액법 제35조제5항 및 제6항에 따라 시공자는 액화석유가스시설의 설치공사나 변경공사를 완공하면 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 시공기록·완공도면, 그 밖에 필요한 서류(이하 “시공기록 등”이라 한다)를 작성·보존하여야 하며, 시공기록 등의 사본을 액화석유가스시설의 설치공사나 변경공사를 발주한 자에게 내주고, 완공도면의 사본을 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

이때, 공사에서 시공자로부터 징구해야 할 시공기록 등 서류 및 징구방법에 대해서는 공사 「LPG시설 검사업무 처리지침(2201-1)」에서 정하고 있는데, 특히 소형저장탱크가 설치된 LPG특정사용시설의 도면에는 충전구와 토지경계 및 건축물 개구부와와의 거리 등 그 이격거리가 표시되어 있어야 한다.

LPG시설 검사업무 처리지침(2201-1)

[별표 8] 시설별 안전성 확인 및 완성검사 청구서류 목록

나. 특정사용시설(일부 내용생략)

- 시설 설치도면 1부 (별지 제3호 서식)
 - 소형저장탱크에 의한 액화석유가스특정사용시설의 경우 이격거리(안전공지, 충전구와 토지 경계 및 건축물개구부와와의 거리, 탱크외면과 가연성(목조) 건조물과의 거리)가 표시된 도면
 - 소형저장탱크에 의한 액화석유가스특정사용시설 및 공동주택·다중주택·다가구주택·오피스텔(용기집합시설 포함)의 경우에는 각 층별 평면도 및 전체 계통도

<이하생략>

3. 감사 결과 확인된 문제점


제주본부에서 감사대상 기간(2021. 6. 1. ~ 2024. 3. 31.) 동안 실시한 LPG특정사용시설 완성검사와 관련하여 해당 시설의 설치도면 등 주요 청구 서류 적정성을 확인한 결과, 소형저장탱크 설치 시설에 대한 완성검사 시 청구한 도면에 충전구로부터 부지경계 또는 (주변)건축물 개구부 및 탱크외면과 가연성(목조) 건조물과의 이격거리 등이 표시가 되어 있지 않은 사례 총 33건([표 1] 참조)을 확인하였다.

[표 1] 소형저장탱크 설치 LPG특정사용시설 이격거리 표시 도면 미징구 현황


연번	접수번호	업소번호	업소명	검사일자	검사원
1	2024-0907574	02606347-0001	<업소명 생략>	2024-02-02	○○○
2	2024-1674044	00544909-0001	<업소명 생략>	2024-03-25	○○○
3	2020-0909227	02395577-0001	<업소명 생략>	2021-01-11	○○○
4	2021-0255538	02420574-0001	<업소명 생략>	2021-03-10	○○○
5	2021-0350212	02426671-0001	<업소명 생략>	2021-04-13	○○○
6	2021-0627547	02436141-0001	<업소명 생략>	2021-07-30	○○○

연번	접수번호	업소번호	업소명	검사일자	검사원
7	2023-1943763	02595831-0001	<업소명 생략>	2023-11-27	○○○
8	2022-0953476	02542080-0002	<업소명 생략>	2022-12-21	○○○
9	2022-0964251	02542970-0001	<업소명 생략>	2022-12-23	○○○
10	2022-0962943	02542872-0001	<업소명 생략>	2022-12-23	○○○
11	2022-0967721	02543295-0001	<업소명 생략>	2022-12-28	○○○
12	2023-1647063	02586036-0001	<업소명 생략>	2023-10-06	○○○
13	2022-0221420	02488204-0001	<업소명 생략>	2022-02-24	○○○
14	2023-1991182	02048280-0001	<업소명 생략>	2023-12-07	○○○
15	2023-2067963	00410574-0001	<업소명 생략>	2023-12-19	○○○
16	2020-0920450	02396971-0001	<업소명 생략>	2020-11-18	○○○
17	2021-0588135	02442616-0001	<업소명 생략>	2021-07-20	○○○
18	2023-1328965	02577176-0002	<업소명 생략>	2023-08-04	○○○
19	2023-0664645	01554548-0001	<업소명 생략>	2023-04-27	○○○
20	2023-1981206	02594816-0001	<업소명 생략>	2023-12-05	○○○
21	2022-0800005	02526640-0001	<업소명 생략>	2022-10-13	○○○
22	2023-0156501	02549251-0001	<업소명 생략>	2023-02-07	○○○
23	2023-0156515	02549252-0001	<업소명 생략>	2023-02-07	○○○
24	2023-1667368	02586423-0001	<업소명 생략>	2023-10-11	○○○
25	2022-0700564	02254403-0001	<업소명 생략>	2022-08-24	○○○
26	2024-1363114	02015806-0001	<업소명 생략>	2024-02-19	○○○
27	2024-1615375	02610365-0001	<업소명 생략>	2024-03-11	○○○
28	2021-0754695	01740238-0001	<업소명 생략>	2021-10-05	○○○
29	2021-0795189	02239819-0001	<업소명 생략>	2021-10-19	○○○
30	2021-0827573	02465991-0001	<업소명 생략>	2021-11-10	○○○
31	2024-1380686	01269870-0001	<업소명 생략>	2024-02-22	○○○
32	2024-1588268	00654801-0001	<업소명 생략>	2024-03-06	○○○
33	2024-1380944	01532414-0001	<업소명 생략>	2024-03-08	○○○


[그림 1] 소형저장탱크 이격거리 표시 부적정 예시

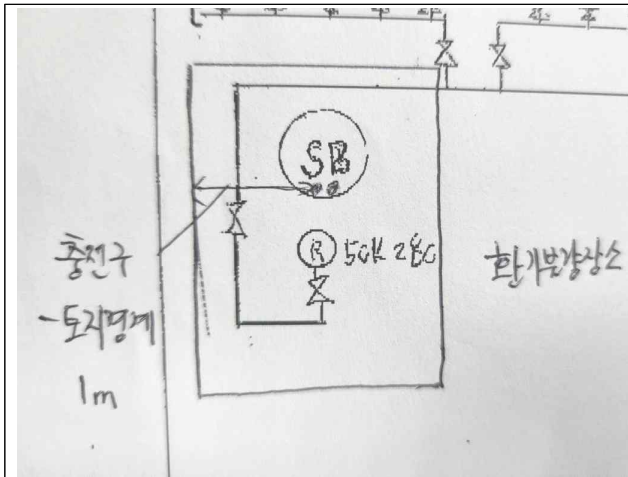


<충전구~개구부, 탱크외면~가연성건조물
이격거리 미표시>

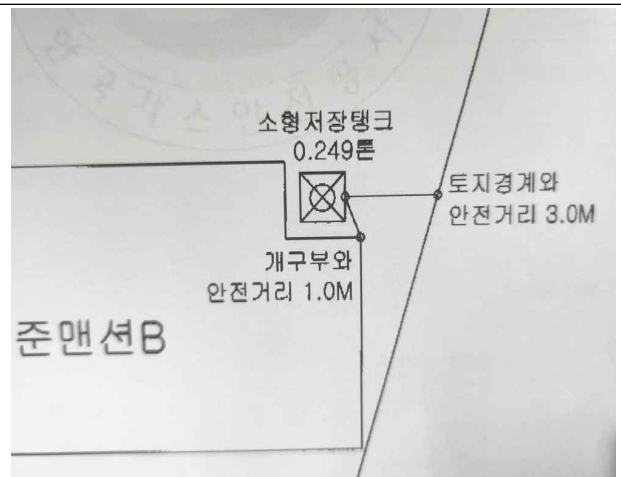


<탱크외면~가연성건조물 이격거리 미표시>

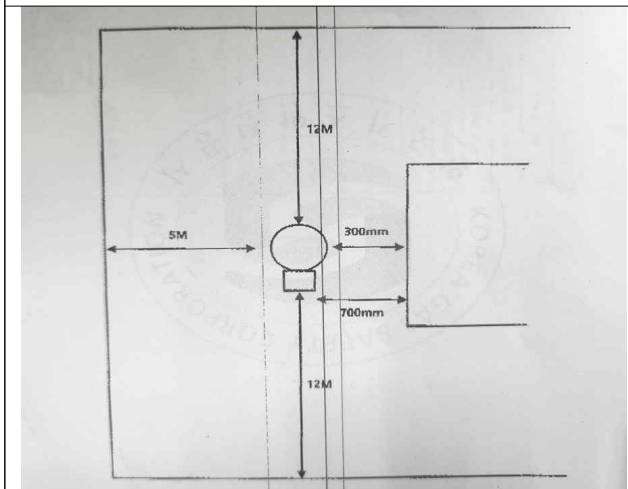


<충전부 ~ 토지경계/개구부, 가연성건조물
이격거리 미표시>

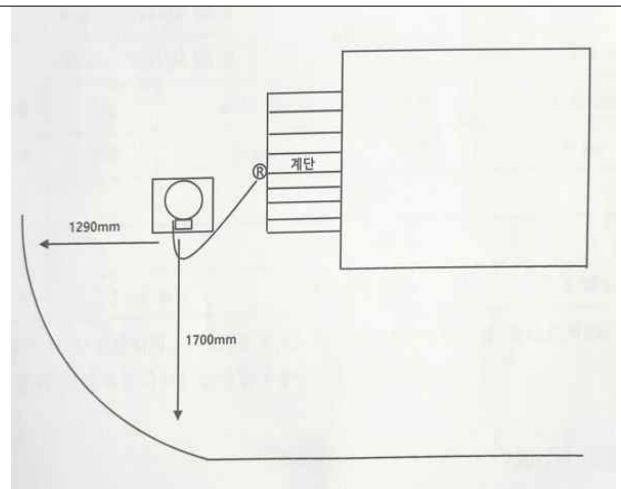

<충전구~개구부, 탱크외면~가연성건조물
이격거리 미표시>





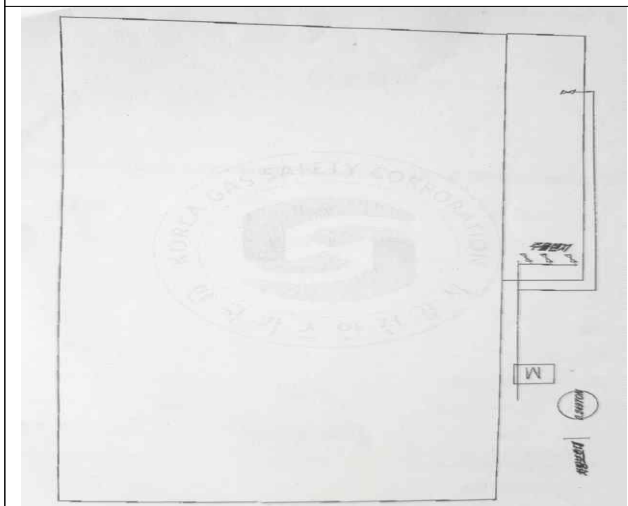


<충전구~토지경계/개구부, 탱크외면~가연성건조물
이격거리 미표시>

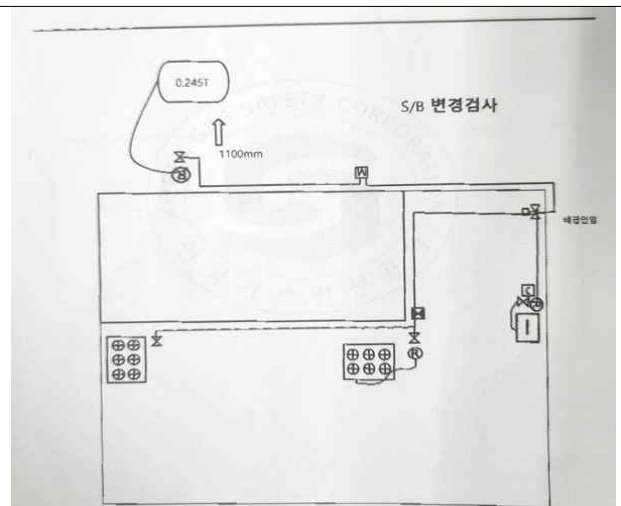

<충전구~토지경계/개구부, 탱크외면~가연성건조물
이격거리 미표시>

[그림 2] 소형저장탱크 이격거리 표시 적정 예시

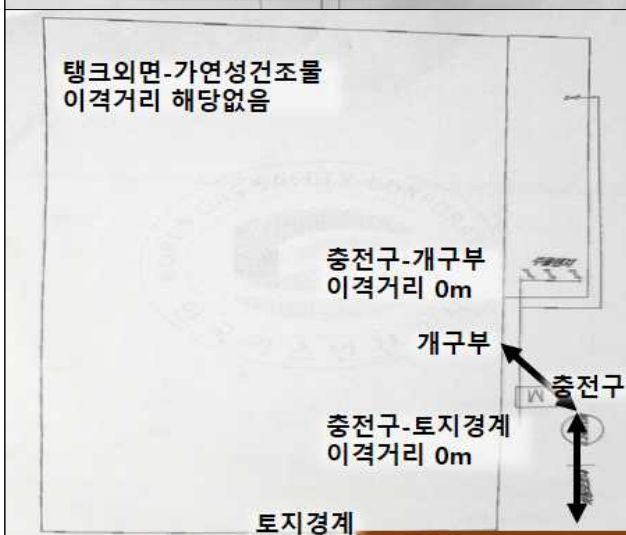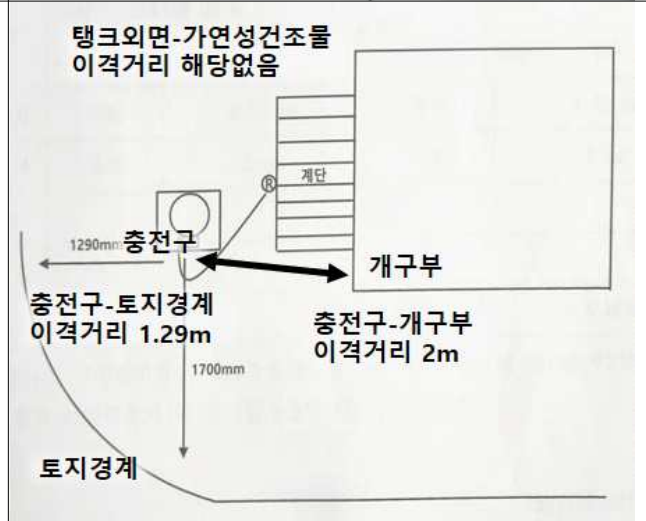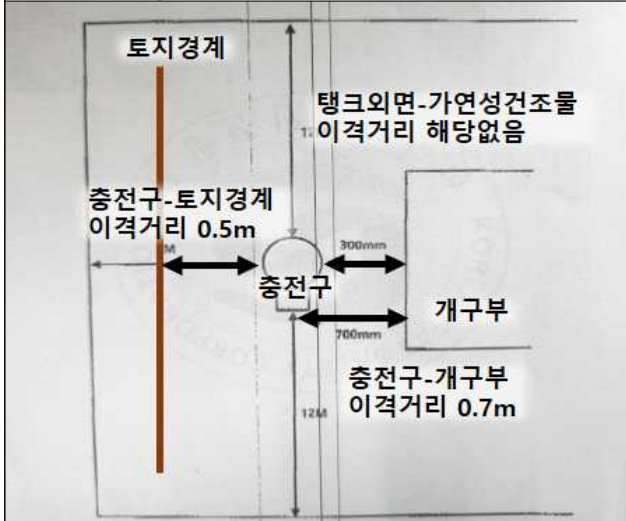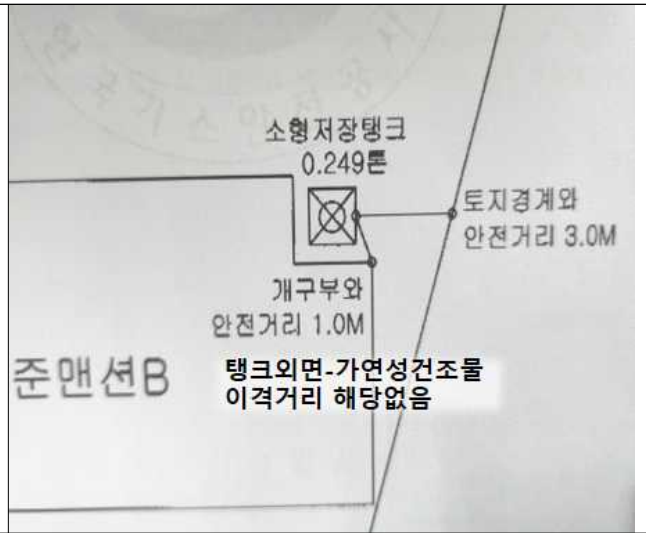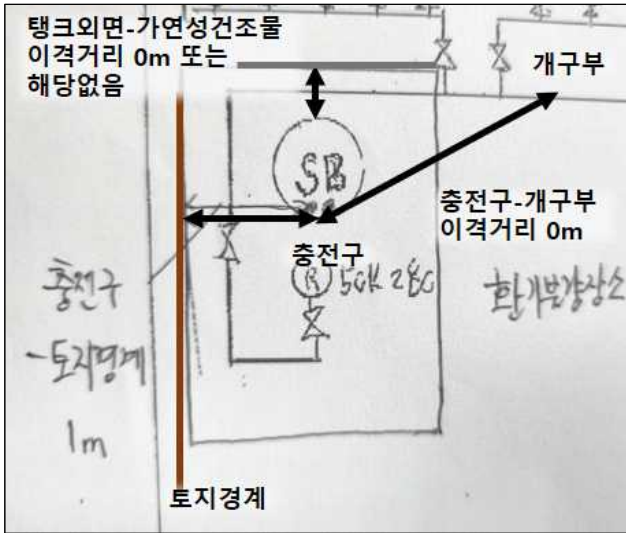

- 이격 대상 표기 (충전구, 개구부, 가연성 건조물, 토지경계)
- 충전구-토지경계, 충전구-개구부, 탱크외면-가연성 건조물 이격거리 표기
- 해당없는 경우 해당 없음 표시

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 제주본부장은

위 [표 1]의 시설에 대해서 소형저장탱크 충전구로부터 부지경계 또는 건축물
개구부까지의 이격거리 등이 표시된 도면을 다시 징구하여 주시고, 그 조치결과
(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)
