

# 한국전력공사 상임감사위원

## 통보(우수사례)

제 목 : 2호기 고압터빈 사고복구 기간 단축으로 운영손실 최소화


관 계 부 서 : 베트남 응이손 법인

모 범 직 원 : 베트남 응이손 법인 부장 임명학

내 용

위 사람은 2020. 06.부터 현재까지 베트남 응이손-2 발전소 정비이사로 근무하면서 발전소 정비분야 전반을 총괄하고 있으며, 준공 후 응이손-2 건설 미비사항 종결, 비계획 발전정지 사고 최소화 및 정비비용 절감 노력 등을 통해 발전소의 안정적 설비운영 및 수익성 제고를 위해 기여하고 있다.

‘23. 05. 2호기 고압터빈 고진동 사고 시 진동 원인에 대하여 전력연구원 및 제작사(目目目目)를 통해 최단 시간에 명확히 긴급 진단하고 HIP 분해점검 후 사고 부위 확인 및 복구계획을 수립함으로써 손실 비용을 최소화하였다.

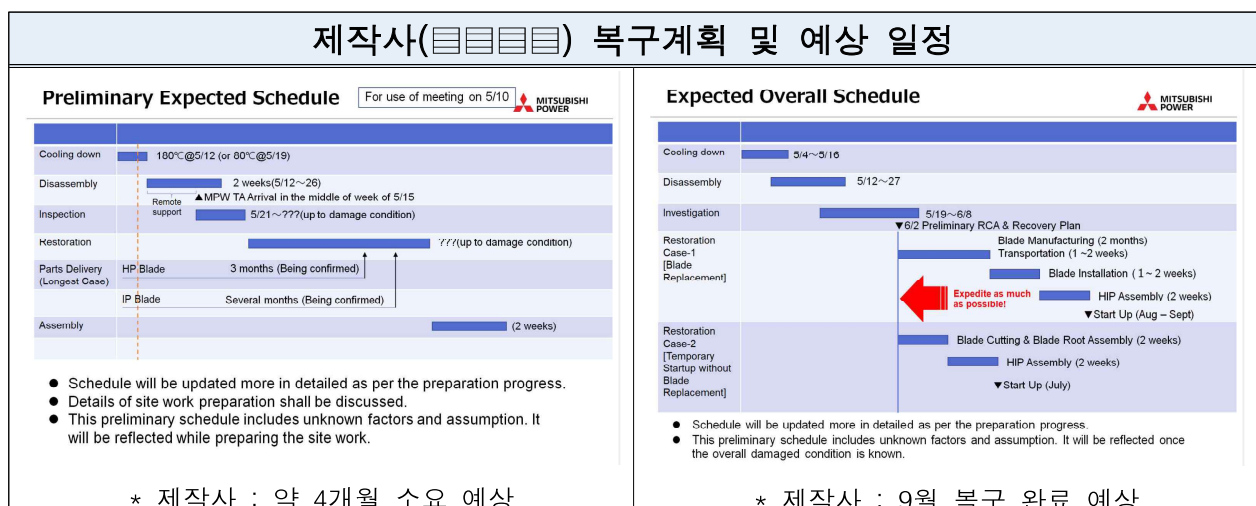

당초 제작사(目目目目)에서는 사고조사, 손상된 자재 신규 제작, 조립 및 시운전 완료 시까지 총 약 4개월의 복구 기간을 예상하였으나, 손상 자재의 모재를 사전에 준비한 후 베트남 국외 반입·반출 기간을 최대한 단축하고, 터빈 로터 현장 블라스팅 시행, 제작사 특수 공기구 반입으로 현장 정밀가공 시행 및 정비 인력 및 제작사 기술지원인력(TA) 주야간 근무 시행 등 노력을 통하여 복구 기간을 최대한 단축할 수 있도록 총력을 다하였다.

위와 같은 책임감 있는 업무추진으로, 제작사 제시(안) 대비 정비기간을 2개월 단축하여 PPA 계약상 지체상금 손실 USD 24mil.(320억원)을 절감하여 수익성 제고에 공헌한바 이는 타 직원들의 모범이 되기에 손색이 없다.

#### 베트남 응이손2 고압터빈 점검결과 및 향후대책 보고

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| 00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-02-26 19:20:37 |  |
| ICEPCO                                             |  |

#### 조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.
