

1. 업무개요

광주전남제주환경본부(○○○○○처 ◇◇◇◇◇◇◇부, 이하 “◇◇◇◇◇◇◇부”라 함)는 통합공단 출범(0000년 0월)에 따른 민원인 주차 문제를 해소하고자 기존 주차장 부지 내 지상 2층(옥상주차) 규모의 주차장 설계용역을 추진(0000년 00월) 후 자주식 주차장 신축공사를 준공(0000년 0월)하여 운영하고 있다.

환경서비스부는 0000년 0월 옥외 주차장 노후화 및 기상조건 등으로 인하여 포장면(콘크리트)의 상태가 극히 불량(박리, 탈락, 물고임)한 상황을 해결하고자 옥외 주차장 포장 보수 공사를 추진하였다.

[표 1] 주차장 공사 개요

구분	자주식 주차장 신축공사	옥외 주차장 보수공사
기간	0000.00.00. ~ 0000.00.00.	0000.00.00. ~ 0000.00.00.
금액	---,---,---원	-,---,---원
위치	----시 --구 --동 -----번지	----시 --구 --동 -----번지 옥외 주차장(000.00㎡)
개요	○ 철골 조립식 주차장(공작물) ○ 건축면적: 000.00㎡ ○ 주차대수: 총 00대(1층 00대, 2층 00대)	○ 아스콘 및 콘크리트 포장 ○ 차선도색 작업
시공사	----- (주)	-----

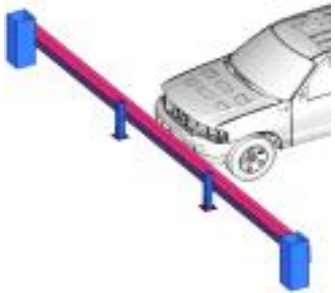
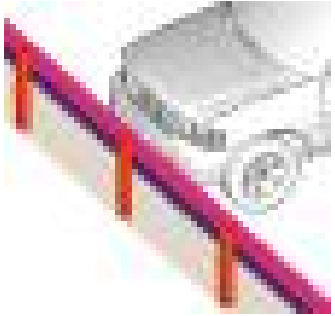
2. 관련규정 및 판단기준

건축법 시행령 제32조(구조 안전의 확인) 제1항에 따르면 건축물을 건축하거나 대수선하는 경우 해당 건축물의 설계자는 국토교통부령(건축물의 구조기준 등에 관한 규칙)으로 정하는 구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 한

다고 되어있다.

또한, 주차장법 시행규칙 제6조(노외주차장의 구조·설비기준) 제1항제12호가
 목에 따르면 2층 이상의 건축물식 주차장에는 2톤 차량이 시속 20킬로미터의 주
 행속도로 정면충돌하는 경우에 견딜 수 있는 강도의 구조물로서 구조계산에 의
 하여 안전하다고 확인된 구조물에 해당하는 추락방지 안전시설을 설치하여야 한
 다고 되어있다. 주차장 추락방지시설의 설계 및 설치 세부지침에 의한 추락방지
 안전시설에는 기둥 정착형/바닥 정착형/ 독립형이 있다.

[표 2] 추락방지 안전시설




구분	설명	비고
기둥 정착형	추락방지 부재를 주차장의 양쪽 기둥을 이용하여 설치하는 경우로서 설치가 용이하고 추락방지 성능도 우수하다.	
바닥 정착형	추락방지 부재를 주차장의 철재 보에 용접하여 설치한 여러 개의 지지대에 체결한 경우로서 추락방지 성능이 우수하다.	
독립형	추락방지시설을 각각의 주차구획마다 개별적으로 설치하는 경우로서 바닥과의 체결이 견고하지 않으면 추락방지 성능이 저하될 수 있으므로 바닥에 단단히 고정해야한다.	

3. 감사결과 확인된 문제점

◇◇◇◇◇◇부는 0000년 0월 주차장 포장 보수공사를 추진하며, 아스콘 및 콘크리트 포장으로 인한 2층 바닥하중이 증가하였으나, 그 구조의 안전을 확인하기 위한 건축하중 구조계산을 실시하지 않았다. 최초 주차장 2층 주차대수는 00대로 계획하였으나, 감사기간 중 평균 00대가 주차되어 있었고, ---- 특장차 및 하중이 많은 전기차 등이 주차되어 있어 바닥하중의 초과 여부에 대한 확인이 필요해 보였으며, 옥외 주차장 시설 전반에 걸쳐 부식이 발생하는 문제를 확인하였다.

또한, ◇◇◇◇◇◇부는 2층 주차장에 구조계산에 의하여 안전하다고 확인된 구조물(기둥 정착형/바닥 정착형/독립형)에 해당하는 추락방지 안전시설을 설치하지 않아 주차장 안전관리에 미흡하였다.

[그림 1] 옥외주차장 현장

		
계획보다 많은 주차 현황	하중이 큰 차량 주차	불량철골구조 접합부 부식
		
상부 슬라브 부식 및 부풀림		2층 추락방지시설 상태

4. 관련자(부서) 의견

광주전남제주환경본부에서 운영 중인 주차장의 구조·안전 진단을 우선 실시 후 진단 결과에 따라 후속 조치를 추진할 예정입니다. 다만, 현재 가용 예산이 없어 ○○○○부와 협의가 필요하며, 안전 예산 확보 후 조속한 시일 내에 처리하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

광주전남제주환경본부장(○○○○○처장)은 옥외주차장에 대한 안전성 확보를 위하여 구조·안전진단을 실시하고 그 결과에 따른 보수·보강 계획을 수립하시기 바랍니다. **【통보】**
