


그러나 □□지역본부 현장을 확인한 결과 설계지침 및 내역과 상이하게 각재 대신 메탈 스티드로 변경하여 시공 완료 및 시공 중이며 또한 타 지역본부 현장도 동일하게 변경시공 한다는 사실을 확인하였다.

[그림 8] 시공상세도 및 현장 시공현황

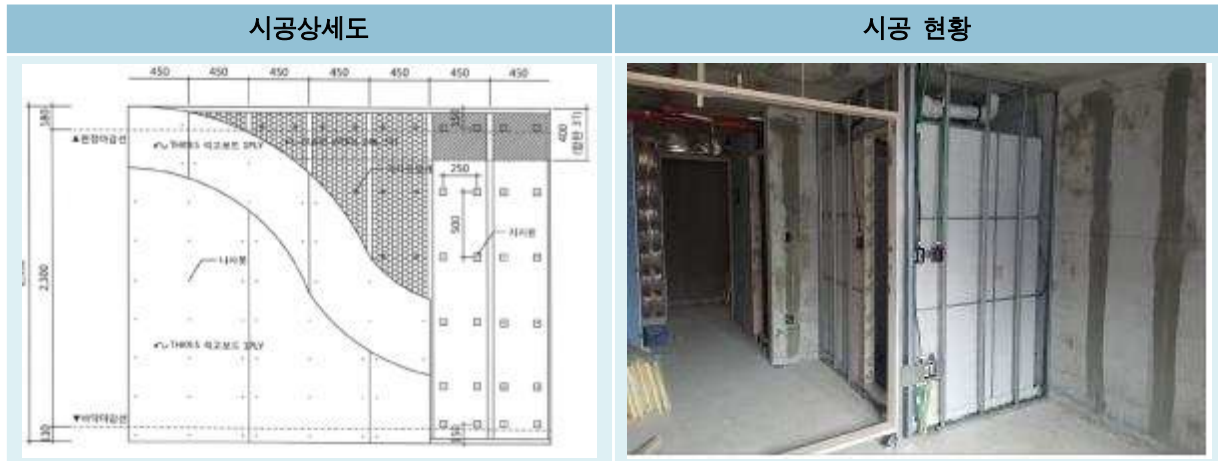

자료 : □□지역본부 제출자료 재구성

따라서 실제 현장에서 적용하고 있는 시공 방법을 고려하여 시스템 욕실 경량 벽틀 설치 기준을 개선할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

주택기술처장은

시스템 욕실 경량 벽틀 설치방법에 대한 시공사례 및 여건 등을 고려하여 관련 상세도 및 표준일위대가의 구체적인 기준을 마련하여 주시기 바랍니다 (개선).
