

[46] [현지조치] 사항

지적연번 2016 -

현지조치사항


1. 제 목 : 지하주차장 천정 슬래브 균열보수 미흡
2. 조치부서 : □□지역본부

[내 용]

지하주차장 천정 슬래브 균열은 「공사시방서」 23560(콘크리트 균열보수)에 의거 진행성 여부 및 균열 폭에 따라 그에 맞는 보수 시점과 보수기준을 적용하여야 합니다.

그런데도 □□지역본부 ☒☒☒☒2 44, 45BL 아파트 건설공사 1공구(국임 1,557호) 현장을 점검한 결과 [그림 11]과 같이 지하주차장 천정 슬래브에 발생한 다수의 균열에 대하여 보수가 이루어지지 않고 있어 콘크리트 구조물의 성능 저하를 초래할 우려가 있습니다.

[그림 11] 천정슬라브 균열 현황

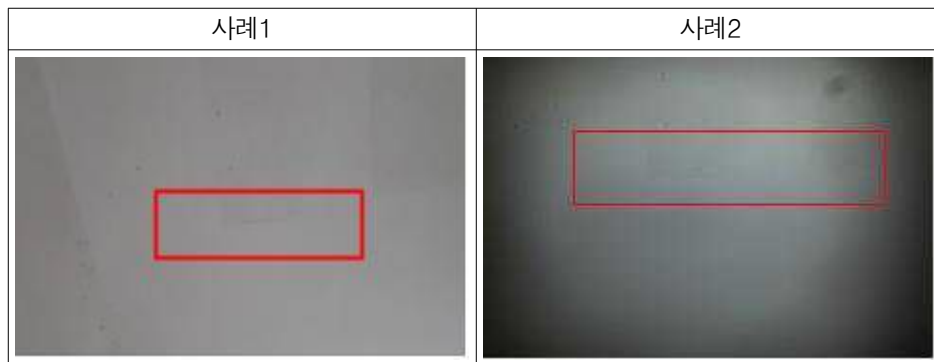


자료 : 현장점검 사진(점검일 2016. 3. 21.)

[조치할 사항]

□□지역본부장은 ☒☒☒☒2 44, 45BL 아파트 건설공사 1공구의 지하주차장 천정 균열에 대하여 관련 시방기준을 준수하여 조속히 균열을 보수하시기 바랍니다.

[붙임 2] 현지조치 결과

	조치 전
지하주차장 균열 크기 측정	
	조치 전
지하주차장 균열 크기 측정	

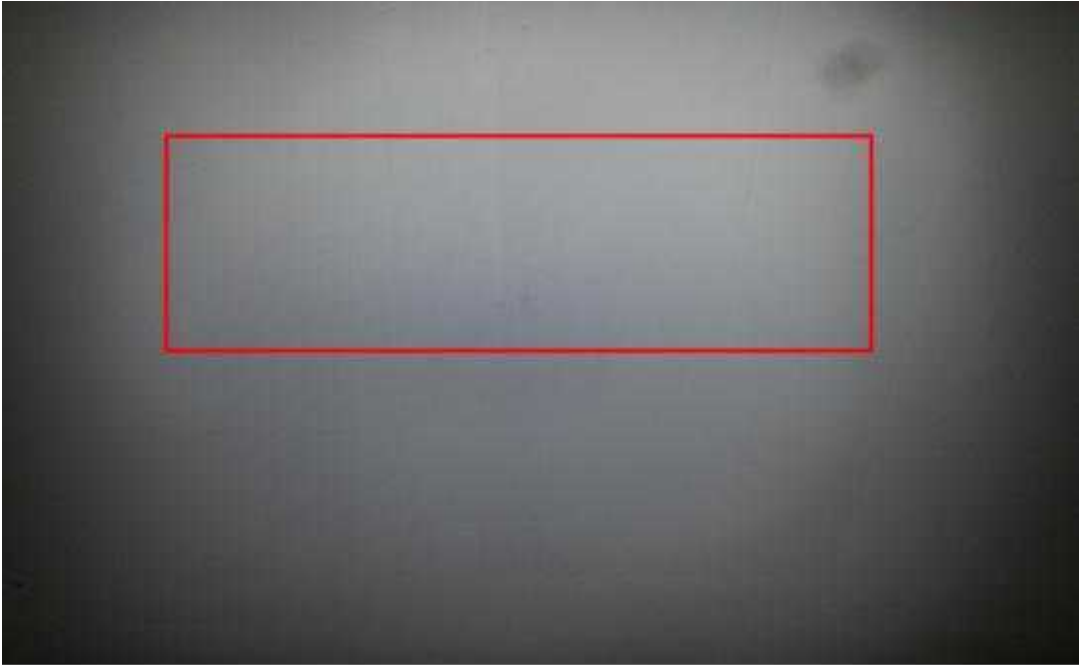	조치 전
지하주차장(2번) 균열	
	조치 전
지하주차장(5번) 균열	

	조치 후
지하주차장 표면처리(퍼티)	
	조치 후
지하주차장 표면처리(도장)	
