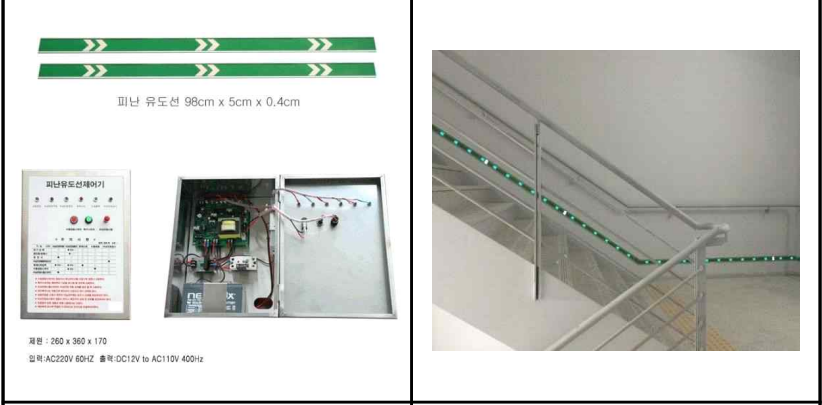


수범사례 제출양식

□ 부서명 : 제주지역본부 전력시설팀

구 분	주 요 내 용	비 고 (분야)
제 목	[화재 시 신속한 대피유도] 피난유도선 설치	
추 진 배 경	○ 관제탑 화재시 인명과 재산피해를 최소화 하기 위하여 피난대책 수립	
현 황	○ 신, 구관제탑 계단지역 - 천장직부등 및 피난유도등(계단)	
문제점	○ 화재 시 연기나 피난자 위치에 따라 유도등 파악불능 가능성 상존	
개 선 사 항	○ 계단지역 내 측면으로 LED 피난유도선 설치  피난유도선/전원제어반 설치 (예)	
개 선 성 과	○ 비계량성과 - 화재 및 장애등 비상상황 발생시 근무자 대피의 안전확보	구체적 으로 작성 (단위: 백만원)

※ 수범사례 증빙자료(방침 및 결과보고 서류 등) : 별도 첨부

문서번호	제주시설단-11b24
보존기간	3년
공개여부	공개
보고일자	2017.08.09

결 재	과장	강지훈	차장	대결 08/09 정진섭
	제주 전력 시설팀장	전결		
협 조				

신관제탑 피난유도선(LED)
설치작업 계획

신관제탑 피난유도선(LED) 설치작업 계획

『신관제탑 13~14층 계단지역』

I 목 적

- 신.관제탑 13~14층 계단지역내 정전 등 장애발생시 근무자 대피의 안전확보 및 근무자 이동의 안정성을 위하여 LED 피난유도선을 설치

II 현 황

장 소	현 재	개 선	비 고
신.관제탑 13~14층 계단지역	천장 계단직부등 2(등)	벽면 LED 피난 유도선 30M 설치(조명방식)	근무자 대피 및 이 동의 안정성 확보

 피난 유도선 98cm x 5cm x 0.4cm 피난유도선제어기 제원 : 260 x 360 x 170 입력: AC220V 50Hz 출력: DC12V to AC110V 400Hz	
피난유도선/전원제어반	설치(예)

Ⅲ | **작업계획**

☐ 작업일자 : 자재구매후 작업시행(8월 중)

☐ 작업내용

- 벽면 전원제어반 설치
- 피난유도선용 전원선 포설 및 노출부분 몰드 처리
- 벽면 피난유도선(30M) 설치 및 결선작업
- 설치 완료후 점등시험

☐ 작업자

- 청사전력소 소장 부대희 외 32명

☐ 소요예산 : 460,000원(VAT 별도, 시설관리유지비-경상경비)

☐ 소요자재

순번	품 명	규 격	단위	수량	단가	금액	비 고
1	피난유도선	LED 1M모듈	EA	30	10,000	300,000	
2	전원제어반	50M용	EA	1	125,000	125,000	
3	배송료	전체	식	1	35,000	35,000	제주도 기준
계					460,000(원)		VAT별도

Ⅳ | **기대효과**

☐ 정전등 비상시 근무자 이동의 안전사고 예방

V | **건의**

☐ 상기와 같이 계획 보고합니다.

붙 임 : 견적서 2부. 끝.

붙임) 견적서

견 적 서

2017년 8월 8일

수 신: 제주공항전력시설팀 담 당: 전 화: 064-797-2750 팩 스: 064-748-0188 아래와 같이 견적합니다	상 호 : 한국소방공사 서울 종로구 관수동 129-6번지 전 화 : (02) 2275-2369 팩 스 : (02) 2263-1192 Home Page: www.nofire.co.kr
---	--



합 계 금 액	₩506,000 (부가세포함가)				
품 명	규 격	수 량	단 가	공급가	부가세
피난유도선(LED)	1M 기준	30	10,000	300,000	30,000
유도선전원반(검정품)	50M용	1	125,000	125,000	12,500
배송료(제주도기준)	전체	1	35,000	35,000	3,500
합 계				₩460,000	₩46,000

견적조건 배송료 포함 가격입니다. (도서산간지역 제외) 담당자 : 김영주 (02-2268-1195)

계좌번호 기업은행 023-114782-01-011 예금주: 한국소방공사(장순우)
 국민은행 4428-0101-101-930 예금주: 한국소방공사(장순우)

견 적 서

날자 2017년 8월 8일

상 호 : 제주공항 전역시설팀 담 당 : 전 화 : 064-797-2750 팩 스 : 064-748-0188 휴대폰	상호 : 안전소방공사 서울 강서구 화곡동 1036-12 전 화 : 02-2668-8117 팩 스 : 02-3663-1249 홈페이지 : sobang119.co.kr				
아래와 같이 견적 합니다					
합 계 금 액	₩539,000 (부가세 포함가)				
품 명	규 격	수 량	단 가	공급가	부가세
1 피난유도선(LED)	1M	30	10,000	300,000	30,000
2 유도선전원반	50M용	1	160,000	160,000	16,000
3 배송료		1	30,000	30,000	3,000
합계				₩490,000	₩49,000
납품장소:					
수령인:					
전화번호 :					
휴대폰번호 :					
구매하시는 모든 물품은 운송비 착불 입니다,					
선불을 요청 하시면 택배(운송비를) 선불 결제 하셔야 합니다					
배송방법 (택배발송) (화물발송)화물 발송시 지점확인					
구비서류요청:					

문서번호	제주시설단-12269
보존기간	3년
공개여부	공개
보고일자	2017.08.28

결재	과장 강지훈 제주전력시설팀장 전결 08/28 강대룡
협조	

신관제탑 피난유도선(LED) 설치작업 결과

KAC 제주지역본부
시설단 전력시설팀

신관제탑 피난유도선(LED) 설치작업 결과

『신관제탑 13~14층 계단지역』

I 목 적

- ☐ 신.관제탑 13~14층 계단지역내 정전 등 장애발생시 근무자 대피의 안전확보 및 근무자 이동의 안정성을 위하여 LED 피난유도선을 설치

II 개선내용

장소	현 재	개 선	비 고
신.관제탑 13~14층 계단지역	천장 계단직부등 2(등)	벽면 LED 피난 유도선 30M 설치(조명방식)	근무자 대피 및 이 동의 안정성 확보

III 작업결과

- ☐ 작업일자 : 2017년 8월 18일 ~ 8월 19일(2일간)
- ☐ 작업내용
- 벽면 전원제어반 설치
 - 피난유도선용 전원선 포설 및 노출부분 몰드 처리
 - 벽면 피난유도선(30M) 설치 및 결선작업
 - 설치 완료후 점등시험
- ☐ 소요예산 : 460,000원(VAT 별도, 시설관리유지비-경상경비)

☐ 소요자재

순번	품 명	규 격	단위	수량	단가	금액	비 고
1	피난유도선	LED 1M모듈	EA	30	10,000	300,000	
2	전원제어반	50M용	EA	1	125,000	125,000	
3	배송료	전체	식	1	35,000	35,000	제주도 기준
계					460,000(원)		VAT별도

☐ 작업자


- 청사전력소 소장 부대희 외 32명

IV 기대효과

☐ 정전 등 유사시 관제사 대피의 안전확보 및 이동의 안정성 확보

- 붙임) ① 작업지역 평면도.
 ② 작업사진
 ③ 자재구매 세금계산서

붙임) 작업지역 평면도

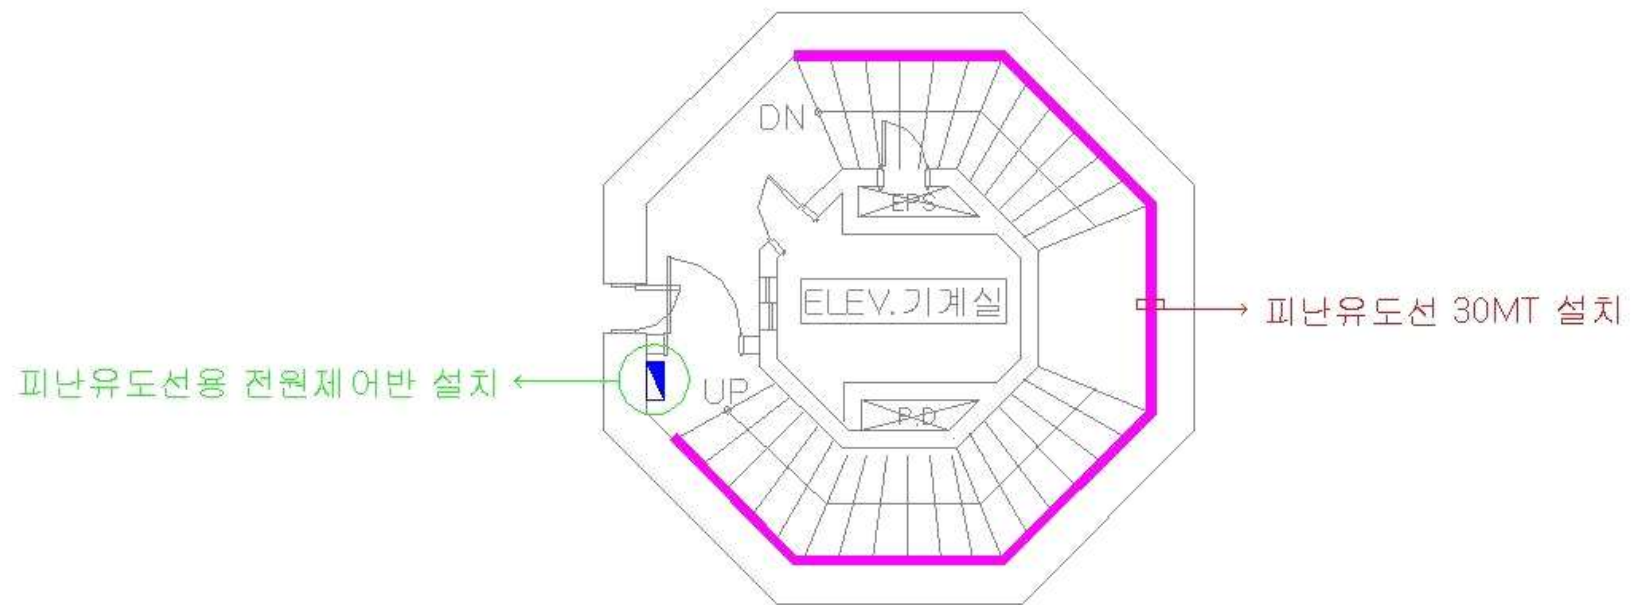

13 ~ 14층 계단지역 평면도

붙임2) 작업사진



작업사진-1




작업사진-2




작업사진-3



작업사진-4

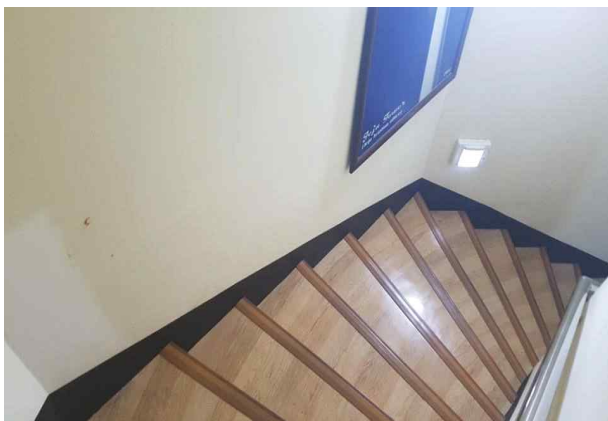

설치(전)

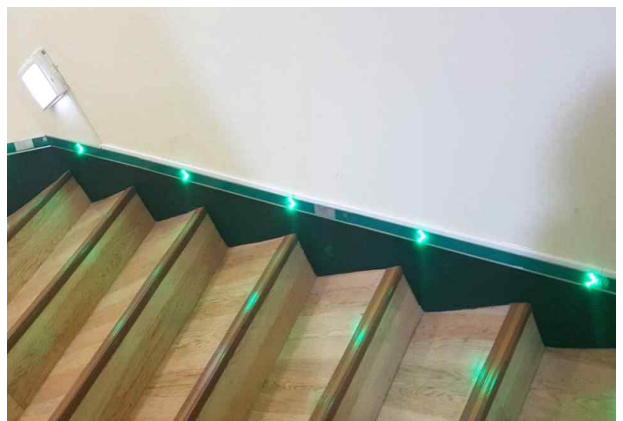

설치완료

붙임3) 세금계산서

전자세금계산서					승인번호		20170818-10000000-58796872				
공급자	등록번호	210-12-69332		종사업장번호		수령자	등록번호	616-85-13248		종사업장번호	
	상호(법인명)	한국소방공사		성명	장순우		상호(법인명)	한국공항공사 제주지역본부		성명	강동원
	사업장	서울특별시 종로구 청계천로 117-13, 1층 A-15호(관수동, 외 1필지(129-3, 129-6))					사업장	제주특별자치도 제주시 공항로 2			
	업태	도소매	종목	소방설비자재, 안전용품			업태	부동산	종목	임대	
	이메일	hanjin50@naver.com					이메일	kimjh108@airport.co.kr			
작성일자		공급가액		세액		수정사유					
2017/08/18		460,000		46,000							
비고											
월	일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고			
08	18	유도선 외				460,000	46,000				
합계금액		현금	수표	어음	외상미수금	이 금액을 (청구) 함					
506,000											


 본 인쇄물은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 발급 또는 전송 입력된 전자(세금)계산서입니다.
 발급사실 확인은 상기 홈페이지의 "조회/발급>전자세금계산서>제3자 발급사실-조회"를 이용하시기 바랍니다.

문서번호	제주시설단-13206
보존기간	3년
공개여부	공개
보고일자	2017.09.13

결 재	과장 강지훈 제주전력시설팀장 전결 09/13 강대룡
협 조	

구관제탑 피난유도선(LED) 설치작업 계획

KAC 제주지역본부
시설단 전력시설팀

구관제탑 피난유도선 설치작업 계획

『구관제탑 7~9층 계단지역』

I 목 적

- 구관제탑 7~9층 계단지역내 정전 등 장애발생시 근무자 대피의 안전 확보 및 근무자 이동의 안정성을 위하여 LED 피난유도선을 설치

II 현 황

장소	현 재	개 선	비 고
구관제탑 7~9층 계단지역	천장 계단직부등 4(등)	벽면 LED 피난 유도선 25(M)설치(조명방식)	근무자 대피 및 이 동의 안정성 확보

 피난 유도선 98cm x 5cm x 0.4cm   제원 : 260 x 360 x 170 입력:AC220V 60HZ 출력:DC12V to AC110V 400Hz	
피난유도선/전원제어반	설치예 (신관제탑)

Ⅲ**작업계획**

☐ 작업일자 : 자재구매후 작업시행(9월중)

☐ 작업내용

- . 벽면 전원제어반 설치
- . 피난유도선용 전원선 포설 및 노출부분 몰드 처리
- . 벽면 피난유도선(25M) 설치 및 결선작업
- . 설치 완료후 점등시험

☐ 작업자

- . 청사전력소 소장 부대희 외 32명

☐ 소요예산 : 405,000원(VAT 별도, 시설관리유지비-경상경비)

☐ 소요자재

순번	품 명	규 격	단위	수량	단가	금액	비 고
1	피난유도선	LED 1M모듈	EA	25	10,000	250,000	
2	전원제어반	50M용	EA	1	125,000	125,000	
3	배송료	전체	식	1	30,000	30,000	제주도 기준
계					405,000(원)		VAT별도

Ⅳ**기대효과**

☐ 정전등 비상시 근무자 이동의 안전사고 예방

V**건의**

☐ 상기와 같이 계획 보고합니다.


붙 임. ① 작업지역 평면도

② 견적서 2부


붙임1) 작업지역 평면도



○ 구.관제탑 7층 평면도
축척 = 1/100

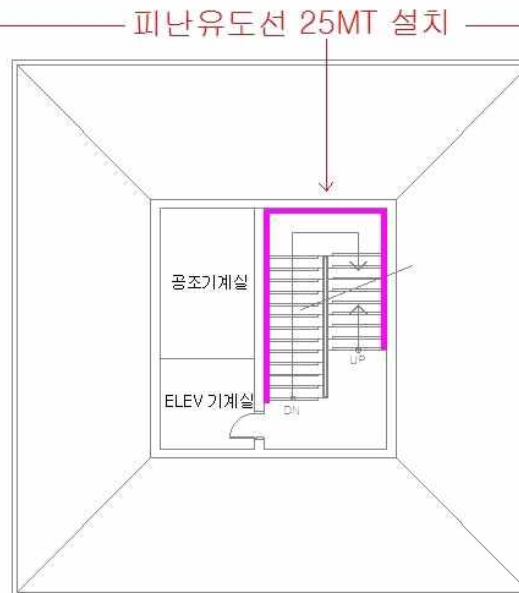

○ 구.관제탑 8층 평면도
축척 = 1/100

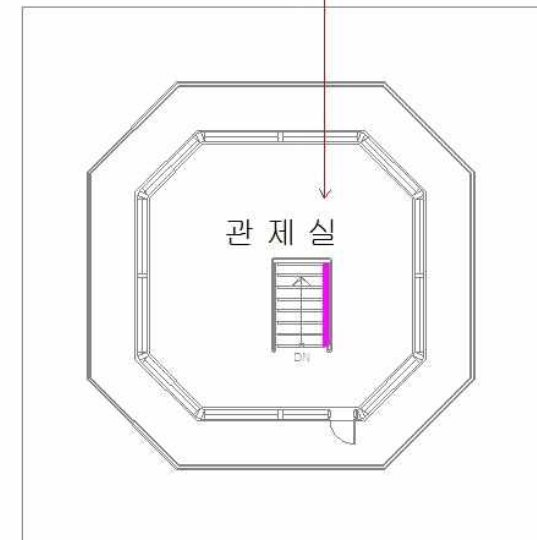

○ 구.관제탑 9층 평면도
축척 = 1/100

붙임2) 견적서

견 적 서

2017년 9월 11일

수 신: 제주공항 전력시설팀 당 당: 전 화: 064-797-2750 팩 스: 064-748-0188 아래와 같이 견적합니다		상 호: 한국소방공사 서울 종로구 관수동 129-6번지 전 화: (02) 2275-2369 팩 스: (02) 2263-1192 Home Page: www.nofire.co.kr			
합 계 금 액		₩445,500 부가세포함가			
품 명	규 격	수량	단 가	공급가	부가세
피난유도선(검정품)	LED, 1M	25	10,000	250,000	25,000
유도선전원반	50M용	1	125,000	125,000	12,500
배송비		1	30,000	30,000	3,000
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
합 계				₩405,000	₩40,500
현재 출고되는 상품은 이음판이 필요없는 제품이라고 합니다. 확인부탁드립니다.					
견적조건				담당자: 조혜원	
계좌번호 기업은행 023-114782-01-011 예금주: 한국소방공사(장순우) 국민은행 4428-0101-101-930 예금주: 한국소방공사(장순우)					

견 적 서

날자 2017년 9월 11일

상 호 : 제주공항 전력시설팀 담 당 : 전 화 : 064-797-2750 팩 스 : 064-748-0188 휴대폰		상호 : 안전소방공사  서울 강서구 화곡동 1036-12 전 화 : 02-2668-8117 팩 스 : 02-3663-1249 홈페이지 : sobang119.co.kr			
아래와 같이 견적 합니다					
합 계 금 액		₩484,000 부가세 포함가			
품 명	규 격	수량	단 가	공급가	부가세
1 피난유도선(LED)	1M	25	10,000	250,000	25,000
2 유도선 전원반	50M용	1	160,000	160,000	16,000
3 배송료		1	30,000	30,000	3,000
				0	0
합계				₩440,000	₩44,000
납품장소:					
수령인:					
전화번호:			휴대폰번호:		
구매하시는 모든 물품은 운송비 착불 입니다,					
선불을 요청 하시면 택배(운송비)를 선불 결제 하셔야 합니다					
배송방법 (택배발송) (화물발송) 화물 발송시 지점확인					
구비서류요청:					

문서번호	제주시설단-13454
보존기간	3년
공개여부	공개
보고일자	2017.09.18

결 재	과장 감지훈 차장 대결 09/18 정진섭
	제주전력 시설팀장 전결
협 조	

구관제탑 피난유도선(LED) 설치작업 결과

KAC 제주지역본부
시설단 전력시설팀

구관제탑 피난유도선(LED) 설치작업 결과

『구관제탑 7~9층 계단지역』

I 목 적

- ☐ 구관제탑 7~9층 계단지역내 정전 등 장애발생시 근무자 대피의 안전확보 및 근무자 이동의 안정성을 위하여 LED 피난유도선을 설치

II 개선내용

장소	현 재	개 선	비 고
구관제탑 7~9층 계단지역	천장 계단직부등 4(등)	벽면 LED 피난 유도선 25(M)설치(조명방식)	근무자 대피 및 이 동의 안정성 확보


III 작업결과

- ☐ 작업일자 : 2017년 9월 15일 ~ 9월 16일(2일간)
- ☐ 작업내용
- 벽면 전원제어반 설치
 - 피난유도선용 전원선 포설 및 노출부분 몰드 처리
 - 벽면 피난유도선(25M) 설치 및 결선작업
 - 설치 완료후 점등시험
- ☐ 소요예산 : 405,000원(VAT 별도, 시설관리유지비-경상경비)

☐ 소요자재

순번	품 명	규 격	단위	수량	단가	금액	비 고
1	피난유도선	LED 1M모듈	EA	25	10,000	250,000	
2	전원제어반	50M용	EA	1	125,000	125,000	
3	배송료	전체	식	1	30,000	30,000	제주도 기준
계					405,000(원)		VAT별도

-입고자재 사진

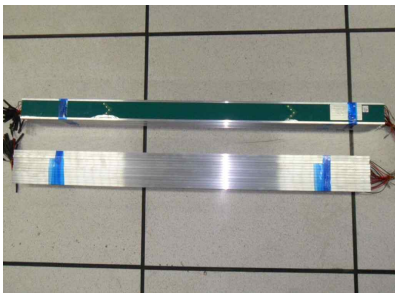		
피난유도선	전원제어반	전체

☐ 작업자


- 청사전력소 소장 부대희 외 32명

IV 기대효과


☐ 정전 등 유사시 관제사 대피의 안전확보 및 이동의 안정성 확보

- 붙임) ① 작업지역 평면도
 ② 작업사진
 ③ 자재구매 세금계산서


불임1)작업지역 평면도

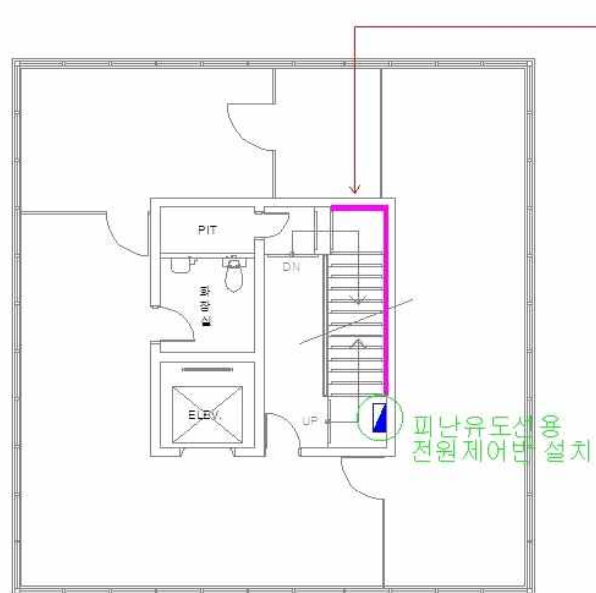

구.관제탑 7층 평면도

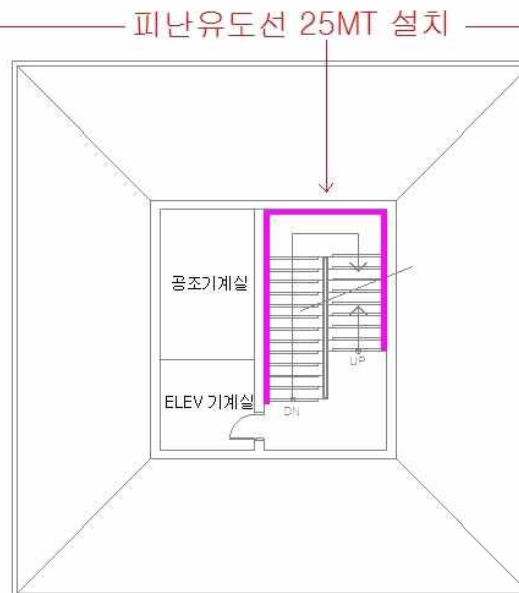

구.관제탑 8층 평면도

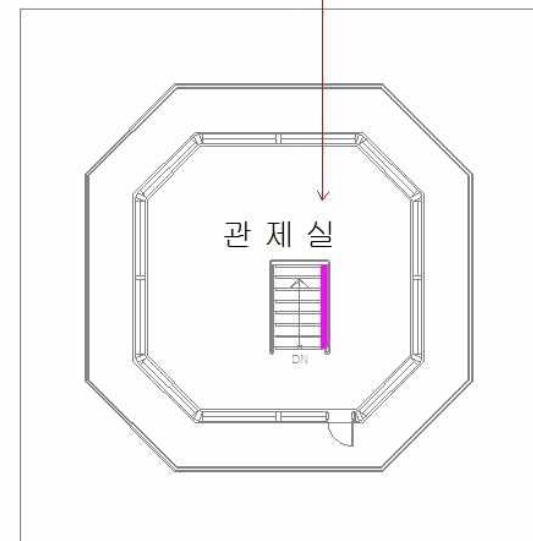

구.관제탑 9층 평면도

붙임2) 작업사진



작업사진-1




작업사진-2



작업사진-3



작업사진-4

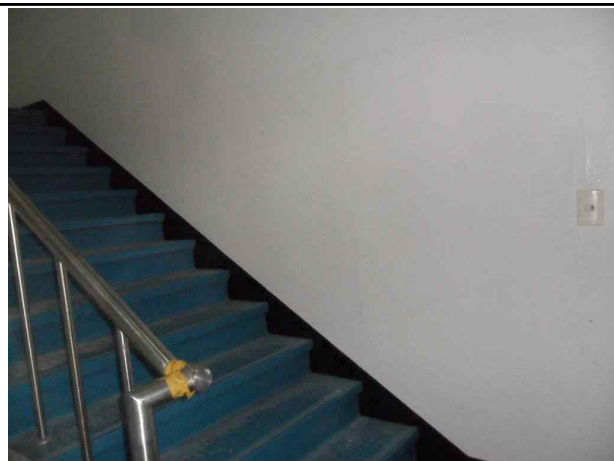

설치(전)



설치완료

붙임3) 세금계산서

전자세금계산서						승인번호		20170915-10000000-76622432			
공급자	등록번호	210-12-69332		종사업장번호		공급받자	등록번호	616-85-13248		종사업장번호	
	상호(법인명)	한국소방공사		성명	장순우		상호(법인명)	한국공항공사 제주지역본부		성명	광동원
	사업장	서울특별시 종로구 청계천로 117-13, 1층 A-15호(관수동, 외 1필지(129-3, 129-6))					사업장	제주특별자치도 제주시 공항로 2			
	업태	도소매	종목	소방설비자재, 안전용품			업태	부동산	종목	임대	
	이메일	hanjin50@naver.com					이메일	kimjh108@airport.co.kr			
작성일자		공급가액		세액		수정사유					
2017/09/15		405,000		40,500							
비고											
월	일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고			
09	15	전원반 외				405,000	40,500				
합계금액		현금	수표	어음	외상미수금	이 금액을 (청구) 함					
445,500											

 본 인쇄물은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 발급 또는 전송 입력된 전자(세금)계산서입니다.
발급사실 확인은 상기 홈페이지의 "조회/발급>전자세금계산서>제3자 발급사실 조회"를 이용하시기 바랍니다.
