

연번: 35

감 사 실 권 고

제 목 옥상 설계오류에 관한 사항

부 서 명 ◎◇지역본부


내 용

◎◇지사는 '10.0.0. 건축사사무소 전원건축과 설계계약을 체결하였고 ◎◇건설을 시공사로하여 '10.00월 착공 후 '15.00월 준공 완료 하였다.

그런데 휴게공간으로 출입이 잦은 옥탑층의 평면도는 옥상 벽체와 물탱크실 사이를 이동이 가능한 폭(1.5m)으로 되어 있으나 구조도에 따라 공사가 진행되는 시공사에서는 구조도폭에 따라 60cm로 시공처리 하였으며, 시공 처리된 곳 또한 기둥면으로 출입이 불가능하여 소방 물탱크실(출입제한구역)의 출입구로 통과 사용하도록 시공되었다.

따라서 실시설계 당시 평면도와 구조도 등 설계도면에 대한 면밀한 사전 검토가 미흡하고 감리 또한 시공 당시 구조상 오류에 대한 문제점을 시정 요구하지 않았다.

< ◎◇지사 옥탑층 평면도 및 구조도 >

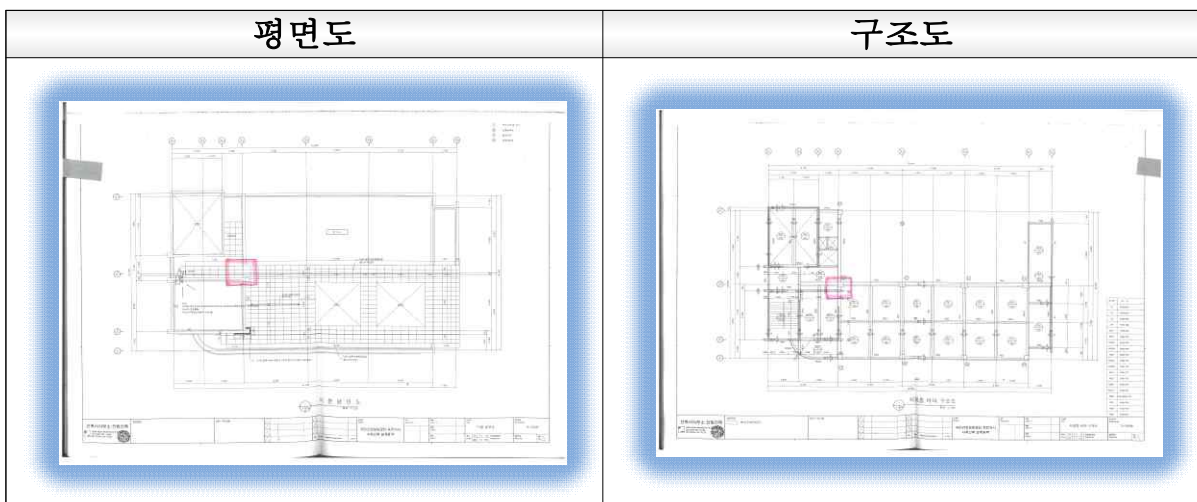

【조치할 사항】 ◎◇지역본부장은

잘못 시공된 옥탑층 출입로에 대한 책임소재, 구조변경, 손해 배상 청구 등의 방안 등을 검토하여 조치하시고, 향후 추진되는 신축사옥은 평면도 및 구조도 등 설계에 대해 면밀한 사전 검토를 통해 설계오류가 최소화 되도록 하시기 바랍니다.(권고)
