

## [10] [ 통보 ] 사항

1. 제 목 : 경사로 수평손잡이 설치길이 부적정
2. 조치부서 : 제주지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용


「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제8조에서는 장애인·노인·임산부 등이 일상생활에서 안전하고 편리하게 시설과 설비를 이용할 수 있도록 등 편의시설을 설치하도록 하고 있다.

「편의시설의 구조·재질등에 관한 세부기준」에 따르면 경사로의 길이가 1.8미터 이상이거나 높이가 0.15미터 이상인 경우에는 양측면에 손잡이를 연속하여 설치하여야 하고, 이 경우 손잡이는 경사로의 시작과 끝지점에 각각 0.3미터 이상 연장하여 설치하도록 규정하고 있다.

따라서 아파트 주동 출입구 경사로에 설치하는 손잡이는 그 시작과 끝지점에 각각 0.3미터 이상 수평손잡이를 설치하여야 한다.

그러나 제주★★ A-4BL 행복주택 건설공사 1공구에서는 [그림 1]과 같이 수평 손잡이 0.3미터 연장설치에 대한 고려없이 경사로 골조골사를 진행하여 수평손잡이 연장 설치시 [그림 1-②]와 같이 주동 출입구 계단 및 출입문이 수평손잡이와 간섭이 불가피하다.

[그림 1] 동 출입구 경사로 계획 및 시공현황

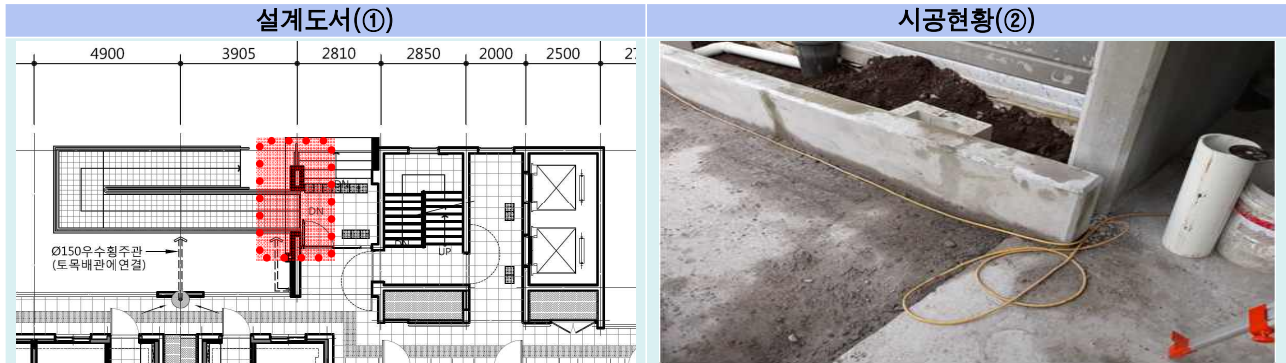

자료 : 제주지역본부 제출자료 재구성

그 결과, 장애인·노인·임산부 등이 일상생활에서 안전하고 편리하게 시설과 설비를 이용할 수 있도록 수평손잡이를 설치할 수 있도록, 경사로 설치 계획의 변경 및 수평손잡이 설치방안 마련이 요구된다.

## 5. 조치할 사항

제주지역본부장은

수평손잡이를 0.3미터 연장하여 설치할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다 (통보).
