

[7] [개선] 사항

1. 제 목 : 석면 해체·제거 공사에 대한 대가기준 수립 필요
2. 조치부서 : □□□□처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :


공사(公社)는 건설사업으로 인하여 발생하는 지장물 철거 및 건설현장 폐기물 등의 처리에 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 하여 「건설현장 폐기물처리 지침」(이하 “폐기물지침”이라 한다)을 운용하고 있다.

폐기물지침에 따르면, 석면은 「산업안전관리법」 등의 관련규정¹⁾에 따라 처리하고 공사대가는 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」에 따라 산정하도록 명시하고 있다.


그리고 「산업안전관리법」 등의 관련규정에서는 석면의 비산으로 인한 주변 환경의 피해 방지 및 작업자의 석면 노출 방지를 위하여 석면해체·제거의 작업 기준을 명시하고 있는데 그 주요 내용은 아래 [그림 1] 및 [그림 2]와 같이 “작업자 보호구 착용→ 지장물 주변 보양→ 비계설치→ (습식)석면 해체·제거→(습식)석면 봉합·반출→ 작업자 위생설비 통과·이탈 등”으로 규정되어 있다.

1) 「산업안전보건법」, 「폐기물관리법」, 「석면안전관리법」, 「석면 해체·제거 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법(환경부 고시)」, 「석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시(고용노동부 고시)」 등

[그림 1] 석면함유 (외장재) 해체 · 제거 주요내용

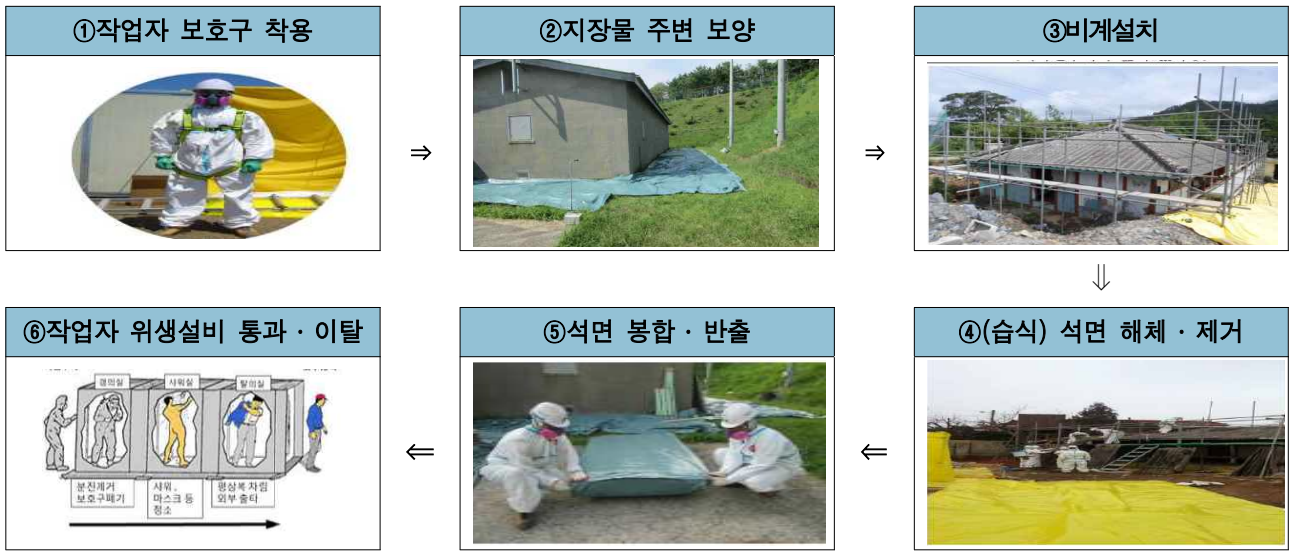

[그림 2] 석면함유 (내장재) 해체 · 제거 주요내용

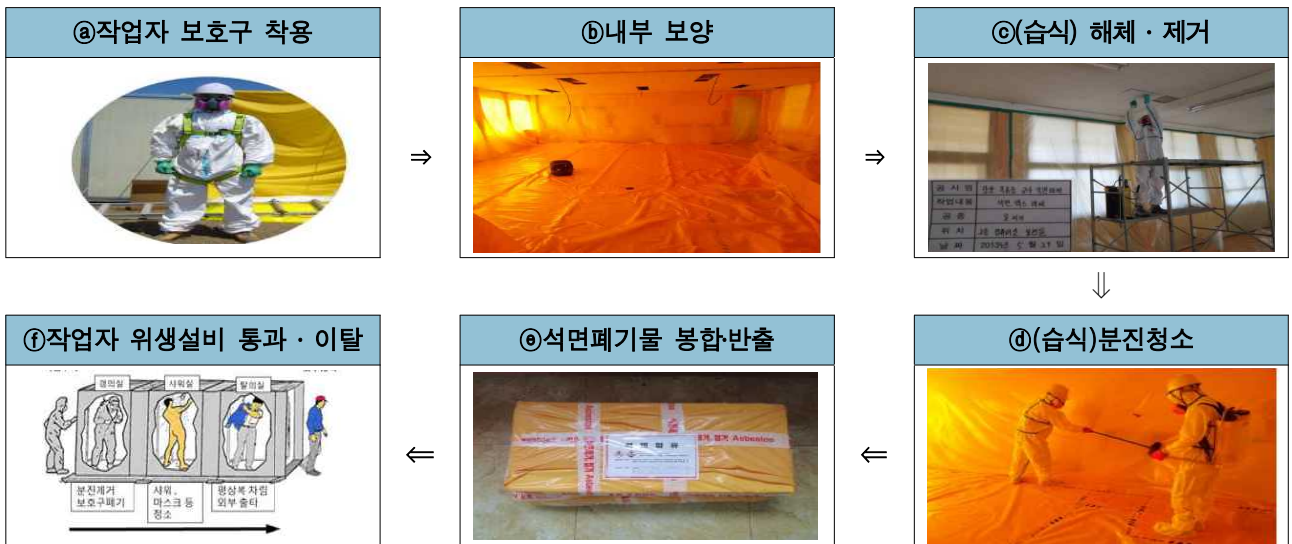

자료 : 한국석면협회 발간자료(2016. 상반기) 인용

따라서 公社가 석면 해체 · 제거 공사를 발주할 때에는 상기 작업 기준에 부합하는 공사대가를 반영하여 적정한 공사 수행을 도모하여야 한다.

그런데 감사기간 중 각 발주부서의 석면 해체·제거에 대한 공사대가 산정 현황을 조사한 결과, 아래 [표 1]과 같이 대부분의 설계가 작업기준의 일부 과정(비계설치 및 석면 해체·제거 등)에 대한 비용만을 반영하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 1] 석면 해체·제거 공사대가 설계 현황

본부명	지구명	석면 해체·제거 처리절차 및 공사대가 반영 현황							비고
		보호구	내외부 보양	비계설치	해체·제거	분진청소	봉합방출	위생설비	
서울본부	의정부	○	x	○	△	x	○	x	
	이천	○	x	○	△	x	○	x	
경기본부	군포	○	x	○	△	x	○	x	
	성남	○	x	○	△	x	○	x	
인천본부	파주	○	x	○	△	x	○	x	
대전충남		○	x	○	△	x	○	x	
		○	x	○	△	x	○	x	
충북본부	청주	○	x	○	△	x	○	x	
전북본부	진주	○	x	○	△	x	○	x	
		○	x	○	△	x	○	x	
전남본부	광주	○	x	○	△	x	○	x	
		○	x	○	△	x	○	x	
경남본부	김해	○	x	○	△	x	○	x	
	창원	○	x	○	△	x	○	x	

자료 : 감사실 조사자료 재구성

따라서, 석면 해체·제거 공사에 대한 합리적인 공사대가가 반영될 수 있도록 관련 대가기준을 수립할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

□□□□처장은

석면 해체·제거 공사에 대한 대가 기준을 수립하시기 바랍니다(개선).
