

## [32] [ 통보 ] 사항

1. 제 목 : 경사로 등 마감자재 선정 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

‘(주)엔에치에프 제11호 공공임대 위탁관리 부동산 투자회사(이하 “공공임대리츠 제11호”라 한다)’와 ‘(주)엔에치에프 제13호 공공임대 위탁관리 부동산 투자회사(이하 “공공임대리츠 제13호”라 한다)’는 [표 60]과 같이 아파트 건설공사 계약을 각각 체결하였고,

[표 60] 공공임대리츠 제11호 및 제13호 계약 현황

(단위 : 백만 원)

| 구분          | 공사명                               | 계약일         | 계약자                            | 계약금액    | 입찰방법                   |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|---------|------------------------|
| 공공임대리츠 제11호 | (공공임대리츠) ●●●● A-3BL 아파트 건설공사 1공구  | 2017. 6.28. | 뽕뽕건설 주식회사 외 5개사 <sup>58)</sup> | 115,411 | 기술공모형입찰 <sup>59)</sup> |
| 공공임대리츠 제13호 | (NHF제13호) ■■■■ B-3BL 아파트 건설공사 1공구 | 2017.12.28. | 뽕뽕건설 주식회사 외 5개사 <sup>60)</sup> | 156,300 | 기술공모형입찰                |

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

公社는 공공임대리츠 제11호 및 공공임대리츠 제13호의 자산관리자<sup>61)</sup>로서 위 [표 60]의 아파트 건설공사 전반을 관리하고 있다.

58) 주식회사 \* \* 토건, 주식회사\*엔지니어링건축사사무소, 주식회사 \* \* 종합건축사사무소, 주식회사 \* \* 앤이, 주식회사 \* \* 이씨

59) 발주기관이 작성하여 교부한 기본설계서와 입찰안내서에 따라 입찰자가 공사비 절감방안, 공기단축방안, 공사관리 방안 등을 제안하는 기술제안서를 작성하여 입찰서와 함께 제출하는 입찰로서, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제98조에 따른 기본설계 기술제안입찰방식이다.

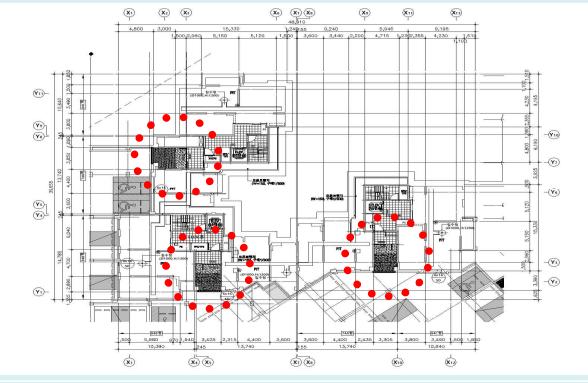
60) (주) \* \* , 주식회사\*엔지니어링건축사사무소, (주) \* \* \* 건축사사무소, 주식회사 \* \* 이씨, (주) \* \* \* 앤씨

61) 부동산의 취득·개발·임대·관리·개량·처분 등 자산관리를 위탁받은 자로서, 공공임대리츠가 가지는 입찰 및 공사의 모든 채권(권리) 및 채무(의무)를 대행하여 행사하는 자를 말한다.

가. ○○○○지구 A-3BL 경사로 마감재 선정에 관한 사항

○○○○지구 A-3BL에서는 [그림 7]과 같이 지하주차장에서 301동 등 5개동으로 진입하는 부분에 경사로(이하 “진입경사로”라 한다)를 설치하는 것으로 계획하였다.

[그림 7] 지하주차장과 각 동 진입경사로 마감재 적용 현황

| 지구 및 블록       | 경사로 적용현황(예시)                                                                       | 적용개소 및 면적 |              |                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
|               |                                                                                    | 동         | 경사로 마감재      | 개소 동별 경사로 면적(㎡) |
| ○○○○<br>A-3BL |  | 301동      | 에폭시 뿔철 또는 엠보 | 2 30.56         |
|               |                                                                                    | 302동      |              | 3 44.5          |
|               |                                                                                    | 303동      |              | 3 102.95        |
|               |                                                                                    | 304동      |              | 2 25.44         |
|               |                                                                                    | 306동      |              | 2 56            |
|               | 302동                                                                               | 합계        |              | 12 259.45       |

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한 기준」 제5조에 따르면 실내에서 일어나는 미끄럼 사고 등의 방지를 위해 건축물의 진입부분, 공용복도, 경사로 등의 바닥은 미끄럼을 방지할 수 있는 구조 및 재료로 하도록 규정하고 있다.

따라서 지하주차장에서 각 동 진입경사로의 마감재는 미끄럼을 방지할 수 있도록 미끄럼 저항 성능 등을 확인할 수 있거나 경험적으로 미끄럼이 쉽게 발생되지 않는 재료로 선정하는 것이 타당하다.

그러나 ○○○○지구 A-3BL에서는 진입경사로에 미끄럼 저항 성능이 확인되지 않은 에폭시 뿔철 또는 엠보로 적용하는 것으로 계획하고 있어, 향후 미끄럼으로 인한 사고 발생이 우려된다.

나. **□□□□□권 옥상 방수층 보호재에 관한 사항**

□□□□□권 B-3BL에서는 옥상 방수재 치켜올림부의 단부를 통한 우수유입 등을 방지하고자, [그림 8]의 ①과 같이 PVC 방수보호판(기성재)를 방수층 보호재로 계획하고 있다.

[그림 8] 옥상 방수층 보호재 설치 계획

**지구 및 블록**

**① PVC 방수포호판(기성재)**

**외부**

PVC 방수포호판(기성재)

THK80 누름콘크리트 (#8 와이어메쉬@150X150)  
THK0.05 PE필름 2겹  
THK110 비트롬 보온판 2중2회 시트방수 또는 복수지제(경비)적용  
△15X15 실링재

**B-3BL**

**실링**

**② 공사의 표준상세도**

시트방수 또는 누레탄토막방수 (비노출)  
THK1 스테인리스판  
Ø5 스테인리스 원니치못(L=16mm)@300  
THK12 환판

150, 20, 100, 45, 15, 40, G.L., 100±10, 30±10

THK20 P.E 방수층보조판

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

그러나 PVC 방수보호판(기성재)은 [그림 8]의 ②와 같이 방수층 보호재를 콘크리트면에 끼워넣어 단부를 통한 우수유입을 원천적으로 차단할 수 있는 구조가 아니라 콘크리트면에 맞대어 고정하는 방식으로 틈새 발생이 불가피하여 우수가 방수층 내부로 유입될 수 있다.

또한, PVC 방수보호판(기성재) 장기간 직사광선 등 열악한 외부환경에 노출이 불가피하고 누름콘크리트에 방수보호판의 일부가 매립됨에 따라 유지보수가 용이하지 않으므로, PVC 방수보호판(기성재)의 내구성에 대해서 검토하여 볼 필요가 있다.

그 결과, ●●●●지구 A-3BL에서는 진입경사로 출입시 미끄럼 사고가 발생  
되지 않도록 진입경사로 마감자재 변경이 필요한 것으로 판단되고, ■■■■■권

B-3BL에서는 옥상 방수층 내부로 우수 유입을 원천적으로 차단할 수 있도록 방수층 보호재의 형상 등을 변경할 필요가 있다.

## 5. 조치할 사항

○○지역본부장은

① ●●●●지구 A-3BL의 진입경사로 마감자재를 변경할 수 있도록 조치하기  
바라며, ② ■■■■■권 B-3BL의 방수층 보호재 우수유입을 원천적으로  
차단할 수 있도록 방수층 보호재의 형상 변경 및 내구성을 검토하여 PVC방수  
보호판(기성재)의 적용 여부에 대해 재검토하시기 바랍니다(통보).
