

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[통보]

제 목 위험공종(2m 이상 고소작업) 작업허가제 이행 미흡

해 당 부 서 [REDACTED]

조 치 부 서 [REDACTED]

내 용

1. 업무개요

[REDACTED]는 남하면 중심지에 교육, 문화, 복지시설 등의 주민 이용 가능 시설을 확충하여 거점기능을 강화하고 기초서비스 기능향상을 도모하며 주민의 삶의 질 향상을 위해 ‘[REDACTED] 기초생활거점조성 사업’을 [표 1]과 같이 시행하고 있으며

[표 1] 주요 공사 현황

지사명	지구명	사업명	주요 공사	총사업비 (천 원)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]

자료: 부서 제출자료 재구성

주요 계약현황은 [표 2]와 같다.

[표 2] 주요 공사계약 현황

계약명	공사계약			준공(예정)일
	계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)	
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

자료: 부서 제출자료 재구성

한편 [redacted] 사업을 시행하면서 2025년 12월 17일 가설기자재 등 정리를 위해 지게차 작업을 하였으며, 거점커뮤니티센터 내부에 냉난방기 실내기 설치를 위한 고소작업을 하였다.

2. 판단기준

국토교통부에서는 「건설 현장 추락사고 방지 종합대책」(2019. 4. 11. 시행)에 따라 공공이 시행하는 건설공사의 현장 안전관리 강화에 관한 필요사항을 정하여 건설현장의 안전사고 예방을 목적으로,

시공자는 2m 이상의 고소작업·1.5m 이상의 굴착·가설공사, 철골 구조물 공사, 2m 이상의 외부 도장공사, 승강기 설치공사 등 위험공종을 작업하기 전에 공사감독자 또는 건설사업관리기술인에게 작업계획을 제출하고, 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 승인을 받은 후 작업에 착수하도록 하는 「공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침」(2020. 4. 1. 시행)을 시행하였다.

또한 [그림 1]과 같이 해당지구 수시위험성평가서에 따르면 사다리를 사용 또는 말비계 위에서 양손을 머리 위로 올린 자세로 고소작업을 하는 경우 2인 1조 작업으로 안전사고를 예방하도록 명시하고 있다.

[그림 1] [redacted] 기초생활거점조성사업 수시위험성평가

현장명		남원지구		공사		안전		현장소장		공사감독	
작성일		2025-11-28		제		재		점		점	
작성자		김용진		수시 위험성 평가				25. 11. 28			
관리기간		25.12.01~25.12.10									
세부작업 (단위작업)	사용장비 /설비/인원	위험요인	재해 형태	빈도 (3)	강도 (3)	위험 등급	예방대책	개선후 위험성 (하도급사)	이행담당 (하도급사)		
4.7주장작업		화물트럭 적재함에서 지게차를 이용한 하역 작업 중 적재함 후면으로 치우쳐 있던 자재 파렛트에 지게차 포크를 넣고 들어올리는 순간 전도되면서 파렛트와 주변 적재를 사이에 끼임		2	3	상	▶ 사전 하역운반기계에 대한 작업계획서를 수립하고, 화물의 낙하 위험구간에 작업자 접근금지 등의 조치를 실시 검토/주론	중	안5부		
4.7주장작업		A형 사다리에 탑승하여 작업 중 용의 균형을 잃고 근로자 추락		2	3	상	▶ 사다리를 사용하여 고소작업을 하는 경우, 하부 아웃트리거 설치, 미끄럼방지패드 설치 등 전도방지조치를 실시하며 사다리 하부를 잡아줄 수 있도록 근로자 추가 배치하여 2인 1조 작업 실시 검토/주론	중	안5부		
								12.2	안5부		
								12.2	안5부		

자료: '[redacted] 기초생활거점조성사업' 수시위험성평가서 부분 발췌

그리고 公社 「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무)에 따르면 감독원은 시공 단계에서 「건설기술 진흥법 시행령」 제59조(건설사업관리의 업무범위 및 업무내용)¹⁾, 「건설기술 진흥법」 제49조제2항(건설공사감독자의 의무)²⁾, 「산업안전보건법」에 따른 법정 의무이행사항을 검토, 확인, 입회 및 승인 등을 하여야 한다.

따라서 시공자는 2m 이상의 고소작업 등 위험공종을 작업하기 전에 공사감독자에게 작업계획을 제출하여 공사감독자의 승인을 받은 후 작업에 착수하여야 하며,

감독원은 「공사감독업무지침」 제7조에 따라 시공단계에서 ‘위험공종 작업허가제’ 등 건설공사의 안전관리 및 안전 등에 관련되는 위험요소를 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ■■■■■지사는 남하면 기초생활거점조성사업을 시행하면서 「공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침」의 ‘위험공종 작업허가제’에 따라 2m 이상 고소작업에 대해서는 감독원이 사전 승인하여야 하며,

해당지구 수시위험성평가서에 따라 사다리를 사용 또는 말비계 위에서 양손을 머리 위로 올린 자세로 고소작업을 하는 경우 2인 1조 작업으로 안전사고를 예방하여야 하나,

[그림 2]와 같이 냉난방기³⁾ 실내기 설치를 위한 2m 이상 고소작업 시, 작업자는 2인 1조가 아닌 1인이 작업하였으며 ‘위험공종 작업허가제’에 따른 사전 감독원 승인 절차를 거치지 않은 사실이 있다.


1) 「건설기술 진흥법 시행령」 제59조제2항에 따르면 건설사업관리의 업무범위 및 업무내용에 건설공사의 안전관리 및 안전 등에 관련되는 위험요소 관리를 포함한다고 규정

2) 「건설기술 진흥법」 제49조2항: 국토교통부장관은 공사감독자의 업무 내용을 정하여 고시하여야 하며, 공사감독자는 이에 따른 감독 업무를 성실히 수행하여야 한다고 규정

3) 관급자재: 계약번호(00228169719) / 물품분류번호(40101787) / 품명(냉난방기) / 인도조건(현장설치도) / 계약 금액(53,449,590원) / 수량(1식)

[그림 2] '기초생활거점조성사업' 시스템 냉난방기 설치 작업

지적사항: 2m 이상 고소작업 시, '위험공종 작업허가제' 미이행 및 근로자 2인 1조 미배치

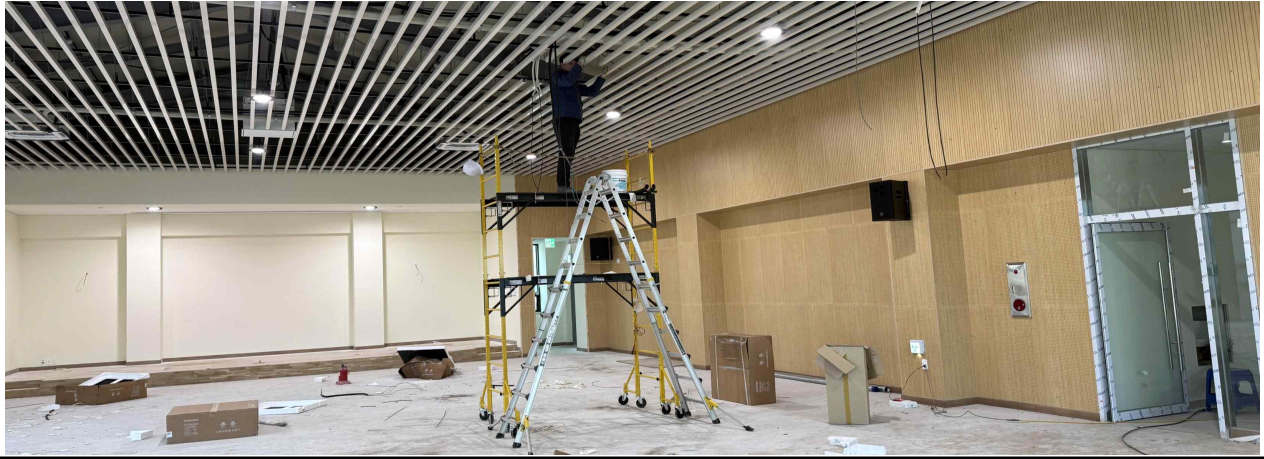

자료: 남하 거점 커뮤니티센터 사진 촬영(2025. 12. 17.)

그 결과 사전 안전조치 미흡으로 추락, 낙하, 감전 등 치명적 사고 발생 위험이 커지고, 2m 이상 고소작업의 2인 1조 미배치로 사고 발생 시 즉각적인 구조 및 응급조치가 불가능하여 중상 또는 사망사고로 이어질 수 있는 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서는 감사 지적사항을 인정하고 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 유사사례가 재발하지 않도록 건설공사 안전관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 : 통보

사장(지사장)은 2m 이상 고소작업 등 위험공종에 해당할 경우, 해당 지구 감독원 및 도급자가 '위험공종 작업허가제'를 준수하도록 관련 직원 교육 및 사례전파 바랍니다.(통보)
