

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [13] 지중송전 유입(OF) 케이블 급유장치점검 품셈 불합리
관 계 부 서 : 송변전운영처, 남서울본부
조 치 부 서 : 송변전운영처
내 용

1. 업무 개요

남서울본부는 유입(OF) 케이블¹⁾의 원활한 절연유 공급과 절연성능 유지를 위해 유입케이블 급유장치 점검을 주기적으로 시행 중에 있다.

00-50-56-F3-D3-9D / 20202734 / 2024-11-20 20:04:53

유입케이블 급유장치 점검은 「지중송전 운영업무기준」 11.2.2 점검주기에 따라 운영시스템 연계선로는 1회/년, 미연계선로는 1회/2월 시행하고 있으며, 점검 비용은 「전기표준품셈」 2-31-8 유입케이블 급유장치 점검 항목에 의거 급유개소를 기준으로 비용을 계상하고 있다.

[표 1] 유입케이블 급유장치점검 품셈

(단위: 개소)

공 종	전기공사기사	특고압케이블전공	특별인부
유입케이블 급유장치 점검	0.14	0.50	0.25

1) 유입(Oil-Filled) 케이블 : 절연유와 절연지를 #@◎여 절연 성능을 유지하는 지중케이블

2. 관계 규정 및 판단기준


「2024년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」Ⅱ.주요 항목별 지침 3.사업비에 따르면 비핵심사업·예산낭비요소 발굴 등을 통해 지출 구조조정을 적극적으로 추진하도록 하고 있다.

따라서 공사설계 시 발생될 수 있는 예산낭비 요소가 없는지 점검하고 개선할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

현장에 설치된 급유장치는 상분리형과 3상일괄형 2가지 종류가 있는데, 상분리형 급유장치는 각 상별 유입케이블의 절연유 공급을 관리하고 있는 반면에 변전소 입상부 등 단구간 절연유 공급에 주로 사용되고 있는 3상일괄형 급유장치는 유입케이블 3상의 절연유 공급을 일괄 관리하고 있다.

[그림 1] 급유장치의 종류

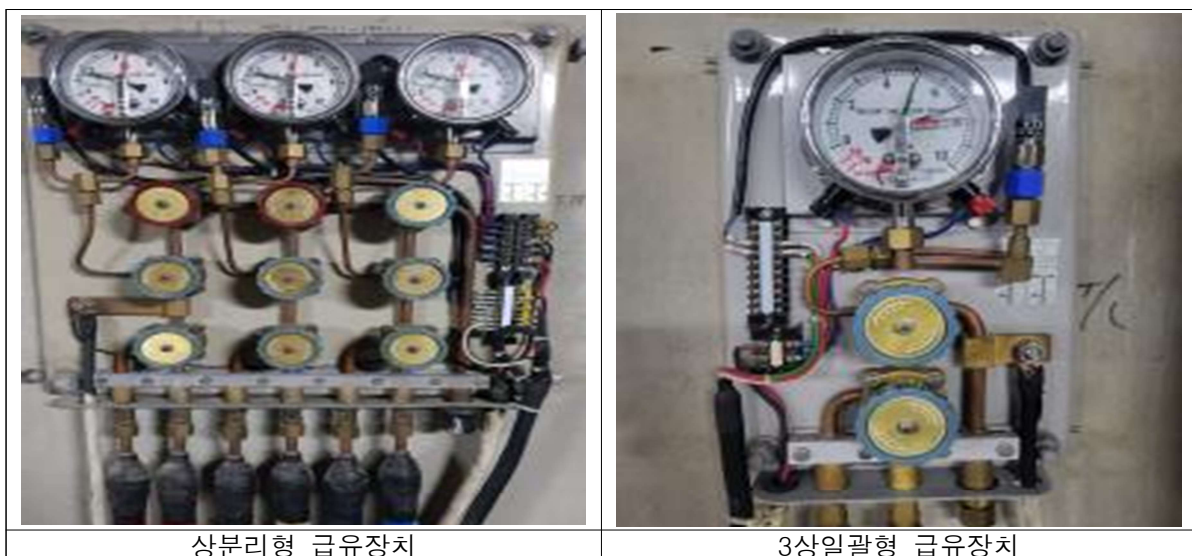

[표 2] 전사 유입케이블 보유 사업소 급유장치 설치 현황

순 번	사업소명	급유장치 설치 현황 (단위 : EA)		
		상분리형	3상일괄형	합 계
1	☐☐☐☐	익명화		
2	%☆☐			
3	■☐☐☐			
4	☐☐☐☐			
5	#◆▶			
6	※▷☐			
7	%●☐☐			
8	▽▽▽			
9	▼★%			
10	●▷●			
11	&◀☐☐			
합 계		559	106	665

남서울본부에서 시행 중인 2023-2024년 남서울본부 지중송전설비 위탁정비 공사 설계서를 검토한 결과 급유장치 점검 품셈은 개소 단위로 되어있어 급유장치의 종류와 관계없이 동일한 비용을 지불하고 있음을 확인하였다.

그러나 유입케이블 1회선(3상)에 일괄적으로 절연유를 공급하는 방식인 3상일괄형 급유장치는 각 상에 절연유를 공급하는 상분리형 급유장치에 비해 경보 회로 점검, 밸브 동작상태 확인 등의 점검 물량이 적어 상분리형 급유장치와 동일한 비용으로 지불하는 것은 과다하다고 판단되며, 현장에 설치된 설비의 특성에 맞게 품셈을 개선하는 것이 타당한 것으로 보인다.

관계부서 의견

송변전운영처 담당자는 3상일괄형 급유장치의 점검 할증이 과다하게 적용되고 있는 것으로 보인다는 감사자 의견에 동의하였으며, 설비 특성에 맞는 품셈 개정이 필요하다고 답변을 하였다.

조치할 사항

송변전운영처장은 유입케이블 급유장치 점검 관련 품셈 개정을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
13	개 선 1	예산절감 [113,805,252원]		송변전운영처 남서울본부	송변전운영처

※ 산출근거

- ① 대상수 산정 : 유입케이블 보유사업소의 3상일괄형 급유장치 설치 대수
- ② 절감액 산정(위탁 설계서 참고) : 3상일괄형 급유장치 점검 비용을 1/3로 감소시켰을 때의 금액

[별첨] 품셈 개정에 따른 예산 절감액

(단위: 원)

3상일괄형 급유장치 설치 대수 (전사)	연간 절감액	대상기간(년)	절감액
106	37,935,084	3	113,805,252
