

- ◆ 선진지 시설견학을 통한 우수사례 벤치마킹
- ◆ CEO 지시사항 이행 및 공단 혁신계획에 따른 업무추진

□ 추진배경

○ 기존설비의 문제점

- 웨어 안쪽으로 녹조류(이끼)가 다량발생하여 월 1회 이상 청소 필요
- 웨어 청소 진행 시 안전사고 위험이 있음(미끄러짐으로 인한 골절)
- 녹조류로 인해 TMS 측정 오류 발생(SS 상승 오류)

□ 사업개요

○ 사업명: 웨어 덮개 개선 자재 및 기타 자재 구매

○ 사업예산: 금12,058천원


○ 사업기간: 2024. 8. ~ 10.

○ 사업내용:

- 웨어덮개 및 웨어덮개 고정사슬 설치(1지/2지)

□ 개선사항

○ 웨어덮개를 설치하여 녹조류 생성차단

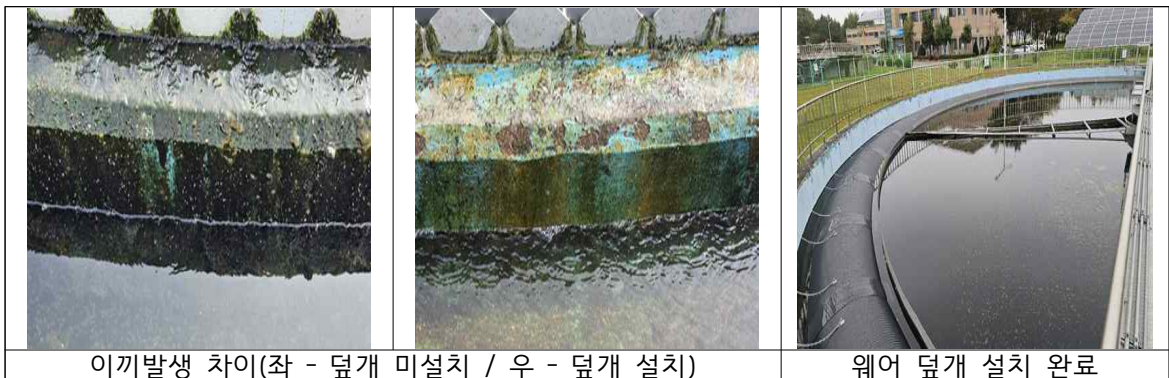

□ 추진성과

- 웨어 덮개 설치로 인한 녹조류 생성 차단
- 설비 유지관리비용 절감(이끼제거기 수리비용 및 전기사용료 절감)
- 녹조류로 인한 TMS 측정 오류 방지
- 자체 연구 및 자체 설치 작업으로 인한 예산 절감(외주공사 대비 95%예산 절감)
