

③ 건명 : 폐정화조 및 웅덩이를 생태 연못으로 조성

○ 추진개요


- 공중화장실 배출수가 공공 하수처리장과 연결됨에 따라 정화조 기능상실 및 미관을 저해하고, 야영장 주변 웅덩이가 성수기 야영객 급증시 악취 등 수질 악화 우려가 있어 생태연못으로 개선 추진

○ 추진내용

- 생태연못 3개소 조성

장소	내용	비 고
○○화장실	● 폐정화조(FRP) 철거 후 연못 조성 · 식물 식재, 어류 방생	40㎡
□□화장실	· 생태관찰로 조성 및 안내표지판 설치	50㎡
◁◁◁야영장 화장실	● 수질정화 생태연못 조성 · 자연발생 웅덩이 확장: 30㎡→50㎡ · 수질정화틀 설치(정화식물, 황토 이용) · 생태관찰로 조성 및 안내표지판 설치	50㎡

- 전문가 자문 및 벤치마킹 : ◇◇◇◇교육원, △△△야생화식물원 등
- 야영장웅덩이 수질개선 : BOD: 12.98_{ppm}→5.73_{ppm}, SS: 9.96_{ppm}→7.03_{ppm}
- 야생동물이 찾는 공간으로 변모 : 멸종Ⅱ급 삵, 고라니, 멧돼지 등
- 환경교육 프로그램 운영 : 15회 실시, 484명 참여

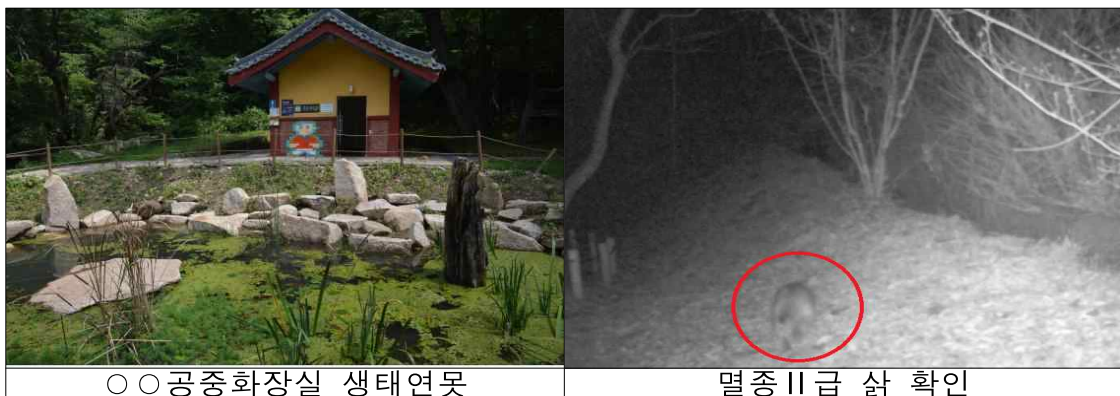

○ 추진성과

- 새로운 서식처 조성을 통한 생물종 다양성 증대
- 오수방류수 수질정화 및 비점오염원 저감을 통한 국립공원 수생태계 보전
- 미래세대, 지역사회 환경교육 공간으로 활용
