

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

통 보(우수사례)

제 목 여객선 야간운항 안전항로 확보에 관한 사항

소관부서 완도지사 운항관리센터

조치부서 운항정책실

1. 업무 개요

완도지사 운항관리센터(이하 “센터”라 한다)는 관내 (주)□□운수 등 6개 내항여객운송사업자(이하 “사업자”라 한다)와 ◇◇◇◇◇호 등 23척의 여객선에 대하여 해양사고 예방 및 해양안전문화 확산을 위해 사업자, 안전관리책임자 및 선원에 대한 안전관리교육 등 운항관리업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「해운법」 제22조에 따라 사업자는 한국해양교통안전공단(이하 “공단”이라 한다)이 해양수산부령으로 정하는 자격을 갖춘 사람 중에서 선임한 선박운항관리자(이하 “운항관리자”라 한다)로부터 안전 운항에 필요한 지도 및 감독을 받도록 규정하고 있다.

또한, 공단은 해양교통사고 예방을 위한 사업 및 해양교통체계 운영과 관리 지원을 위한 사업을 수행함으로써 해양교통 안전을 확보하여 국민의 생명, 신체 및 재산 보호에 이바지하여야 한다.

「양식산업발전법」 제39조 제1항에 해양수산부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장(이하 “행정관청”이라 한다)은 양식업자에게 양식장의 표지를 설치할 것을 명령할 수 있고, 같은 법 시행규칙 제33조에는 행정관

청으로부터 양식장 표지 설치 명령을 받은 양식업권자는 그 명령을 받은 날로부터 30일 이내에 양식장의 기점 및 양식장 구역을 식별할 수 있는 표지를 설치해야 하며, 양식장 표지와 설치 방법은 「양식장·어장 표지시설의 설치기준」⁸⁾으로 규정하고 있다.

3. 문제점 및 개선사항

가. 문제점

완도군은 수산식품산업의 중심지역으로 불리며 완도산 수산물의 전국 점유율은 전복은 81%, 다시마 미역 등 해조류는 60% 차지하고 있으며, 수산물 대부분은 양식으로 생산되는데 양식장은 여객선 항로 주변까지 넓게 설치되어 있어, 시계 제한 등 상황에서 양식장 관련 해양사고 발생 가능성이 상존하고 있다.

이에 따라 센터에서는 여객선의 안전운항 확보를 위하여 항로상 위해요소 제거 노력을 계속 기울여 왔으나, 화흥포-소안, 당목-일정 항로에 야간운항을 개시⁹⁾하면서 그 위험이 커지게 되었다.

나. 개선추진내용

센터에서는 지자체와 간담회를 통해¹⁰⁾ 여객선 안전운항을 위한 양식장 관리의 필요성에 대한 공감대를 형성하였고, 어업지도선을 이용하여 여객선 항로 안전 확보를 위한 합동점검 시행을¹¹⁾ 통해 위험 구간에 양식장 경계를 표시하는 어장표지 시설을 설치할 수 있도록 협의 하였다.

그 결과 화흥포-소안 항로의 경우 안전한 야간운항 환경 확보를 위하여 완도군, 운영 선사(소안농협) 및 양식장 설치 어촌계와 간담회를 실시하여 첫째, 여객선 항로 폭 확보를 위한 항로 인근 양식장을 철거하며 둘째, 양식장의 경계 확인 및 항로 침범을 예방하기 위한 어장표지시설(점등부이)

8) 양식장·어장 표지시설의 설치 기준(해양수산부고시 제2023-697호, 2023.05.08)

9) 화흥포-소안 항로 2023.07.24. 당목-일정 항로 2021.10.15. 야간운항 개시

10) 화흥포-소안 야간운항 관련 간담회 결과 보고 : 완도운항관리센터-748(2024.03.16.)

11) 야간운항 항로(당목-일정) 여객선 운항위해요소 현장확인(합동점검) 협조 요청 : 완도운항관리센터-1946(2024.06.14.)

설치를 합의하였다.

또한 여객선의 야간운항 개시 전 현장 합동점검을 통해 합의사항의 이행여부에 대하여 확인하였으며, 야간운항 개시 후 운항관리자의 지속적인 승선지도 등을 통해 운항 항로상 확인된 위해요소에 대한 조치를 모두 완료하였다.¹²⁾

그리고 땅끝-산양, 당목-일정 항로에도 여객선 항로 인근에 설치된 양식장이 일몰 후 육안 확인이 어려워 여객선 입·출항 시 양식장 침범 가능성이 지속적으로 우려되는 상황이었다.

이에 센터에서 지자체(완도군, 해남군)과 협업하여 양식장 경계 식별용 점등부이를 설치¹³⁾하였다.

[사진] 간담회 및 현장점검 관련 사진




화흥포-소안 항로 야간운항을 위한 간담회



땅끝-산양 항로 위해요소 개선을 위한 간담회



화흥포-소안 항로 야간운항 사전 합동점검

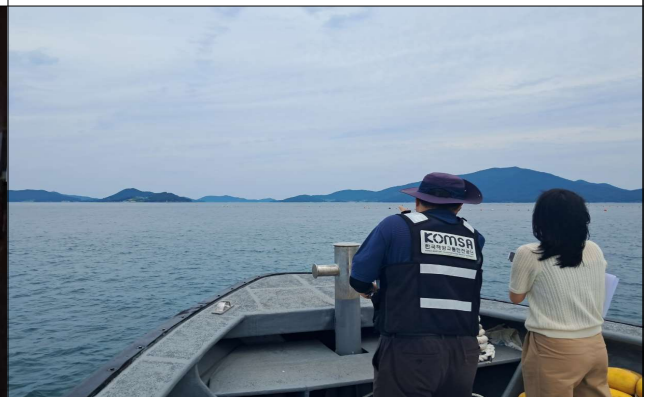

당목-일정 항로 어업지도선 이용한 합동점검

12) 위해요소 2건 해소: 항로 인근 김양식장 파손(2024.03.31. 조치완료), 어장표지시설 유실(2024.09.12.. 조치완료)

13) 점등부이 설치 완료 : 땅끝-산양 항로(2024.07.31.), 당목-일정 항로(2024.08.03.)



화흥포-소안 향로 점등부이(18개소) 설치



땅끝-산양 향로 점등부이(5개소) 설치



땅끝-산양 향로 점등부이(5개소) 설치 위치

당목-일정 향로 점등부이(4개소) 설치 위치

다. 추진성과

센터는 여객선 안전운항 확보를 위해 관내 유관기관, 여객선 사업자 및 양식어업인들과 간담회와 업무협업을 통하여, 향로 인근 양식장 경계에 점등부이를 설치하여 여객선의 향로 이탈, 양식장의 향로 침범 등에 대한 선제적 조치를 실시하였다.

이외에도 유관기관과의 합동점검을 통해 향로상 위해요소 제거를 위해

지속적으로 노력한 결과, 현재까지 야간운항 선박은 해양사고 발생없이 안전하게 운항하고 있다.

4. 조치할 사항

- 운항본부장(운항정책실장)은

위 우수사례를 널리 알리고 전국 운항관리센터에 홍보하는 등 관련 업무 추진에 참고하시기 바랍니다. [통보(우수사례)]
