

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [3] 대규모 건설공사 장기미결 적극 해소 및 최적 공급방안
검토를 통한 투자비 절감

관 계 부 서 : 남서울본부 배전총괄부

모 범 직 원 : 남서울본부 배전총괄부 대리 ■※●

내 용

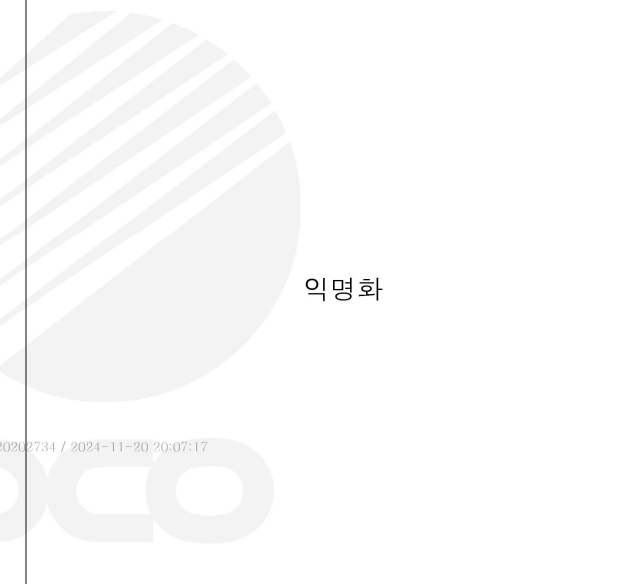
위 직원은 2023년 1월부터 현재까지 남서울본부 배전총괄부 배전건설팀에 근무하며 항상 성실한 자세와 투철한 사명감으로 맡은 업무를 책임감 있게 수행하여 왔고, 특히 택지 및 지중화 등 건설공사를 수행함에 있어 장기 미결 공사를 적극적으로 해소하여 회사 재무 개선에 크게 기여하였다.

1. ■※\$ 특수공법 고객부담금 납입 거부건 공사비 재산출(45억)을 통한 공사비 객관성 확보

'10. 3월 ★♥☎의 전기사용신청으로 남서울본부(당시 경인건설단 남서울건설소)에서 착공된 「■※\$ 배전간선 설치공사(관로)」는 공사 진행 도중 '12.12월 서초지사(당시 강남지사)에서 시행하는 '●*☎ ☎☎■ 40,000kW 특고신규공사'의 고객 적기 공급 곤란 예상에 따라 택지 내 고객 전용관로 설치 및 ★★★ 통과 semi-shield 압입공사를 포함 시공하여 고객의 적기 전력 공급에 협조하였다.

그러나 '16.12월 공사 준공 이후 고객의 압입공법 변경(강관압입→semi-shield) 관련 추가공사비 수용불가 및 납입거부 통보와 시공사 준공 세부내역 제출 누락 사유로 인해 '23. 1월까지 무려 6년간 고객부담금 정산이 장기 지연되었다.

[표1] 고객부담금 수용불가 및 납입거부 관련 문서

서초지사 공사비 재검토 요청 공문	고객 공사비 검증자료 요청 공문
	

이에 담당자는 고객부담금 정산 소멸 시효('24.11월) 이전 고객부담금 재산출 통보를 위해 해당 구간의 착수 당시('13년 상반기) 단가로 고객 사용 규모의 관로 신설 실적공사비 재산출 및 ★★★ semi-shield 압입공법 고객부담금 설계용역 발주 등의 적극적인 업무처리를 통해 '24. 7월 서초지사에 재산출 부담금을 통보하여 관련문제 해결을 위한 기반 마련에 적극 기여하였다. (현재 남서울본부 고객부담금 추가청구 관련 소송 추진 중)

[표2] semi-shielded 압입공법 고객부담금 설계용역 발주 자료

설계용역 계약의뢰	설계용역 결과 공사계획평면도
익명화	익명화

[표3] 고객부담금 재산출내역 통보(→서초지사, '24. 7.19)

관련공문	상세 내역서
00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-11-20 20:07:17 익명화	익명화

2. ◆◆◎ 6회선 회선인출 장기미결 공사 시공방안 수립

'19. 4월 「◆◆◎ 6회선 인출 관로공사」 경과지 내 교차로 2개소의 하수암

거로 인한 토피 부족으로 유관기관 협의가 지연되는 등 관로 개착시공을 5년간 시행하지 못하였다. 이에 담당자는 행정기관, 토목전문가, 시공전문가를 구성하여 하수암거 구간 압입 시공 방안을 마련했으며, 최적 경과지 선정 및 과거 지반조사 자료 등을 활용하여 예산 절감에 기여하였다. 또한 ◆◆◎-▼#\$ 연계점 전면검토를 통해 ▼#\$ 과부하 해소 기틀을 마련하였다.

[표4] ◆◆◎ 인출 관로공사 시공방안 변경 관련 문서

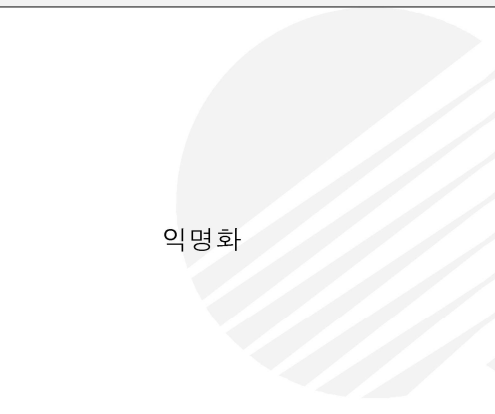
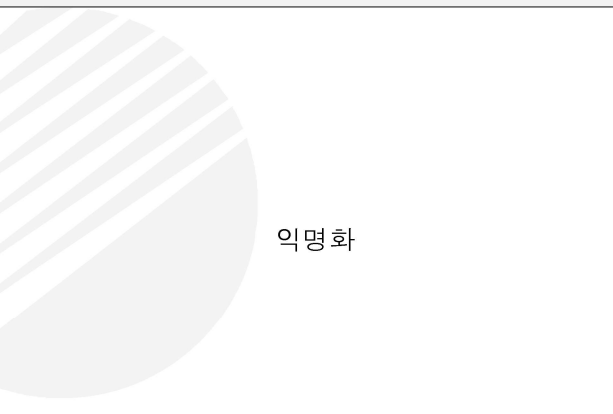
◆◆◎ 인출공사 시공방안 변경 공문	투자심의서
익명화 00-50-56-R3-D8-9D / 20202734 / 2024-11-20 20:07:17	익명화

3. 과천 주암지구 최적 공급방안 검토로 투자비 절감

'23. 5월 ㄱ#의 간선설치 요청으로 남서울본부에서 추진 중인 「ㄱ▶ ㄴㄴ
 ◁ 배전간선 설치공사」는 수요예측 협의 결과 50,822kW로 총 6회선 규모로 확
 정되었다. 그러나 전기수용장소 인근 변전소인 ▷◆ㄴ의 용량부족 및 ㄹㄴ◆의
 여유BAY 부족, 인근 택지 내 신설예정인 ㄴ◆★의 부지확정 지연으로 공급방안

이 불투명하였고, 이에 담당자는 신규택지의 연도별 예상부하및 䄡◆★ 가압 예상시기, 인근 2개 변전소와 7개 기설선로 부하의 종합검토를 통한 최적의 공급 방안을 도출하였다. 또한 최소한의 회선인출 및 관로굴착 방안을 적극 검토하여 약 3,063백만원의 투자비 절감에 기여하였다.

[그림1] 단지 접근 배전선로 공급능력 검토

기설선로 경과도	기설선로 부하검토 내역
	

[그림2] 공급방안 비교검토 자료

공급방안별 경과지 및 간선 시공계획	
익명화	

