

주의 요구 및 통보 사항

일련번호 19생산운영 - 2
제 목 선로 공용사용에 따른 임대 계약 추진 미흡
소관부처 梟梟기지본부
관계부서
내용

우리 공사는 梟梟기지 154kV 수전선로의 최단 노선 선정¹⁾과 수전 완료 후 미사용 22.9kV 전용선로²⁾에 대한 사용처 발굴 필요로, ♠♠♠♠은 梟梟♡♡♡♡ 해양소수력 발전전력의 한전 전력계통 연계 필요에 의해 梟梟기지본부와 梟梟♡♡♡♡는 2015. 12. 17. 【표 1】과 같이 “梟梟기지 22.9kV 전용선로 공동이용 협약”을 체결하였으며,


【표 1】협약 주요 내용

구간	대 상	협업내용(가스공사/♠♠♠♠)
♠♠♠♠ 구간	♠♠♠♠ 내 154kV 전선관로	(공사)점용료 지급 / (♠♠♠♠) 부지임차
1구간	♠♠♠♠부터 梟梟기지까지의 22.9kV 전선관로	(공사)설계 및 시공 / (♠♠♠♠) 공사비 부담
2구간	梟梟기지 내 22.9kV 전용선로	(공사)전선관로 부지 임차 / (♠♠♠♠) 임대 및 점용료 지급
3구간	梟梟기지부터 한전까지의 22.9kV 전용선로	(공사)공동이용 승인 / (♠♠♠♠) 사용료 지급

【표 2】와 같은 내용으로 모든 선로공사가 종료된 2017년 9월까지 별도의 임대차 및 사용계약을 체결하여 시행하기로 하였다.

1) 154kV 수전선로 ♠♠♠♠ 구내 통과 시 약 3.1km 단축, 공사비 약 80억 원 절감

2) 전용선로란 특정고객(가스공사)에게만 전기를 공급하기 위한 한전소유(건설비는 공사가 부담) 전력공급설로를 말함

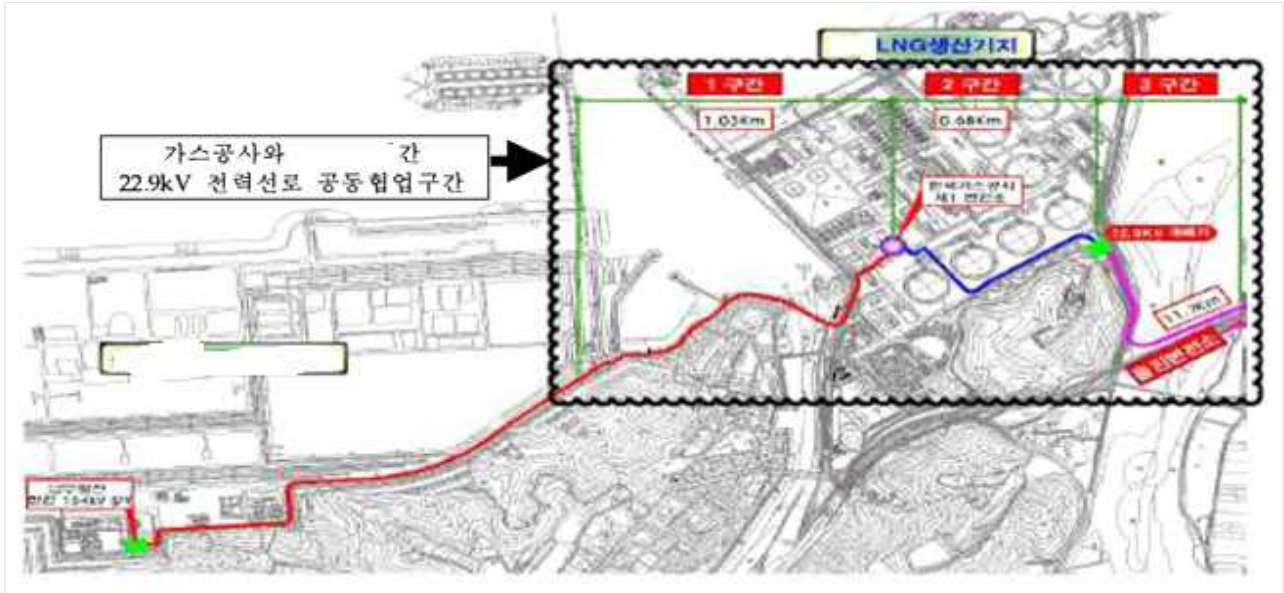

【표 2】협약에 따른 협업 주요 내용

구간	계약	대상	지불	비고
♠♠♠♠ 구간	계약①	154kV 선로 점용료(토지)	가스공사 → ♠♠♠♠	임대차계약
1구간	-	해양소수력용 선로 설계/시공	♠♠♠♠ → 가스공사	공사비 부담
2구간	계약②	22.9kV 선로 점용료(토지, 관로)	♠♠♠♠ → 가스공사	임대차계약
3구간	계약③	22.9kV 전용선로 사용료	♠♠♠♠ → 가스공사	사용계약

※ (1구간) 설계/시공 및 공사비 부담은 2017. 5. 24. 완료함

이에 따라 ㄱㄱ기본부 ㄴㄴ부(ㄷㄷㄷㄷ부와 함께)는 2017. 6. 26.부터 2017. 8. 25.까지 4회에 걸친 ♠♠♠♠과의 회의를 통해 양사가 개별 시행한 감정평가를 바탕으로 토지와 관로 임대차 및 공사 소유 22.9kV 전용선로 사용 계약을 체결하며, 임대료는 양사 부지 내 공사 개시시점부터, 사용료는 소수력 발전전력 송전시점부터 적용하기로 하는 ‘임대차 및 사용료 계약’ 추진을 위한 세부내용을 협의하였다.

따라서 ㄱㄱ기본부 ㄴㄴ부는 협약서에서 정한 2017년 9월까지 감정평가를 시행한 후 그 결과를 바탕으로 위 【표 2】의 임대차 및 사용계약을 ♠♠♠♠과 체결하여 임대료와 사용료를 지급하거나 지급받아야 한다.

그런데 위 부서는 선로 공용사용에 따른 임대차와 사용료 계약을 당초 협약서에서 정한 기한인 2017년 9월까지, 더욱이 이후 약 2년이 경과한 2019년 10월까지도 완료하지 못하여 【표 3】과 같이 2019년 10월 기준, ♠♠♠♠으로부터 지급받아야 할 총 61.8백만 원의 임대료와 사용료 수취가 지연되는 결과를 초래하였다.

【표 3】 감정평가에 따른 임대료 및 사용료

(단위: 천 원)

구분	내용	적용기간	임대/사용료	지 불
계약①	(우리공사) 154kV 선로 점용료	‘17.01월~’19.09월	35,233	우리공사→♠♠♠♠
계약②	(♠♠♠♠) 22.9kV 선로 임대 및 점용료	‘17.01월~’19.09월	13,196	♠♠♠♠→우리공사
계약③	(♠♠♠♠) 22.9kV 전용선로 사용료	‘17.10월~’19.09월	83,847	♠♠♠♠→우리공사
계			61,810	

한편 위 부서는 선로공용사용 관련 감정평가를 시행한 후 2017. 12. 29. 그 결과를 ♠♠♠♠(☞☞☞☞☞)에 송부하였고, 이후 약 8개월 후인 2018. 9. 6. “선로공용 사용관련 계약 및 세부협약” 체결을 ♠♠♠♠에 요청한 바 있으며, ☞☞기지본부 ◁◁◁◁부의 요청³⁾에 따라 2018년 12월부터 2019년 6월까지(약 6개월 간) 【표 3】의 ‘계약③’에 대한 사용료 계약 추진을 중지한 바 있다.

조치할 사항

- ① “☞☞기지 22.9kV 전용선로 공동이용 협약” 후속업무(임대차 및 사용료 계약 체결) 추진을 미흡하게 한 담당자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

☞☞기지본부 ▽▽부 과장 DDD(사번: ●●●●●●●●)

- ② ☞☞기지본부장은 “☞☞기지 22.9kV 전용선로 공동이용 협약”에 따른 임대차 및 사용계약을 조속히 추진하시기 바랍니다. (통보)

3) ◁◁◁◁부는 2018년 12월 “우리공사의 유효중인 22.9kV 전용선로 사용권리 유효여부에 대한 법률자문 중임”을 사유로 위‘계약③’에 대한 사용료 계약 추진 중지를 요청하였고, “19년 6월 법률자문 결과((공동사용을 합의 하면서 일정한 사용료의 지급을 요구 할 수 있음)를 ▽▽부에 송부함
