

수범사례 제출양식

□ 부서명 : 광주지사 시설팀

구 분	주 요 내 용	비 고 (분야)																
제 목	공군 유도로사업 공항공사 분담비용 절감 (광주공항 유도로 재포장사업 및 슬라이딩게이트 설치)	○ 공항공사 →이하“공사”																
추 진 배 경	○ 공사 분담비 저감대책(광주공항 유도로 재포장사업) ○ S/G 증설 요청	○ 슬라이딩 게이트 →이하“S/G”																
현 황	○ 유도로 재포장사업 분담비용 제시 ○ 민/군 보안경계 이중강화 위한 S/G 증설 요청(기존 2대 → 변경 4대)																	
문제점	○ 공군이 제시한 사업분담비용 과다 - 민항기종 특성(고중량,대형)에 따른 포장 확대분 청구(50%) ○ S/G 증설 시 항공기 후류에 따른 위험																	
개 선 사 항	○ 분담비용에 대한 합리적 협의안 제시 및 관철 - 포장두께 : 총두께(38cm)에 대한 민항기종 필요 초과분(8cm)만 분담 - 노면포장 : 폭(7.5m)에 대한 민항기종 필요 초과분(4.5m)만 분담 - 순찰도로 : 사용빈도 월등한 공군에서 100% 분담 - 배수시설 : 당초 100% 사업비 요청 대비 유역면적 고려하여 50%만 지급 ○ S/G 증설건 취소 및 현행유지 - 항공기후류(Jet Blast) 관련 안전성 미확보로 기존시설만 교체																	
개 선 성 과	○ 공항공사 분담비용 및 시설공사 예산 절감 : 9,205백만원 단위 : 백만원 <table><tr><th>구 분</th><th>당 초 (총사업비의 50%)</th><th>조 정 (총사업비의 15.5%)</th><th>절 감 액</th></tr><tr><td>유도로재포장사업</td><td>12,577</td><td>3,921</td><td>8,656</td></tr><tr><td>S/G증설</td><td>549</td><td>-</td><td>549</td></tr><tr><td>합 계</td><td>13,126</td><td>3,921</td><td>9,205</td></tr></table>	구 분	당 초 (총사업비의 50%)	조 정 (총사업비의 15.5%)	절 감 액	유도로재포장사업	12,577	3,921	8,656	S/G증설	549	-	549	합 계	13,126	3,921	9,205	
구 분	당 초 (총사업비의 50%)	조 정 (총사업비의 15.5%)	절 감 액															
유도로재포장사업	12,577	3,921	8,656															
S/G증설	549	-	549															
합 계	13,126	3,921	9,205															

대한민국을 띄우다.



한 국 공 항 공 사



수신처 내부결재

(경 유)

제 목 유도로 재포장사업 관련 합동회의 결과

1. 공군 계획처-1556('16.02.22.) 『유도로 재포장사업 관련 비용분담 합의서 체결을 위한 실무회의 계획 통보』 관련입니다.

2. 광주공항 유도로 재포장사업 관련 “비용분담에 대한 협정체결을 위한 합동회의 결과”를 붙임과 같이 보고합니다.

붙 임 : 유도로 재포장사업 협정체결 관련 합동회의 결과(I) 1부. 끝.

03/07

과장

강동순

차장 김형택

팀장 최준호

지사장 최성종

협조자

시행 광주지사-1309 (2016.03.07)

접수 ()

우 62425 광주광역시 광산구 상무대로 420-25 한국공항공사 광주지사

URL: www.airport.co.kr

전화 062-940-0339

전송

E-mail: kds8@airport.co.kr

공개

Biz and Life를 창조하는 World-Class 공항기업

유도로 재포장사업 협정체결 관련 합동회의 결과(I)

재포장사업 관련 협정서 체결을 위한 합동회의 요약내용

□ 회의개요

- 일시/장소 : '16.2.25.(목), 14:00 / 공군 제1전투비행단 회의실
- 참석자 : 13명(공사 4명, 부항청 2명, 공군 7명)
 - * 공사(본사 공항계획팀장 등 2, 광주지사 시설차장 등 2), 부항청 1, 출장소 1, 공군 시설대대장 및 계획처장 등 7)

□ 사업개요

구 분	내 용
사업구간 / 내용	광주공항 유도로 / 기존포장 철거 및 재포장
사업비	총250억원(용역 22억원-설계 8억,감리 14억, 공사 228억원)
사업기간	'16. 5.~'17. 11.(18개월)

□ 합의사항(참고 1)

구 분	民	軍
사업비 전 담	민항 계류장 연결유도로(G6, G7)	공군 계류장, 연결유도로(A,C,D)
사업비 분 담	民·軍이 공동 사용하는 유도로("G", "B")의 사업비는 일정 부분 분담 동의하나, 분담비율 등 방법에 대하여 추가 협의	

□ 쟁점사항 : 분담비율

- (공군) 軍·民이 공동사용에 따라 분담비율 5:5 및 민항기에 따른 포장

두께 증가분에 대하여 民분담(사례 : 사천공항 유도로 재포장)

☞ 사천공항과 참고2(장관간 비행장 협정사항) 제5조 ③항에 접목

○(공항공사) 민항기 공용에 따른 포장강도(두께) 상향부분만 民분담

(사례 : 대구·김해공항 및 최근 합의를 체결한 청주공항)

☞ 청주공항과 참고2(장관간 비행장 협정사항) 제5조 ④항에 접목

○(부항청) 기관間 이견은 면밀히 검토 후 추후 재협의


□ 향후계획

○ 분담의견에 대하여 종합적 검토 후 회의개최 예정(3월15일경)

→ 공사는 사천공항 사례에 대하여 합의문 체결배경 등 종합검토 후 차기 회의시 제시

참고 1

광주공항 유도로 재포장 사업구간

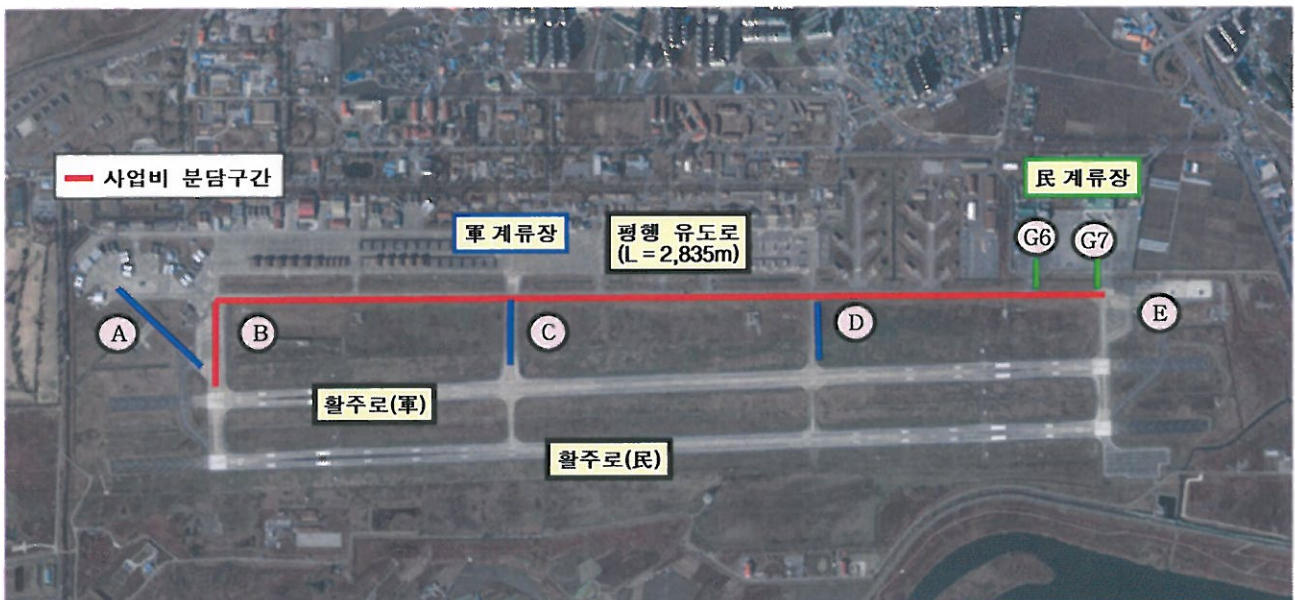

(사진참조 google)

구 분	사업비 분담구간 세부위치
軍 전담(청색)	軍계류장, 활주로 연결 중간 유도로 3개소(A,C,D)
民 전담(녹색)	민계류장 연결유도로 2개소(G6, G7)
軍·民 분담(적색)	평행유도로(G) 및 직각유도로(B)

□ 제5조(시설의 설치 및 보수)

- ③ 공동으로 이용하는 시설물의 일상적 유지보수비 부담비율 및 세부 집행 절차는 각기지 부대장과 국토교통부 지방항공청장 및 한국공항공사 지사장간의 협정에 따라 정하며 일상적 유지보수비 부담비율 산정 및 운영은 별표 4항(등가 이륙횟수를 산정한 비율 또는 군·민항공기 이·착륙 횟수 비율)에 따라 적용한다.
- ④ 국토교통부와 국방부가 공동으로 이용하는 시설물의 대규모 보수공사는 사업별로 각 기지 부대장과 지방항공청 간에 사업 계획, 사업추진 주체, 소요예산 부담 등에 관하여 별도 협정을 체결 후 시행한다.

【회의전경 사진】





한 국 공 항 공 사



수신처 내부결재

(경 유)

제 목 광주비행장 유도로 재포장사업 공동협의회 결과(7차 최종)

1. 관련근거

가. 광주지사-1707('18.03.14.) 『유도로 재포장공사 관련 7차 회의 협조요청』

나. 광주지사-1708('18.03.14.) 『유도로 재포장사업 7차 회의 알림』

다. 건설사업실-1827('18.03.13.) 『광주비행장 유도로 재포장공사 산출내역 관련 추가협의 요청』

2. 광주비행장 유도로 재포장사업 비용분담 관련 공동협의회 결과(7차 최종)를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 : 광주비행장 유도로 재포장사업 비용분담 관련 최종 결과(7차) 1부. 끝.

차장대우

강동순

차장

김형택

광주 시설팀장

양문주

광주지사장

04/05
김경화

협조자

광주 운영팀장

조창식

시행 광주지사-2220 (2018.04.05)

접수 ()

우 62425 광주광역시 광산구 상무대로 420-25 한국공항공사 광주지사

URL: www.airport.co.kr

전화 062-940-0339

전송

E-mail: kds8@airport.co.kr


비공개(5)

『새로운 고객가치로 미래를 선도하는 공항그룹』

「광주비행장 유도로 재포장사업」 비용분담 관련 최종 결과(7차)

사업 개요

- 사업기간 : '16. 6. 3. ~ '18. 1. 30.
- 총사업비 : 25,156백만원(VAT포함)
 - * 세부사업비(백만원): 토목(20,149), 전기(2,500), 통신(357), CM(1,236), 설계비(908), 부대비(5)
- 시행사 : 한리(토목), 주원이엔씨(항공등화), 대은기전(정보통신), 목양종합건축사사무소(CM)

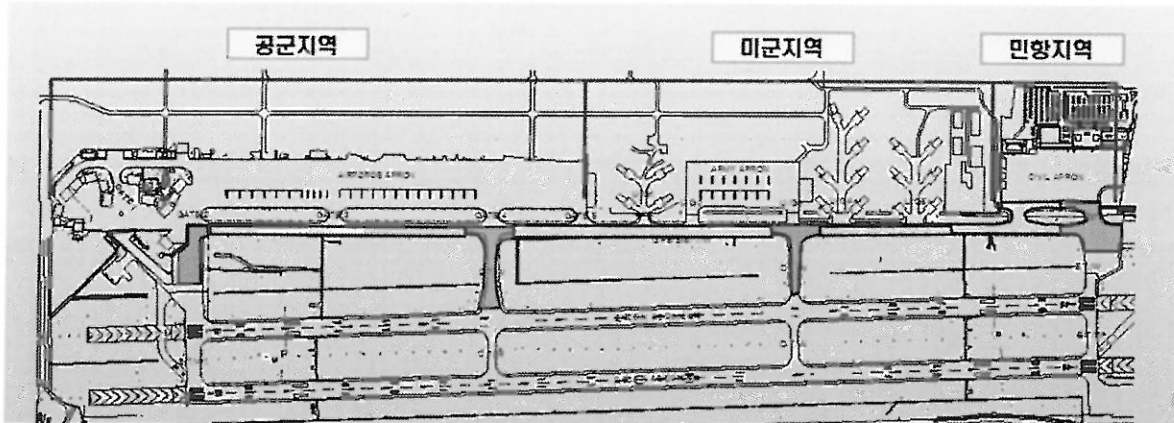

□ 관련근거

- 국방부장관과 국토교통부장관 간 비행장 사용협정 ('14.07.24.)
- 광주비행장 유도로 재포장 사업관련 비용분담에 관한 합의서 체결('16.12.30.)
 - * 공군 제1전투비행단, 부항청, KAC 광주지사

□ 주요 변경사항에 대한 추진경위

- G6 ~ G7지역 배수로(340m) 설치관련 공법변경 ('17.01.24. 제1전비와 광주지사)
 - (기존) 수로 BOX 현장타설(2.0×1.5) → (변경) PC BOX 제작·설치(2.0×1.5)
 - * 변경사유 : 토질이 연약하고, 지하수가 다량 유입되어 토공사면 붕괴

- 제1차 공동협의회 ('17.04.13.)
 - (협의) 시공여건 및 배수체계 개선을 위해 배수박스 340m 전체시공
- 제2차 공동협의회 ('17.04.25.)
 - (협의) 민항지역 배수박스 신설(148m)은 KAC 부담
 - (협의) 잔여 192m는 유역면적 등을 검토하여 재협의

- 제3차 공동협의회 ('17.06.09.)
 - (합의) 민항지역 148m ⇒ KAC 부담, 잔여 192m ⇒ 유역면적 고려 5:5 분담
- 제4차 공동협의회 ('17.12.21.)
 - (합의) 분담내역서 상의 단가 · 일위대가 · 수량 이상없음
- 제5차 공동협의회 ('18.01.16.)
 - (합의) G6 ~ G7 사이 순찰로(140m) 공군부담, 공동사용 내측유도로 (C, D) 평행유도로와 동일하게 비용분담, 민항지역을 횡단하는 군전용 전기 · 통신 관로이설비용 5:5 분담, 설계비 · 감리비 ⇒ 당초 설계시 분담금액에 대한 비율로 일괄 적용
 - 민항 분담비용 1,000원 이하는 절사
- 제6차 공동협의회 ('18.02.08.) : 제1전비와 내역서 재검토
- 제7차 최종 공동협의회 ('17.03.16.)
 - (합의) 분담내역서의 단가 · 일위대가 · 수량 : 이상없음
 - (합의) 부대비 조정에 따른 최종 분담금 확정(3,921,346,000원)
 - * 추후 에스컬레이션 등 변동사항 발생시 공군 제1전비 부담

□ 공항공사 비용분담금 결정

- 민항분담금 : 3,921,346,000원(VAT포함) → 붙임1 참조

(단위:원)

구분	준공금액	공군 1비	공항공사
토목	20,149,398,200	16,805,398,200	3,344,000,000
전기	2,500,377,067	2,328,062,363	172,314,704
통신	357,033,753	301,645,106	55,388,647
소계	23,006,809,020	19,435,105,669	3,571,703,351
설계	908,000,000	760,268,000	147,732,000
CM	1,236,000,000	1,034,902,800	201,097,200
부대비	5,000,000	4,186,500	813,500
합계	25,155,809,020	21,234,462,969	3,921,346,000

※ 제5차 공동협의회에서 1,000원 이하 절사

□ 향후 추진계획

- 최종 공동협의회 결과(7차) 통보 : 제1전비, 부향청, 본사 건설사업실
- 추가예산 조정요청 : '18년 4월(예산팀)

(단위:원)

구 분	KAC분담액 (VAT 포함)	확보예산	추가 소요예산	비 고
금 액	3,921,346,000	3,500,000,000	421,346,000	

- 제1전비 재정처 고지서 발부 및 광주지사 납부 : '18년 5월

- 붙임 : 1. 건설사업관리기술자 검토서 1부.
2. 제7차 공동협의회 참석자명단 1부. 끝.

건설사업관리기술자 검토서

건설사업관리기술자 검토서

□ 공사명 : 15-공-00부대 유도로 제포장공사(4034) [제2016RUMMA333호(2016.05.30)]

문서번호	목-유 제2018-010호(2018.01.22)	관련문서	광주공군 2018-010호
수신	공군 제1전투비행단장		
구분	☒ 발주처 요구사항	확인자	책임건설사업관리기술자 방관식(인)
	☐ 자재 의견제시 사항	검토자	도움건설사업관리기술자 임용필(인)
제 목	공항공사 분담내역서 산출자료 검토		

1. 개요

15-공-00부대 유도로 제포장 사업에 소요되는 공항공사 분담금 산출자료 검토.

2. 관련근거

가. 시설대대 18-02호(2018.01.17) 공항공사 분담내역서 제출 요청

나. 광주공군-010호(2018.01.19) 공항공사 분담내역 산출자료 제출

3. 검토 내용

가. 최초 계약금액

구분	도입금액	1전투비행단	공항공사	비고	
보통	16,324,958,000	13,374,786,000	81.93%	2,950,173,000	18.07%
전기	2,328,585,780	2,180,651,084	93.72%	147,934,696	6.27%
통신	382,899,600	382,899,600	100.00%	0	0%
소계	19,036,443,380	15,938,336,684	83.73%	3,098,106,696	16.27%
설계	908,000,000	760,288,000	83.73%	147,712,000	16.27%
CM	1,236,000,000	1,034,902,800	83.73%	201,097,200	16.27%
부대비	5,000,000	4,186,500	83.73%	813,500	16.27%
합계	21,182,693,380	17,734,462,484	83.73%	3,448,230,896	16.27%

나. 준공 계약금액

구분	도입금액	전투비행단	공항공사	비고	
보통	20,149,398,300	16,805,348,200	83.40%	3,344,050,100	16.60%
전기	2,500,377,067	2,328,062,363	92.11%	172,314,704	6.89%
통신	357,033,753	357,033,753	100.00%	0	0%
소계	23,006,809,120	19,490,444,316	84.71%	3,516,364,804	15.29%
설계	908,000,000	760,288,000	83.73%	147,712,000	16.27%
CM	1,236,000,000	1,034,902,800	83.73%	201,097,200	16.27%
부대비	5,000,000	4,186,500	83.73%	813,500	16.27%
합계	25,155,809,120	21,234,462,489	84.41%	3,921,346,631	15.59%

4. 검토 결과

『15-공-00부대 유도로 제포장』사업의 분담비용은 상기와 같이 산출되었음. 끝.

제7차 공동협의회 참석자명단

제7차 공동협의회 참석자명단

(광주비행장 유도로 재포장사업 분담비용)

- ▷ 회의일자 : 2018. 3. 16.(금) 13시30분 ~
 ▷ 회의장소 : 한국공항공사 여객청사 2층 영상회의실
 ▷ 내 용 : 광주비행장 유도로 재포장사업 분담비용 검토 및 협의

소 속	직위 (직급)	성 명	서 명	소 속	직위 (직급)	성 명	서 명
KAC	과장	이시영	이시영	광주비행장	과장	원준	원준
"	차장	김경태	김경태	사원	원사	원준호	원준호
"	차장	이재대	이재대				
"	"	강동수	강동수				
"	서원	김한솔	김한솔				
"	관리	최지현	최지현				
"	관리	유재우	유재우				
