

# 감사 모범사례

|      |               |      |      |
|------|---------------|------|------|
| 접수번호 |               | 제출부서 | 전북지사 |
| 제 목  | 보증사고를 넘어 입주까지 |      |      |

1. 추진배경

○ (지역경제 악화) 청주는 주택공급과잉 등으로 주택가격 하락률이 가장 높은 지역으로서 단기간 미분양 해소 및 주택가격 상승 기대가 어려워 지역경제가 악화된 상황

○ (극심한 미분양) 전북지사의 신생 등록업체인 [시공 :                   ]가 첫 사업으로 시행한 사업장이 청주지역 분양시장 침체로 최악의 미분양 사태에 직면  
- 분양개시 후 6개월 초기 분양률 18.23%

○ (집단대출 불가) 정부의 집단대출규제와 낮은 브랜드 인지도 및 극심한 미분양 등의 사유로 금융기관의 중도금 집단대출 불가

○ (공사 중단) 심각한 미분양사태로 인한 공사비 부족으로 공사 중단

○ (사업포기) 시행자 및 시공사 사업포기 선언

< 사업장 현황 >

(2017. 11. 현재)

| 구 분           | 내 용                                   |
|---------------|---------------------------------------|
| 시 행 자 · 시 공 자 |                                       |
| 사 업 장 위 치     |                                       |
| 규 모           | 1개동 326세대 (지하2층 ~ 지상 21층)             |
| 세 대 수         | 326세대(주택 282세대, 오피스텔 36세대, 상가 8개 호)   |
| 분 양 금 액       | 483억 원(주택 418억 원, 오피스텔 65억 원)         |
| 보 증 금 액       | 331억 원(주택 293억 원, 오피스텔 38억 원)         |
| 분 양 률         | 93.4%(297/318세대)                      |
| 공 정 률         | 100%                                  |
| 사 용 검 사 예 정 월 | 2017.11.(사용검사 진행 중, 2017.11.29. 입주예정) |

## 2. 추진내용 및 과정

### 가. 추진과정

| 일 자                            | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |      |           |      |           |      |           |      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 2015.08.03.                    | - 주상복합주택분양보증 발급(입주금 공동관리)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |      |           |      |           |      |           |      |
| 2015.08.26<br>~<br>2016.01.05. | - 최초 사업장 현장점검 후 2016. 1월까지 6회 현장점검 실시<br>· 공정부진 현황 <table border="1"> <thead> <tr> <th>일자</th><th>부진공정률(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015. 10.</td><td>2.88</td></tr> <tr> <td>2015. 11.</td><td>3.63</td></tr> <tr> <td>2015. 12.</td><td>5.33</td></tr> <tr> <td>2016. 01.</td><td>8.90</td></tr> </tbody> </table> | 일자 | 부진공정률(%) | 2015. 10. | 2.88 | 2015. 11. | 3.63 | 2015. 12. | 5.33 | 2016. 01. | 8.90 |
| 일자                             | 부진공정률(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |      |           |      |           |      |           |      |
| 2015. 10.                      | 2.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |      |           |      |           |      |           |      |
| 2015. 11.                      | 3.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |      |           |      |           |      |           |      |
| 2015. 12.                      | 5.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |      |           |      |           |      |           |      |
| 2016. 01.                      | 8.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |      |           |      |           |      |           |      |
| 2016.01.18.                    | - 공사대금 미지급액 누적 및 공사비 부족으로 공사 중단 (1차 위기)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |      |           |      |           |      |           |      |
| 2016.01.26.                    | - 시행자 및 시공사 사업포기 선언 (2차 위기)<br>- 업체 및 사업장 방문하여 사기 독려 후 대책 강구                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |      |           |      |           |      |           |      |
| 2016.02~03.                    | - 전북금융기관장협의회 대상으로 중도금 대출기관 물색<br>※ 2016.2월말 부진공정률 12.71% (관찰)                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |      |           |      |           |      |           |      |
| 2016.04.21.                    | - 으로부터 대출의향 전달<br>※ 2016.3월말 부진공정률 15.23% (주의)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |      |           |      |           |      |           |      |
| 2016.05~06.23.                 | - 중도금대출 관련 협의<br>※ 2016.4월말 부진공정률 16.39% (주의, 3차 위기)                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |      |           |      |           |      |           |      |
| 2016.06.24.                    | - 부진공정만회대책 검토 후 계획공정표 수정(사업기간변경 無)<br>· 공정부진에 따른 계약해지, 민원발생 등 방지 (1차 위기 모면)                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |      |           |      |           |      |           |      |
| 2016.07.12.                    | - 중도금대출 협약체결 (2차 위기 모면)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |      |           |      |           |      |           |      |
| 2016.07.18.                    | - 분양세대에 대한 중도금 대출 실행                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |      |           |      |           |      |           |      |
| 2016.07.19.                    | - 미지급공사비 투입 (3차 위기 모면)<br>· 미지급공사비 세부내역 확인 후 하도급업체 직불                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           |      |           |      |           |      |           |      |
| 2016.09.30.                    | - 부진공정 만회에 따라 분양률 70% 달성 (사업 안정화제도 정착)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |      |           |      |           |      |           |      |
| 2017.11.현재                     | - 사용검사 절차 진행 중으로 2017.11.29. 입주예정<br>· 2017.11.09. 하자보증서 발급                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |      |           |      |           |      |           |      |




## 나. 업무활동 노력


- (사업장 정밀조사 및 분석) 분양률 저조 원인, 미지급 공사비 파악, 고객의 계속 사업 의지, 자금조달 가능성 및 분양률 제고방안 등 다각적으로 정밀조사 · 분석한 결과, 일시적 자금유동성 위기만 극복한다면 정상화 될 수 있다고 판단
- (HUG표 사업장 살리기 컨설팅 실시) 사업장 정상화와 관련한 일련의 분석 결과를 토대로 시행사, 시공사 및 대표 시공협력사를 포함한 『HUG표 사업장 살리기 컨설팅』을 전북지사장 주관으로 주 1~2회 실시
- (사업장 정상화 도출 기여) 정밀조사 결과 분석된 합리적인 계속사업 타당성 자료 및 HUG의 공신력을 바탕으로 전북지역 금융기관협의회 참석 금융기관을 알선 · 설득함으로써 중도금 대출실행을 성공시켰고, 사업장 정상화 도출에 기여

## 다. 참고사항

< 표1. 공정률 현황 >

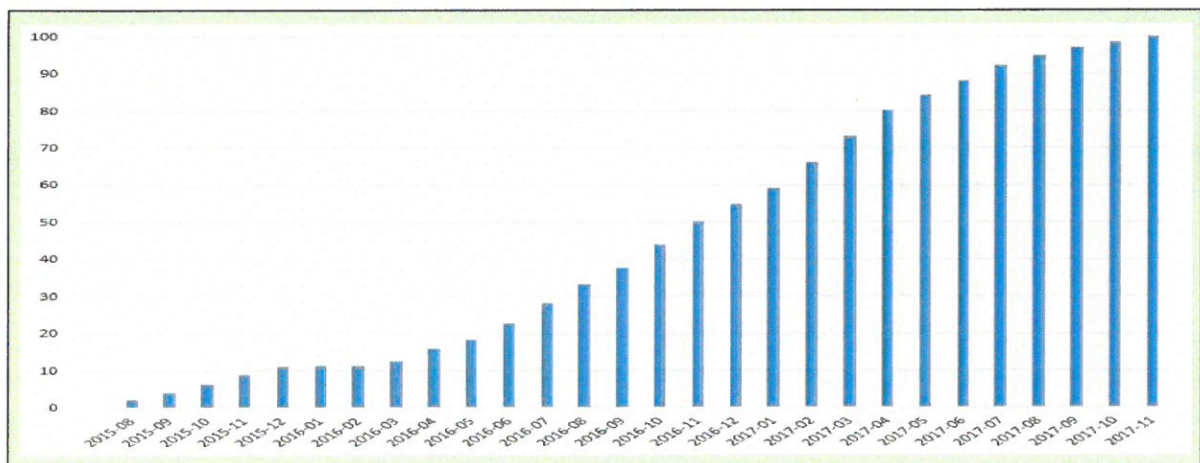

< 표2. 분양률 현황 >

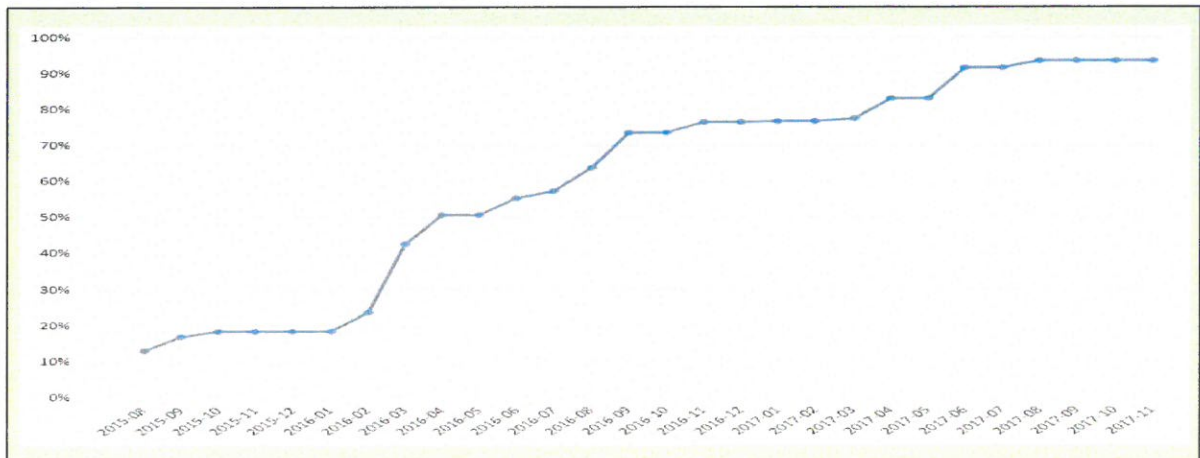

### 3. 추진성과

#### 가. 종합성과

- (사업포기 선언 고객 독려) 주택가격 하락률이 전국 1위로 단기간 미분양 해소 및 주택가격 상승기대가 어려운 지역경제 상황, 정부의 집단대출 규제, 시행·시공 업무노하우 부재, 낮은 브랜드 인지도 등으로 악재가 겹쳐 사업포기를 선언한 고객을 독려하고,
- (적극적인 대책 마련) 어려움을 토로하는 고객의 어려움을 간과하지 않고 전북지사 전 직원이 함께 고민하면서 수십 년간 축적된 주택사업관련 업무노하우를 전수 하면서,
- (사업안정화 제도 정착기여) 전북지사가 참여하는 전북금융기관장 협의회 인맥을 적극 활용하여 불가능했던 중도금 대출을 실행시켜 공정부진 및 분양부진이라는 큰 난국을 타개하게 함으로써 사업안정화제도 정착에 기여하였고,
- (계속기업으로의 존속 지원) 보증사고의 문턱에서 입주에 이르기까지 보증사고에 직면한 고객에게는 계속기업으로의 존속을 지원하고,
- (하도급업체 부실화 방지) 하도급업체의 부실을 미연에 방지하였으며,
- (국민 행복실현 기여) 분양계약자의 재산권을 보호 하는 등 기업고객 뿐만 아니라 개인고객까지 아우르는 온 국민의 행복 실현에 기여함.

#### 나. 계량성과

- (예산절감 액) 보증사고 시 분양대금 환급이행 예정액 874백만 원  
- 2016. 1월말 기준 분양률 18.23%, 분양대금수납률 1.81%

2017. 11. .

제 출 자 소속 전북지사  
성명 (인)
