

NO	우수 사례명	부서명
1	AMI 통신망 구축공사 개통확인서 작업의 효율화	대구지역본부 AMI팀

□ 추진배경 및 개요

○ 작업개요

- AMI DCU 및 모뎀 시공 후 개통된 설비에 대한 준공자료(개통확인서) 작성
- 사업규모(시험성적서 작성): DCU ○.○천대, 모뎀 ○○○천대, 수용가 ○○○천호
- 약 ○○만장 개통확인서 작성에 따른 과도한 인력, 예산사용 초래

○ AMI 통신망 구축사업의 지속적 확대에 따른 일정단축 및 실적자료의 품질확보

○ 개통 시험성적서 작성의 낭비요소 개선 및 정확도 제고

- 사진작업, K-AMI 및 Emulator 등록실적 등 단순 반복적인 작업과다

○ 적시에 적합한 인적자원 확보 및 휴먼오류에 대한 대응미흡

○ 공기 준수를 위한 Tight한 일정 소화 및 개인별 차이에 따른 작업량 차이발생

○ 작업자의 부재, 집중력 저하 등에 따른 비효율적인 작업 진행

□ 추진방법

○ 매크로 프로그램을 이용한 자동화된 도구 활용

○ 동일작업 반복지정에 따른 작업범위 무한지정

(범위지정 → 화면캡처 → 작업순서지정 → 작업수행 → 저장)

□ 개선내용

○ 투입인력 축소에 따른 예산절감

○ 효율적 시간활용 및 휴먼에러 Zero

○ 상용화된 Software 사용으로 향후에도 지속적 활용가능

차이 분석	
인력작업	도구활용(매크로)
• 인력채용(채용노력/시간) • 교육 및 적응시간 • 결함발생/시정조치 • 업무시간 집중	• 업무용컴퓨터 활용 (자원제한 없음) • Scheduling 작업 • 업무시간 외 활용

※ 공사, 유지보수 및 타업무 적용가능(현재 단순공사 개통성적서 작성에도 활용)

□ 개선 성과 및 계획

○ 유형효과

성과 분석							
비교	전체작업량 (장)	1일작업량 (장)	인력/PC	M/D (소요일)	단가 (천원)	소요예산 (천원)	전사적용 (14개사업소)
AS-IS	×××,000	500/인	10명	10명*32일=320일	120	38,400	5.4억원
TO-BE	×××,000	2,000/PC	3대	3개*26일=78일	600	1,800	0.25억원


○ 전사 확대 적용 시 작업원 사용 축소에 따른 예산절감 및 사업효과 극대화

- 4차 AMI 통신망 구축공사 전사 적용 시 5억원 이상의 예산절감
- 작업시간 단축, 공기준수, 정확도 제고를 통한 사업의 성공적 완수


○ 향후계획

- 전사 실적공유 및 확대적용을 통한 5차,6차 사업 지속추진
- 타 분야 협업으로 성과공유 가능개소 발굴 및 회사 보유분 확보

<활용예시>

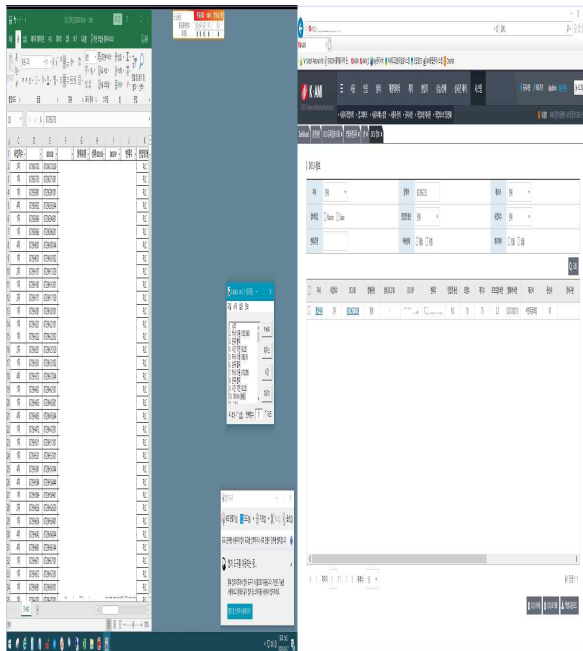

<그림1. 작업화면>

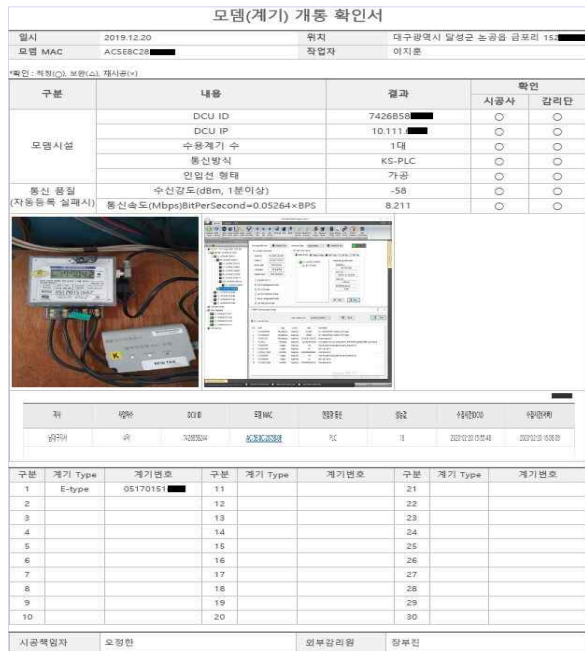

<그림2. 작업완료 : 개통확인서>
