

한국전력공사 상임감사위원

통보

제 목 : [2] 송·변전 설계변경 사전심의회 절차 미준수
관 계 부 서 : 강원본부, 태백전력지사 등 4개 전력지사
조 치 부 서 : 강원본부, 태백전력지사 등 4개 전력지사
내 용

1. 업무 개요

송·변전분야는 협력회사공사, 개별 보강공사 등 전체 공사에 대하여 물량 증가 및 감소, 신규비목이 발생할 경우 「공사 및 공사비기준 관리규정」 등에 의거 설계변경을 시행하고 있다.


2. 관계 규정 및 판단기준

송변전운영처의 ‘송·변전운영공사 설계변경 사전심의회기준 알림¹⁾’ 공문에 의거 협력회사공사, 개별 보강공사 등 전체 공사에 대하여 ‘추정가격 2천만 원 이상 증액되는 공사’는 설계변경 시행품의 전에 사전심의회위원회를 구성하여 설계변경 사유, 변경 내역의 적정성 등을 검토하고, 설계변경 심의절차는 아래 [표 1]과 같다.

1) 문서번호 송운(송전)-1546 (‘15. 11. 4.) ‘송변전운영공사 설계변경 사전심의회기준 알림’

[표 1] 설계변경 사전심의회 시행 절차

(‘25년 8월 기준)

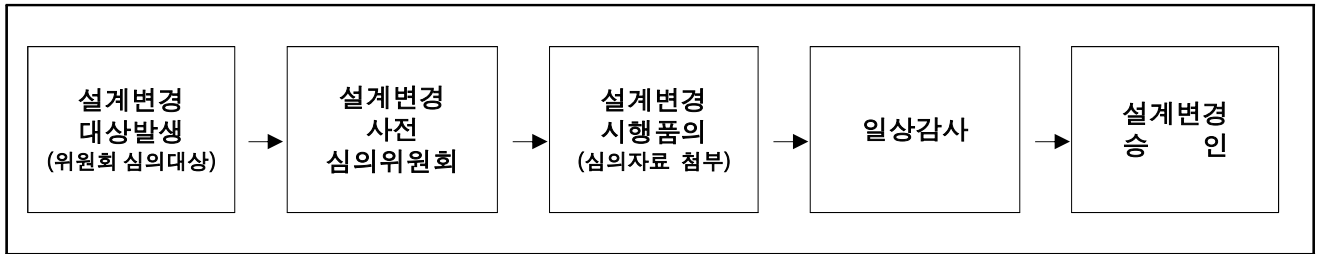

자료: 본사 시행지시 공문 일부 내용 발췌

따라서 ‘추정가격 2천만 원 이상 증액되는 공사’는 시공사 및 협력회사에 공사를 통보하기 전에 사전심의회를 개최하여 설계변경의 정당성을 확보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 종합감사 대상기간 내 강원본부 송·변전운영공사 중 사전심의 대상 공사인 ‘추정가격 2천만 원 이상 증액된 공사 120건의 사전심의 여부를 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 ‘총 금액 7,314백만 원, 120건의 공사’ 전체가 공사 통보 전에 사전심의를 시행하고 관련 기준에 따라 설계변경을 시행해야 함에도 불구하고 공사 통보 후 또는 시공 완료 후에 사전심의를 시행하여 관련 절차를 미준수하였다.

[표 2] 강원본부 송·변전 전체 사전심의회 시행 현황

(단위: 건, 천 원)

사업소 명	심의 대상[건] (2천만 원 이상)	대상 금액[천 원]	사전심의회 시행시기	공사구분
▣◁*부	13	863,024	공사 통보 후 (시공 완료 후)	개별(1), 협력(2), 위탁(3)
◆☎◆부	18	1,147,321		개별(2), 협력(2), 위탁(2)
▣◆♣부	2	121,513		개별(2)
○≡▼지사	29	1,865,016		협력(4), 위탁(2)
○▷≥지사	26	1,377,999		개별(1), 협력(5)
■α■지사	19	1,203,875		개별(1), 협력(3), 위탁(2)
◀▣※지사	13	735,778		협력(4)
합 계	120	7,314,526		

자료: 강원본부 송·변전 시행공사 현황 집계 재구성

현재 운영 중인 설계변경 사전심의회는 아래 [표 3]과 같이 '15년에 협력회사 공사 추가시공금액이 2천만 원에서 8천만 원으로 상향 조정되어 사전심의를 거쳐 업무투명성을 제고하자는 목적으로 수립되었으며, '21년, '23년에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령²⁾」의 기준을 준용하여 송·◆☎◆공사 추가시공금액 역시 8천만 원에서 1억 6천만 원으로 상향 조정되어 내부통제가 더욱 철저해야 함을 볼 때, 설계변경 업무담당자들은 ‘추정가격 2천만 원 이상 증액되는 공사’에 대하여 설계변경 전 사전심의를 시행하여 더욱 세심하고 심도있게 설계변경의 필요성을 검증하고 당위성을 인정받아야 한다.

[표 3] 송·변전 협력회사 추가시공금액(수의) 변경 현황

구 분	개정년도	기준적용일	대상금액 (추정가격 기준)	비 고
송전협력회사	2015. 6. 10. 이전	-	2천만 원	송전협력회사 운영기준 6.2항
	2015. 6. 10. 이후	2015. 6. 10.	8천만 원	
	2021. 9. 14. 이후	2021. 9. 14.	1억 6천만 원	
변전협력회사	2015. 8. 19. 이전	-	2천만 원	변전협력회사 업무처리기준 5.2항
	2015. 8. 19. 이후	2015. 11. 1.	8천만 원	
	2023. 11. 1. 이후	2023. 11. 1.	1억 6천만 원	

자료: 송·변전 협력회사 업무기준 발췌

2) 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ①항5호.가.1)에 따라 추정가격 1억 6천만 원 이하인 공사

관계자 의견

강원본부 직할 및 태백전력지사 협력회사 설계변경 업무 담당자들은 설계변경 전 ‘추정가격 2천만 원 이상 증액되는 공사’에 대하여 공사 통보 후 또는 시공 완료 후 사전심의를 시행하였음을 인정하였다.

더불어 본사 송변전운영처 담당 차장은 협력회사 추가시공금액이 상향 조정된 만큼 무분별한 설계변경에 대한 담당자 및 관리자의 검토가 더욱 필요하다고 의견을 개진하였다.

조치할 사항

강원본부장, 태백·강릉·동해·원주전력지사장은 공사 통보 후 또는 시공 완료 후 설계변경 사전심의가 개최되는 사례가 발생하지 않도록 송·변전 설계변경 전 사전심의 절차 준수 강조 공문을 발송하여 주시고 관련부서에 철저한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	통 보 1	-	-	강원본부 태백전력지사 강릉전력지사 동해전력지사 원주전력지사	강원본부 태백전력지사 강릉전력지사 동해전력지사 원주전력지사
