


[56] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 교통신호기 설비시설 수량 중복
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부에서는 ㉠㉠** B1블럭 아파트(공임, 620세대)전기공사(이하 ‘공동주택 전기공사’라 한다)를 (주)**건설과 2017. 4. 21. 공사계약을 맺고 2019. 7. 14. 준공을 목표로 현재 공사 진행 중에 있다.

그리고 위 전기공사에는 아래 [그림]과 같이 아파트 진출입구역에 교통신호기 시설이 설계에 반영되어 있다.

[그림] 교통신호기 시설 설계 현황

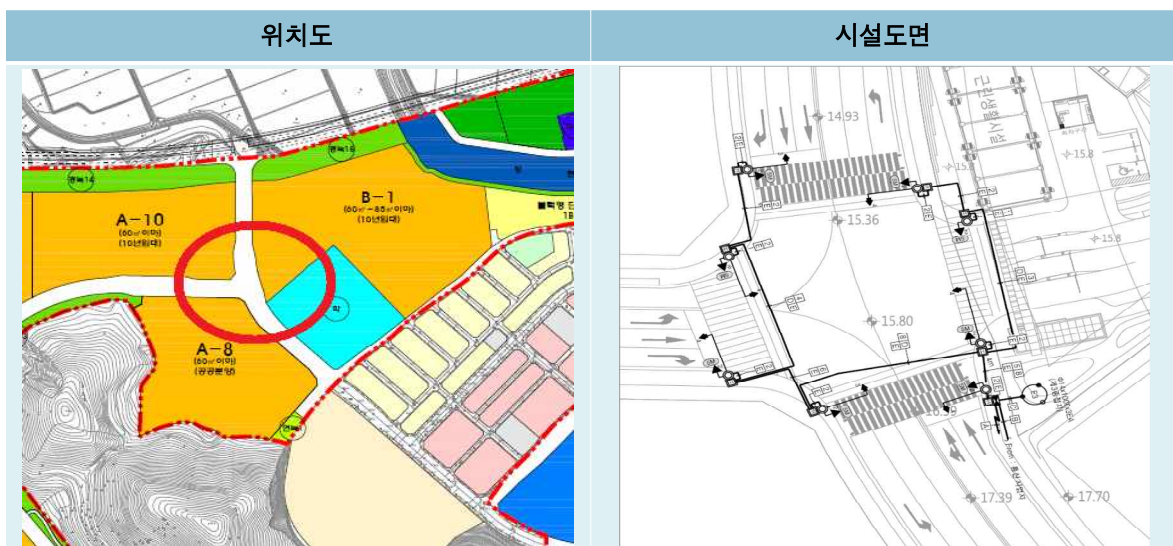

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

감사기간 중 현장여건에 따른 설계도서의 적정성을 점검한 결과, 위 교통신호기 설치구간은 ㉨㉨** 공공주택지구 도시기반 전기공사(이하 ‘도시기반 전기공사’라 한다)의 설계에도 같은 규격의 교통신호기 시설수량이 반영되어 공사가 진행되고 있는 것을 확인할 수 있었다.

「공사계약일반조건」 제19조의2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서간의 상호모순에 의한 설계변경)에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호모순 등이 있는 사실이 있을 경우, 설계변경 등 조치를 하도록 규정되어 있으므로 설계에 중복으로 반영된 부분은 공종 간 협의를 통하여 조정하여야 하고, 조정이 완료되면 그 공사비를 감액 설계변경 등 조치를 하도록 하고 있다.

그러나 ㉨㉨지역본부에서는 감사일 현재 시설 수량이 설계에 중복으로 반영된 교통신호기 설비에 대한 시설수량에 대하여 감액 설계변경 등 조치가 이루어지지 않고 있어 관련 공사비가 시공사에 과다하게 지급될 우려가 있다.

그러므로 ㉨㉨지역본부에서는 ㉨㉨** B1블럭 아파트 전기공사 설계에 반영되어 있는 교통신호기 시설수량을 조정하고 관련 공사비 약 60백만 원의 감액 설계변경 등 조치가 필요하다.

5. 조치할 사항

㉨㉨지역본부장은

㉨㉨** B1블럭 아파트 전기공사의 교통신호기 시설수량을 조정하시고 관련공사비 60백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).
