

한국전력공사 상임감사위원회

통보 요구

제 목 : [1] 베트남 응이손 법인 수익성 제고방안 강구

소 관 부 서 : 베트남 응이손 법인

조 치 부 서 : 베트남 응이손 법인

내 용

1. 업무 개요

응이손2 발전 사업은 응이손경제구역(하노이 남동쪽 200km)에 설비용량 1,200 MW(600MW × 2기), 총 사업비 2,500M. USD 규모의 석탄화력발전설비를 설치·운영하는 사업으로 '14. 1. 한전과 일본기업인 □◎가 5.7M. USD의 자본금을 50% : 50%로 공동출자하여 현지법인(응이손2 법인¹⁾), 이하 “응이손 법인”)을 설립한 □☆의 EPC 역무수행을 통해 '22. 7. 14. 발전소 종합 준공²⁾을 달성하였다.

이후 EVN(○◆공사)과 PPA 계약에 따라 생산된 전력을 EVN에 25년간 판매하는 사업이다.

1) 합자회사(Joint Venture) : 2개국 이상의 기업·개인·정부기관이 특정기업체 운영에 공동으로 참여하는 해외 투자방식을 말함


2) 1호기 준공('22. 1. 11.), 발전소 종합 준공('22. 7. 14.)

2. 관계 규정 및 판단기준

해외 발전 사업은 발전소의 적기 준공 후 최대한 빠른 시간 내에 재무준공³⁾을 달성함으로써 사업주에게 배당금을 조기에 송금하여 사업개발 시의 수익성을 유지하여야 하며, 정기적인 수익성 점검을 통하여 수익률에 부정적인 요인을 예측·발굴하고 대응방안을 강구하는 등 수익률 하락요인을 최소화하여 사업을 성공적으로 운영하여야 한다.

3. 수익성 분석 결과

[표] 수익률 변화 추이

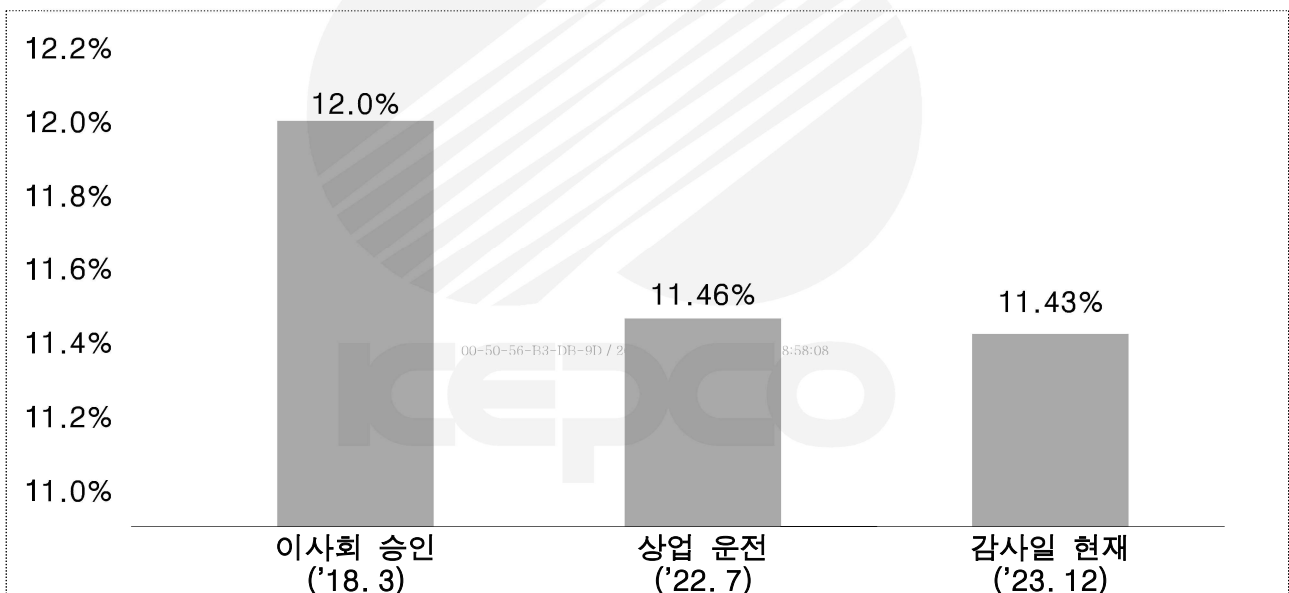

감사기간 중 응이손 법인의 수익성을 확인한 결과 '18. 3. 이사회 승인 당시 내부수익률(이하, "IRR⁴⁾")은 12%이며 '18. 7. 금융종결⁵⁾ 당시에도 IRR은 변동이 없었으나 상업 운전('22. 7.)이 시작되면서 '22년 석탄가격의 큰 상승에 따른 비용

3) 재무준공(financial completion): 상업운전 이후 전력 생산, 판매, 요금회수 등이 정상적으로 이루어져 프로젝트가 재무적으로 준공되었음을 대주단이 승인하는 행위를 말하고 재무준공일은 '23. 7. 31.였음.

4) IRR(Internal Rate of Return) : 내부수익률. 투자를 함으로서 기대되는 미래현금 수입액이 현재 투자가치와 같아지도록 할인하는 이자율을 말함. 우리회사 해외사업 의사결정시 주로 이용함.

5) 금융종결(financial close) : 프로젝트 계약이 체결, 실행되고 대출의 최초인출을 위한 선행조건이 만족된 상태를 말함. 통상 금융종결 이후 발전소 건설공사 착공이 이루어짐.

의 증가 및 주주대여금 이자금액 변동에 따라 IRR이 11.46%로 하락하였다. 이후, '23. 7. 31. 재무준공이 적기에 완료되지 못하여 배당금 지급이 지연 되었고, 감사일 현재 IRR은 11.43%로 하락하였다.

가. 수익성 하락 주요 요인('22. 7.)

응이손 법인은 당초 '22년에는 발전소 시운전에 따른 석탄 구매비용을 72M USD으로 예상하였다. 그러나 '22년 석탄가격의 추정금액이 기존 계획했던 것과 다르게 상승하여 해당 비용이 110M USD으로 크게 증가하였고, '22. 7. 14. 상업운전 시작일을 기점으로 해당 비용을 반영함에 따라 법인의 IRR은 11.48%(△0.52%)로 하락하였다. 또한, 당초 재무모델에는 주주 대여금 이자를 원금의 8.5%(119.83M. USD)로 반영하였으나, 베트남중앙은행의 고시⁶⁾에 따라, 상업운전일 기점으로 이자를 4.6%(67M. USD)로 조정하여 이에 따른 IRR이 △0.02% 추가 하락하여 법인의 IRR은 최종 11.46%가 되었다.

나. 추가 수익성 하락 분석('23. 7.~)

응이손 법인은 금융계약상 재무준공 선행조건 35건 중 34건은 대주단의 Waiver 확보 및 요건 충족으로 완료되었으나 1건(EVN의 스위치야드 인수)이 미완료되어 재무준공이 지연되었고, 준공지연에 따른 배당금 지급이 지급되지 못하여 IRR은 △0.03% 하락하였다. 현재 EVN의 스위치야드 인수(서명일 : '23. 12. 11.)가 완료되어 대주단에 재무준공 승인을 요청('23. 12.) 하였으나, '24. 1. 31.까지 대주단 심사 완료 및 주주대여금 상황이 이루어지지 않을 경우, IRR은 11.42%(△0.01%)로 추가

6) SBV(△●은행)의 Circular 12/2014/TT-NHNN, 5.2조에 따라 기존 EBL(Equity Bridge Loan, 자본연계차입금) 이자인 4.75%를 초과할 수 없음.

하락할 것으로 예상된다.

또한, 응이손 법인은 환경법 개정 등과 관련하여 발생한 석탄수입세 및 석탄 수송료 등에 대하여 MOIT(○▲부) 및 EVN 등과 적절한 보상방법 등을 협의 중에 있다. 그러나, 해당 기관등과 PPA 개정 등에 대한 협의가 지연되고 있으며 현재 응이손 법인이 석탄 수입세 등 환경관련 비용을 납부한 금액은 약 8M.USD에 이르고 향후 발전소 운영기간 동안 약 86M.USD의 추가 비용이 발생될 것으로 예상되어 이로 인한 수익률 하락이 $\Delta 0.01\%$ 로 분석된다.

4. 결 론

사업초기 예상수익률(12%) 대비 현재 수익률(11.43%)이 하락한 주요 요인은 '22년 석탄가격 상승에 따른 석탄비용 증가와 주주대여금 이자 증가에 따른 것이 가장 큰 사유로 분석된다. 또한, 재무준공이 적기에 이루어지지 않아 배당금 지급이 지연된 것도 IRR 하락의 원인이다. 감사일 현재 응이손 법인은 재무준공 조건 중 하나인 'EVN의 스위치야드 인수'를 완료하게 하여 '24. 1. 31.까지 주주대여금 상환이 이루어질 것으로 예상되나, 석탄 수입세 등 Change In Law(법률변경) 사항 협의 지연에 따른 추가 발생비용, '23년 고장발생에 따른 지체상금 발생으로 추가적인 수익률 하락 리스크가 있음을 감안할 때, 현지 법인은 잔여 사업기간 동안 안정적인 전기판매수익 유지, 발전소 정비비용 등 예산집행 시 비용절감 등을 적극적으로 추진하여 사업성 제고에 만전을 기하여야 한다.

관련부서 의견

응이손 법인 담당자는 석탄가격 상승에 따른 현금잔액 조정, 주주대여금 이자금액 변경, 재무준공 지연으로 인한 배당금 지급 지연이 IRR에 영향을 준 요인이라고 답변하였다. 재무준공을 적기에 완료하기 위하여 MOIT, EVN과 여러 차례 협의하였고, '23. 1. 31.까지 주주대여금 상환이 완료될 예정으로 재무준공 지연으로 인한 추가적인 IRR 하락은 없을 것으로 답변하였다.

그리고 석탄수입세 등 추가 비용이 발생하고 있고, 고장발생에 따른 지체 상금 등으로 추가적인 수익률 하락 리스크가 발생하고 있으므로 비용 절감 등을 통하여 수익률 제고를 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

베트남 응이손 법인장은 잔여 사업기간동안 수익증대 및 비용최소화 방안을 지속적으로 강구하여 수익률 제고에 만전을 기하시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
1	통 보	-	-	베트남 응이손 법인	베트남 응이손 법인

한국전력공사 상임감사위원

개선 · 권고 요구, 통보

제 목 : [2] 3차 Side Agreement(합의서) 조속 체결 필요 등

소 관 부 서 : 베트남 응이손 법인

조 치 부 서 : 베트남 응이손 법인

내 용

1. 업무 개요

응이손 법인은 '22년 EVN(○◆공사)의 긴급 급전 중단¹⁾으로 발생한 EVN의 MTL(최소석탄의무 구매 불이행에 따른 보상액)²⁾ 관련으로 EVN 등과 추가 급전 지시 협약 등을 전제로 1차 및 2차 Side Agreement(별도 합의서)³⁾를 작성하여 합의 완료하였고 감사일 현재 3차 별도 합의서를 작성하여 EVN, 석탄공급사⁴⁾, 석탄운송사⁵⁾ 및 대주단 등과 협의 중에 있다.

-
- 1) 우크라이나 전쟁에 따른 석탄가격 급등, 이상 기온에 따른 강수량 증가로 수력발전이 증가하여 EVN은 '22. 5. 16. 응이손 발전소의 급전 중단을 지시하였고, '23. 2. 28. 정상적인 급전이 재개되었음.
- 2) Minimum Take Liability : 최소 급전량을 충족하지 못하게 될 경우에 EVN이 법인에게 지급해야 할 지급액을 말함. PPA 계약에 따라, EVN은 발전소 계획 사용량의 75%(최소급전량)을 MTR(최소 석탄의무 구매책임)로 정하고 있고, 급전지시량이 최소급전량에 미달하는 경우에는 MTL (최소의무구매 불이행에 따른 보상액)을 부담하여야 함. 반면, 응이손2법인은 석탄공급계약 및 석탄운송 계약에 따라, MTR(최소석탄의무구매 불이행 책임) 미달시, 석탄공급사 및 운송사에 MTL(최소석탄 구매 불이행에 따른 보상액)을 지급하여야 함.
- 3) 응이손2법인은 EVN이 '22. 10.까지 400mil. Kwh의 급전 협약 등을 내용으로 하는 1차 합의('22. 10. 7.) 및 '22. 12.까지 300mil. Kwh, '23. 4.까지 500mil. Kwh의 급전 협약 등을 내용으로 하는 2차 합의('22. 11. 24.)서 체결을 이사회를 통하여 의결하였음.
- 4) 석탄공급사 : □□, ▽◇, △△
- 5) 석탄운송사 : ◇◇
