


## 주 의 요 구 / 개 선 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 확정 사업계획서 작성 불철저 및 공공개발 사업비 회수 업무 개선 필요
2. 소관부점 : 공공개발기획처, 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

공공개발사업 중 「국유재산법」 제59조, 「공유재산 및 물품 관리법」 제43조의3 등에 따른 위탁개발사업은 국가, 지방자치단체의 국·공유 재산에 대해 공사 자금 등을 활용하여 부동산을 개발하고 임대료, 위탁자 재정 지원 등으로 사업비를 회수하는 방법으로 [그림 1]과 같이 추진되고 있는데<sup>1)</sup>

[그림 1] 공공개발사업 추진 절차

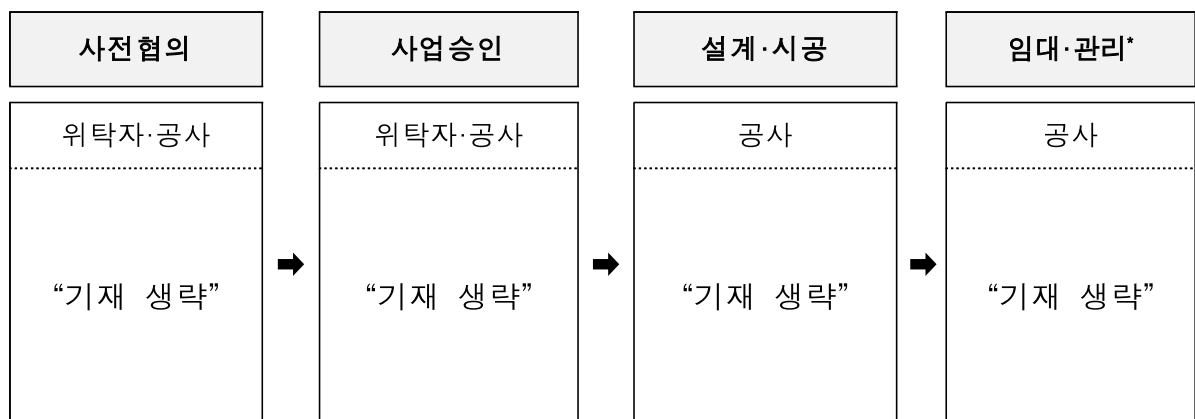

\* 회수기간은 사업별로 상이하나 통상 20~30년 수준

1) 그 외 기금개발사업(국유재산관리 기금을 재원으로 하는 사업), 인수자산, 종전부동산 개발 등이 있음

국유 위탁개발사업의 경우 위탁자 재정지원이 있는<sup>2)</sup> 공유 위탁개발 사업과 달리 시설 임대료 수입 등으로 위탁기간 내 사업비를 회수하도록 하고 있어 임대시장에 따른 개발사업비 회수 리스크가 높은 구조이다.

또한, 공공개발사업의 사업비 회수기간, 위험부담 주체 등에 대한 조건은 위·수탁 계약서에 해당하는 사업계획서에서 [그림 2]와 같이 정하고 있고

[그림 2] 사업계획서

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| “기재 생략”   | “기재 생략”         |
| 위탁기간 및 회수 | 준공 후 위험 및 관리 방안 |

사업추진을 위해 작성하는 최초사업계획서와 달리 시설준공 후 작성 하는 확정사업계획서는 [그림 3]과 같이 건축원가 확정 및 사업비 회수를 목적으로 하며 건설부점의 담당자가 작성하고 있는데

[그림 3] 사업계획서 비교

|         |
|---------|
| “기재 생략” |
|---------|

2) “기재 생략”

작성된 확정 사업계획서를 본부 차원에서 확인하고 최초 사업계획서 대비 변경된 데이터를 축적, 분석하는 등의 재검토 절차 없이 위탁자에게 작성된 사업계획서를 승인받아 사업비 회수 등 임대 업무를 실시하고 있다.

한편, 사업비 회수 등을 위한 임대관리 업무는 공공개발사업이 확대되었는데도 시스템 개발이 지연되어 2000. 0월에서야 임대관리 시스템(“공공개발BPM”이라 한다)으로 전자세금계산서 발행·조회 기능이 추가되는 등 임대료 회수, 관리 등 한정적인 기능만 운영되고 있어<sup>3)</sup>

공공개발본부에서는 ‘공공개발사업 관리시스템 구축 TF’를 통해 2000. 0월 ‘공공개발사업 관리시스템’을 구축 중에 있으며<sup>4)</sup>

남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처는 「업무분장세칙」 제31조 제4호 등<sup>5)</sup>에 따라 공공개발 부동산 임대추진기본계획 수립, 임대·시설 관리 및 회계, 세무, 결산 업무를 권역별로 담당하고 있고

공공개발기획처는 같은 세칙 제29조 제1항 제8호에 따라 공공개발 사업 기획업무를 수행하고 있으며 수도권서부개발처는 세칙 제34조 제1호에 따라 준공재산 임대·시설 관리 관련 내규 및 전산관리 업무를 수행하고 있다.

## 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공공개발 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제63조에 따르면 건설부점장은 최초 사업계획서 준공보고서 및 임대추진 기본계획 등을 고려하여 건설공사 준공에 따른 사업계획서를 위탁자 승인을 받아 확정하도록 하고 있고

---

3) “기재 생략”

4) “기재 생략”

5) 각 처는 「업무분장세칙」(제31조부터 제34조까지)에 따라 동일한 업무를 권역별로 구분, 수행함

사업계획서에서는 확정된 총 건축원가 및 임대 개시시점 임대료 등을 바탕으로 변경된 내용(회수기간 등)을 반영하여 준공보고서를 작성·제출하고 총괄청(위탁자)의 승인을 받아 사업계획을 확정하도록 하고 있다.

또한, 세칙 제74조 및 「공공개발 재산관리 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제4조에 따르면 재산 관리부점장은 매년 개발재산에 대한 임대환경 분석, 임대조건, 임대마케팅 전략, 연체 관리방안 등을 포함하여 임대 추진 기본계획을 수립하도록 하고 있고

사업계획서에서는 시장위험을 최소화하기 위해 수탁자는 시장조사, 마케팅 등을 실시하고 위탁기간 내 회수가 어려운 경우 위탁자와 협의하도록 하고 있다.

따라서, 확정 사업계획서를 작성할 때에는 준공시점의 데이터를 반영하고 임대·관리 기간의 회수 목표를 명확히 설정하는 등 사업비 회수 계획의 신뢰도를 높이고 사업비 회수가 어려울 것으로 판단되는 경우에는 위탁자와 사전에 협의하여 대책을 마련하는 등 임대·관리 업무를 철저히 수행하여야 한다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간 중 확정 사업계획서를 작성한 13개 사업의 회수 목표 설정 등 업무처리 현황을 점검한 결과

##### (1) 확정 사업계획서 작성 부적정

2000. 00월 사업계획을 승인 받은 ‘●●●●● ●●●●●’<sup>6)</sup> 개발사업의 경우 당초 계획보다 0년 0개월이 지연된 2000. 00월 시설을 준공하고

2000. 0월 확정 사업계획서를 ○○청으로부터 승인받았는데

확정 사업계획서에서 사용될 수입, 비용 추정을 위한 데이터는 작성 시점의 값이어야 하는데도 [표 1]과 같이 수입 및 비용 추정을 위한 가정 값을 최초 사업계획과 동일하게 적용한 것으로 확인되는 등 [표 2]와 같이 추정 값 적용이 부적정한 사례 9건이 확인되었다.

[표 1] ●●●●● 최초, 확정 사업계획서 추정 값 비교

(단위 : %)

| 구분 | 평균조달금리 | 공시지가상승률 | 임대료상승률 | 작성 월 |
|----|--------|---------|--------|------|
|----|--------|---------|--------|------|

“기재 생략”

[표 2] 확정사업계획서 작성 현황<sup>8)</sup>

| 순<br>번 | 구분 | 사업명 | 확정사업계획<br>가정 적용기준 | 연간 회수예정금액<br>설정여부 및 방법 | 재정지원여부<br>(사업비 회수) |
|--------|----|-----|-------------------|------------------------|--------------------|
|--------|----|-----|-------------------|------------------------|--------------------|

“기재 생략”

6) “기재 생략”

7) “기재 생략”

8) 수탁기관 지정 신청서(제안서) 제출 일을 기준으로 작성함, CF는 ‘Cash Flow’

또한, 확정 사업계획서는 해당 사업의 사업비 회수를 위해 위탁자와 공사가 협의한 계약서와 같은데, 과거의 추정 값으로 산출한 연간회수 예정 금액을 신뢰하기 어려웠고

건설부점의 담당자가 확정 사업계획서를 작성한 후 이에 대한 검토 및 데이터 축적 등의 절차가 체계적으로 마련되어 있지 않아 최초 수립된 사업계획 대비 개발 완료된 재산을 분석하고 보완 사항을 발견하여 이를 신규사업계획에 반영하는 등의 환류 체계가 부족하였는데<sup>9)</sup>

사업을 효율적으로 관리하고 신규 사업계획 수립의 고도화를 위해 확정 사업계획서를 기획부서에서 추가 검토하여 CF(Cash Flow)를 산출하고 관련 데이터를 축적하는 등의 업무 체계를 마련할 필요가 있다.

## (2) 개발 사업비 회수관리 업무 개선 필요

한편, 사업비 회수에 장기간 소요되는 개발사업의 특성을 고려하면 회수 목표를 명확히 설정<sup>10)</sup>하고 목표대비 회수 실적 달성여부 점검 등을 통해 대책 수립, 위탁자 협의 등의 후속절차를 추진할 수 있어

개발사업의 사업비 회수 목표 설정 및 회수율 저하에 따른 만회대책 수립 등 업무 현황을 살펴보면

공공개발 BPM의 회수관리 메뉴에서는 [그림 4]와 같이 장기미수금, 유동 자산 등의 데이터를 제공하고 있으나 실제와 다른 값이 입력되어 있는 등 연간 회수액을 설정하고 관리할 수 있는 기능은 없는 것으로 확인되었다.<sup>11)</sup>

---

9) “기재 생략”

10) “기재 생략”

11) “기재 생략”

#### [그림 4] 공공개발 BPM 회수관리 메뉴

---

“기재 생략”

---

또한, 사업계획 대비 회수율이 저조한 사업장에 대해 관리 현황은 [표 3]과 같이 확인되었는데

[표 3] 회수율이 저조한 사업장 현황<sup>12)</sup>

(단위 : 년, 억, %P)

| 순<br>번 | 사업명 | 임대추진<br>기본계획수립 | 임대활성화<br>대책수립 | 위탁기간 소요율 |      |     | 사업비 회수율 |    |     | 격차 |
|--------|-----|----------------|---------------|----------|------|-----|---------|----|-----|----|
|        |     |                |               | 위탁기간     | 경과기간 | 소요율 | 투입      | 회수 | 회수율 |    |

“기재 생략”

---

---

12) “기재 생략”

사업계획서에서는 필요한 경우 위탁기간 재협의 등에 대해 논의할 수 있도록 하고 있으나 회수율 저하에 따른 검토, 대책마련 등에 대한 내부 기준, 절차 등은 구체적으로 수립되어있지 않은 실정이고

임대 환경을 분석하고 차년도 임대료, 관리비 등을 산정하는 임대추진 기본계획의 경우 요강에 따라 매년 수립하고 있으나 이를 통해 회수가 불가능한 수준의 사업에 대한 회수만회 대책을 수립하는 것은 한계가 있다.<sup>13)</sup>

특히, 임대·관리 업무는 공공개발사업 중 장기간 소요되고 원활한 사업비 회수를 통해 신규 사업추진을 위한 재원을 확보하여야 하는 중요한 단계임을 고려하여

전체 사업비 회수 관점에서 연간 회수목표 금액을 명확히 설정<sup>14)</sup>하고 설정된 목표액 대비 회수실적이 저조한 경우 만회대책 등 임대 활성화 대책 수립, 위탁자 보고 및 재협의 등의 업무절차를 체계적으로 수립, 운영할 필요가 있다.<sup>15)</sup>

**[소관부점 의견]** 공공개발기획처 등 5개 부점에서는 확정 사업계획서 작성 및 데이터 축적 등의 필요성에 대해서는 공감하면서도 본부 업무의 총괄 기능 부재, 담당자별 입장차이 등으로 전체 업무가 효율적으로 처리 되지 못하는 한계를 설명하였는데 특히, 건설업무 담당자가 확정사업 계획서를 단독으로 작성하는 것에 대한 어려움을 설명하였다.

---

13) “기재 생략”

14) “기재 생략”

15) 현재는 만회대책 수립, 위탁자 협의 등에 대한 명확한 기준이 없는 것으로 확인됨



또한, 임대관리 단계에서 회수가 불가능할 것으로 추정되는 사업에 대한 위탁자 재협의 등에 대해 사업계획수립 적정성 등 본부 전체의 대응이 필요하다는 의견을 밝혔다.

#### 4. 조치할 사항

공공개발기획처장은 사업부점에서 작성한 확정 사업계획서의 주요 가정, CF 등을 검토하고 데이터를 축적하여 신규 사업계획에 활용하는 등 관련 업무가 체계적으로 운영될 수 있도록 절차를 마련<sup>16)</sup> 하시기 바랍니다.(통보)

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 확정 사업계획서를 작성할 때에 작성 시점의 데이터를 조사, 활용하는 등 관련 업무를 철저히 수행하시고 동일한 사안이 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

수도권서부개발처장은 사업비 회수·관리 업무가 체계적으로 처리될 수 있도록 연간 회수목표 설정 및 회수율 저조에 따른 만회대책 수립 기준 등 관련 업무 절차를 마련하시기 바랍니다.<sup>17)</sup>(개선)

---

16) 필요한 경우 해당 업무절차를 내규에 반영

17) 사업에 따라 위탁자와 재협의를 필요한 경우 본부의 일원화된 업무처리가 필요하여 이를 총괄, 관리할 필요가 있음(필요한 경우 해당 업무절차를 내규에 반영)
