

한국전력공사 상임감사위원회

통보 (우수사례)

제 목 : [2] 기관간 협업을 통한 신설변전소 위치조정 등 투자비 절감

관 계 부 서 : 대구본부 포항지사 전력공급부

모 범 직 원 : 대구본부 포항지사 전력공급부 차장대우 ☐☐☐

내 용

1. 산업단지 내 신설변전소 위치 조정으로 투자비 98억원 절감

포항 블루밸리국가산단 內 확정된 신설변전소 인출구간은 도로폭이 협소하여 배전전력구 공사비용이 과다하게 발생되며, 154kV 고객들의 고객소유 관로공사 시 굴착공간이 부족할 것으로 예상되어 민원발생 예방 및 안정적인 전력공급을 위해 포항시 및 LH와 지속적인 협의를 통하여 신설변전소(●●) 위치를 부하중심점으로 변경하여 배전전력구 및 인출비용 85억 원 절감, 송변전건설비 13억 원 절감에 기여하였다.

【●●변전소 입지확정위원회 심의 자료】

총공사비 비교자료

③ 총공사비 비교

[단위 : 백만원]

구 분	금 액	비 고	
당초 (안)	배 전 공 사	19,500	• 관로 12회선, 개착식 전력구 900m
	용 지 비	930	• 4,580㎡ (조성원가 203,000원/㎡)
	송 전 공 사	1,000	• 분기철탑 2회선 1기 신설
	변 전 공 사	13,000	• 정준 기본설계 준용
	토 건 공 사	12,795	• 4,580㎡ (22년도 기준단가 적용)
	합계	47,225	
방안 (1)	배 전 공 사	8,000	• 관로 10회선
	용 지 비	1,295	• 6,389㎡ (조성원가 203,000원/㎡)
	송 전 공 사	4,000	• 분기철탑 4회선 2기 신설 및 1기 철거
	변 전 공 사	13,000	• 정준 기본설계 준용
	토 건 공 사	13,030	• 6,389㎡ (22년도 기준단가 적용)
	합계	39,325	-7,900
방안 (2)	배 전 공 사	8,000	• 관로 10회선
	용 지 비	1,675	• 8,255㎡ (조성원가 203,000원/㎡)
	송 전 공 사	1,500	• 분기철탑 2회선 2기 신설
	변 전 공 사	13,000	• 정준 기본설계 준용
	토 건 공 사	13,180	• 8,255㎡ (22년도 기준단가 적용)
	합계	37,355	-9,870

변전소 위치조정 요청공문

익명화

2. 영일대해수욕장 지상기기 이설요청 민원 포항시와 협업 지하화시행

포항 영일대해수욕장 인근에 설치된 지상기기가 보행자 통행 불편 및 안전사고 등의 이유로 이설요청 민원이 지속되어 이를 해결하고자 포항시와 적극적인 협의를 통해 지상기기 지하매립에 따른 이행 협약을 체결하고 전액 포항시 예산으로 현재 지하화 공사(총공사비 : 약 26억 원)를 진행하고 있다.

【영일대해수욕장 지상기기이설 관련 자료】

민원발생 지상기기



B BROWN DOT HOTEL

지상기기 지하매립에 따른 이행 협약서

2. 본 협약서의 사업내용은 기존 지상기기를 지하화 하는데 필요한 맨홀 설치, 관로 설치, 지상기기 설치, 전력선 설치, 지상기기방 설치를 포함하며, 공사구간의 기존에 설치된 전력설비(지중)의 이설은 제외한다.

제2 장 공사비 산정 및 정산

제4조 (공사비의 산정)

1. "지상기기 지하화공사비"는 전기사업법 및 관계법령과 "영"의 규격 및 내적 등에 관한 바에 따라 "일"이 산정하여, "영"과 합 의 및 검토 한다.
2. 제1항에서 정하는 지상기기 지하화공사비의 범위는 지하화공사에 소요되는 설계, 감리, 측량(탐사포함), 선로의 건설 및 철거 등을 위한 공사비용, 관제시스템, 도로모퉁부벽구, 도로점용료, 국유재산사용료, 인·허가, 관리설정, 민면대금, 소송비용 등 부대비용을 포함한다.
3. 지상기기 지하화할 경우 구간에 공개통신설비가 있는 경우 공개통신설비에 할애 사용되는 공사비 산정은 "영"과 "공개통신사업자"가 별도 협약하여 산정·추진하므로 본 협약에서는 제외한다.

제5조 (공사비의 부담주체 및 분담범위)

1. "영"은 제4조에 따라 설계한 총 지하화공사비 100%를 분담한다. 또한, 다음에 해당하는 경우 이에 소요되는 추가비용은 "영"이 전액 부담한다.
가. 재질변경(도로모퉁 재질의 변경 등) 및 도로표시행위에 관한 복구 범위 초과에 의한 도로복구공사비 증가분은 전액 "영"이 부담한다.
나. "영"의 요청으로 "일"이 시행하는 통상의 공사방법이 아닌 특수한 공법에 기 기술자를 사용함으로써 인하여 추가로 비용이 발생될 경우 추가되는 비용은 전액 "영"이 부담한다.
2. 제1항의 공사비 중 지하배관정기 설치관련 확보비용에 관한 사항은 제7조, 도로점용료에 관한 사항은 제16조에 정하는 바에 따른다.
3. 도로모퉁 복구공사(인도복구공사 포함) 비용은 전액 "영"이 부담한다.

민원발생 지상기기



B BROWN DOT HOTEL

지상기기 지하매립에 따른 이행 협약서

2. 본 협약서의 사업내용은 기존 지상기기를 지하화 하는데 필요한 맨홀 설치, 관로 설치, 지상기기 설치, 전력선 설치, 지상기기방 설치를 포함하며, 공사구간의 기존에 설치된 전력설비(지중)의 이설은 제외한다.

제2 장 공사비 산정 및 정산


제4조 (공사비의 산정)

1. "지상기기 지하화공사비"는 전기사업법 및 관계법령과 "영"의 규격 및 내적 등에 관한 바에 따라 "일"이 산정하여, "영"과 합 의 및 검토 한다.
2. 제1항에서 정하는 지상기기 지하화공사비의 범위는 지하화공사에 소요되는 설계, 감리, 측량(탐사포함), 선로의 건설 및 철거 등을 위한 공사비용, 관제시스템, 도로모퉁부벽구, 도로점용료, 국유재산사용료, 인·허가, 관리설정, 민면대금, 소송비용 등 부대비용을 포함한다.
3. 지상기기 지하화할 경우 구간에 공개통신설비가 있는 경우 공개통신설비에 할애 사용되는 공사비 산정은 "영"과 "공개통신사업자"가 별도 협약하여 산정·추진하므로 본 협약에서는 제외한다.

제5조 (공사비의 부담주체 및 분담범위)

1. "영"은 제4조에 따라 설계한 총 지하화공사비 100%를 분담한다. 또한, 다음에 해당하는 경우 이에 소요되는 추가비용은 "영"이 전액 부담한다.
가. 재질변경(도로모퉁 재질의 변경 등) 및 도로표시행위에 관한 복구 범위 초과에 의한 도로복구공사비 증가분은 전액 "영"이 부담한다.
나. "영"의 요청으로 "일"이 시행하는 통상의 공사방법이 아닌 특수한 공법에 기 기술자를 사용함으로써 인하여 추가로 비용이 발생될 경우 추가되는 비용은 전액 "영"이 부담한다.
2. 제1항의 공사비 중 지하배관정기 설치관련 확보비용에 관한 사항은 제7조, 도로점용료에 관한 사항은 제16조에 정하는 바에 따른다.
3. 도로모퉁 복구공사(인도복구공사 포함) 비용은 전액 "영"이 부담한다.

민원발생 지상기기



B BROWN DOT HOTEL

지상기기 지하매립에 따른 이행 협약서

2. 본 협약서의 사업내용은 기존 지상기기를 지하화 하는데 필요한 맨홀 설치, 관로 설치, 지상기기 설치, 전력선 설치, 지상기기방 설치를 포함하며, 공사구간의 기존에 설치된 전력설비(지중)의 이설은 제외한다.

제2 장 공사비 산정 및 정산

제4조 (공사비의 산정)

1. "지상기기 지하화공사비"는 전기사업법 및 관계법령과 "영"의 규격 및 내적 등에 관한 바에 따라 "일"이 산정하여, "영"과 합 의 및 검토 한다.
2. 제1항에서 정하는 지상기기 지하화공사비의 범위는 지하화공사에 소요되는 설계, 감리, 측량(탐사포함), 선로의 건설 및 철거 등을 위한 공사비용, 관제시스템, 도로모퉁부벽구, 도로점용료, 국유재산사용료, 인·허가, 관리설정, 민면대금, 소송비용 등 부대비용을 포함한다.
3. 지상기기 지하화할 경우 구간에 공개통신설비가 있는 경우 공개통신설비에 할애 사용되는 공사비 산정은 "영"과 "공개통신사업자"가 별도 협약하여 산정·추진하므로 본 협약에서는 제외한다.


제5조 (공사비의 부담주체 및 분담범위)

1. "영"은 제4조에 따라 설계한 총 지하화공사비 100%를 분담한다. 또한, 다음에 해당하는 경우 이에 소요되는 추가비용은 "영"이 전액 부담한다.
가. 재질변경(도로모퉁 재질의 변경 등) 및 도로표시행위에 관한 복구 범위 초과에 의한 도로복구공사비 증가분은 전액 "영"이 부담한다.
나. "영"의 요청으로 "일"이 시행하는 통상의 공사방법이 아닌 특수한 공법에 기 기술자를 사용함으로써 인하여 추가로 비용이 발생될 경우 추가되는 비용은 전액 "영"이 부담한다.
2. 제1항의 공사비 중 지하배관정기 설치관련 확보비용에 관한 사항은 제7조, 도로점용료에 관한 사항은 제16조에 정하는 바에 따른다.
3. 도로모퉁 복구공사(인도복구공사 포함) 비용은 전액 "영"이 부담한다.

3. 신설도로 개설구간내 대비관로 매설로 포장복구비 절감

포항시에서 새롭게 개설하는 도로공사 구간내에 보강토 옹벽보강재를 설치함에 따라 전주설치가 불가하여 해당 개소에 대해 포항시와 사전 협의를 통해 대비관로를 매설함으로써 향후 배전선로 신설공간 확보 및 포장복구비 약 4천만 원 절감에 기여하였다.

【%%~&&&&간 도로개설 대비관로매설】

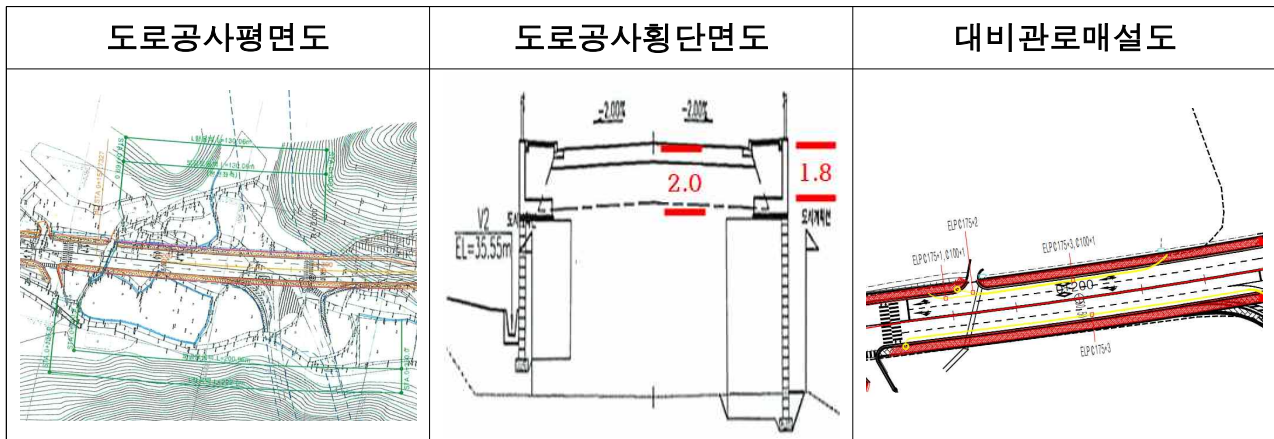

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.
