

△△△△△△△△ △△△△△

주의 1, 통보

제 목	2023년 △△야영장 정비공사(관급자제_통신) 공사감독 업무 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△처 △△△△부, △△△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△△△△△는 △△도 △△△들을 위한 맞춤형 야영인프라를 조성하여 다양한 탐방편의 제공 및 지역경제 활성화를 위해 「2023년 △△야영장 정비공사」를 시행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 △△의 제규정이 정하는 바에 따른다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△△에서는 「2023년 △△야영장 정비공사」를 추진하며, 시설물 관리 및 범죄 예방을 위하여 아래 [표1]에서와 같이 보안용 카메라(CCTV) 및 영상감지장치를 관급자재로 구매하였다.

[표 1] 2023년 △△야영장 정비 통신공사 관급자재 구매현황

사업명	금액	구매내용	납품완료 및 검사일	비고
2023년 △△△△△△△ △△야영장 정비 통신공사 관급자재 구매	**,***,***,** 원	CCTV 1식	2023. 12. 12.	조달수수료 별도

※ 자료: △△△ 제출 자료 재구성

△△△△△△△△△△-8239(2023.12.18.) 「2023년 △△△△△△△ △△야영장 정비 통신공사 관급자재 구매 결과보고」를 확인한 결과, 아래 [표2]에서와 같이 2023.12.12. 관급자재를 납품받아 검수를 실시하고 검수결과 이상없음으로 결과보고 하였으며, 2023.12.20. 납품대금을 지급(△△△△△△△ 지출결의번호:20231220-0800)하였다.

[표 2] 관급자재 구매내용 및 검사 결과

구분	규격	수량	금액(원)	납품완료일	검사일	검수결과
계			**,***,***, **			
1. 우수제품(시스템)			**,***,***			
영상감시장치	보안용카메라(PTZ), 모니터, HUB, 운영/저장서버(S/W 24개월, 4TB)	1EA	**,***,***	12.12.	12.12..	이상없음
2. 우수제품(옵션품목)			**,***,***			
보안용카메라(PTZ)	200만화소, 37배, 적외선 0Lux, 회전, TTA인증	3EA	*,***,***	12.12.	12.12.	이상없음
보안용카메라(BULLET)	200만화소, 4배, 적외선 0Lux, TTA인증	11EA	**,***,***	12.12.	12.12.	이상없음
네트워크스위치	TP8포트 PoE, 1G/2.5G SFP2포트, 산업용	1EA	***,***	12.12.	12.12.	이상없음
금속상자	STS **0×600×300mm, 차단기 포함	3EA	*,***,***	12.12.	12.12.	이상없음
카메라브래킷	기동용	15EA	*,***,***	12.12.	12.12.	이상없음
3. 일반제품(마스옵션품목)			*,***,***			
서지흡수기	전원용	3EA	***,***	12.12.	12.12.	이상없음
서지흡수기	통신용, PoE	11EA	*,***,***	12.12.	12.12.	이상없음
카메라브래킷	스피드돔 벽부형	4EA	***,***	12.12.	12.12.	이상없음

※ 자료: △△△ 제출 자료 재구성(△△△△△△△△△△-8239(2023.12.18.)호)

나라장터(국가종합전자조달)-가격정보-활용안내-물품인도조건별 해석에서는 인도조건(유통단계)별로 정보를 제공하며 공급자(계약자)와 인수자(수요 기관)가 부담하여야 할 물류비용 항목과 비용부담자를 명기하고 물품 구매시 이를 참고 하도록 하였으며, 현장설치도 인수조건 시에는 아래 [표3]과 같이 관급자재 설치비를 공급자(계약자)가 부담하도록 하고 있다.

[표 3] 조달청 물품인도조건별 해석

인수도조건	해설	물류 비용 항목 및 부담자		비고
		공급자(계약자)	인수자(수요기관)	
현장설치도	공사현장에서 설치후 인수	발지상차비,운반비,착지 하차비,설치비	-	

※ 자료: 나라장터(국가종합전자조달)-가격정보-활용안내-물품인도조건별 해석

[그림 1] 분할납품요구서




※ 자료: △△△△△△△ 지출결의번호:20231220-0800 붙임 자료 발체(조달청 분할납품요구서)

△△△△△△△△△△△△△△△에서는 관급자재를 구매하면서 [그림1]과 같이 현장설치도 인수조건으로 조달청에 납품을 요구함에 따라, 위 [표3]과 같이 관급자재를 공급자(계약자) 부담으로 설치 완료 후 납품대금을 지급하여야 함에도, 영상감시장치(운영서버, 모니터 등)의 경우 장비를 설치하여야하는 관리소가 건축되지 않았다는 사유로 물품만 납품 받고 설치를 완료하지 않은 상태로 검수(이상없음)하여 납품대금을 지급한 사실을 확인하였다.

또한, 관리소를 건축하지 않은 시점에 관급자재를 구매함에 따라, 2023.12.12. 보안용 카메라만 설치 후 감사일 현재(2024.11.1.)까지 영상감시장치[그림2]는 운영을 하지 않고 있어 현재 영상녹화를 못하고 있는 실정으로, 구매한 물품의 하자담보책임기간 2년(2023.12.12. ~ 2025.12.11.) 중 약 11개월의 하자담보기간을 허비한 결과를 초래하였다. (※ 감사일 현재(2024. 11. 1.)까지 야영장 관리소는 미착공)

[그림 2] 2023년 △△야영장 정비공사(통신) 관급자재 구매 사진첩

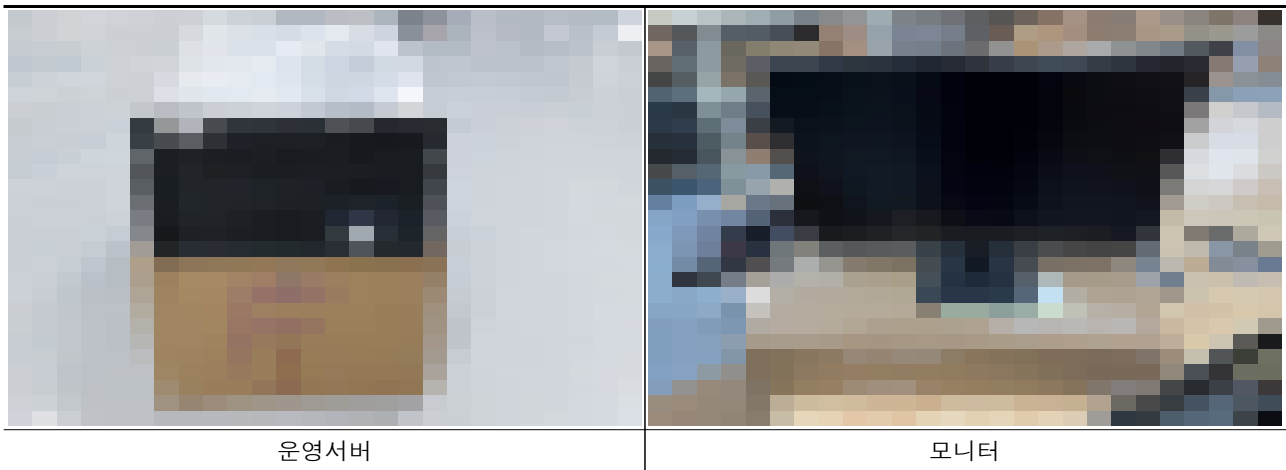

※ 자료: △△△ 제출 자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)에게 야영장 정비공사 관련 관급자재 구매 및 대금 지급 관련 공사감독업무를 소홀히 한 △△△ △급 △△△에 대하여 “신분상 주의” 조치 요구합니다.(주의 1)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△△ △급	△△△	△△, 시설사업	△△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△△△)	신분상 주의	2022.7.1.~ 현재

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)
