

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [6] 장거리 송전선로 사업범위 조정으로 효율적인 사업추진
관 계 부 서 : 남부건설본부 송변전건설실 송전건설부
모 범 직 원 : 남부건설본부 송변전건설실 송전건설부 000
내 용

위 직원은 2022년 2월부터 현재까지 남부건설본부 송전건설부에서 송전선로 건설업무를 수행하고 있다. 입지선정, 시공 등 업무를 수행하며 특히 장거리 송전선로 입지선정 시 사업소 간 사업지역 중첩구간 업무범위 조정 방안을 고안하고 선제적인 사업이관 추진으로 회사 비용 및 행정력 낭비 절감 등에 기여하였다.

1. 제한된 송전선로 입지조건 내 지자체 및 주민 반대에 대한 대응전략 구축


345kV 광양-신장수T/L, 345kV 신장수-무주영동PPS/Y T/L 입지선정 사업대상지역 내 광양-신남원-신옥천으로 이어지는 기설 송전선로가 주거 밀집지역을 경과하고 대형 국립공원, 도심지 등으로 입지선정이 제한되는 등 기설 선로와 근접한 지역주민과 지자체의 극심한 반대가 우려되는 상황이다. 이러한 반대여론을 해소하기 위해 기설 송전선로 이설, 병가 등을 활용하여 신설 송전선로를 최소화하는 등 지자체별 맞춤형 대응 전략을 고안하였다.

2. 적극업무를 통한 사업소간 사업범위 및 업무 조정 추진

중부건설본부 전북건설지사에서 추진하는 345kV 신옥천-신남원T/L 건설사업은 기설선로 주변지역으로 입지선정위원회를 구성하여 송전선로 선종을 교체하는 사업을 추진하고 있어 남부건설본부에서 추진하는 광양-신장수-무주영동 T/L 건설사업과 사업대상지역이 중복되는 상황이다.

또한 광양-신장수-무주영동PPS/Y 대역 내 기설 345kV 신옥천-신남원 송전선로의 경우 '70년대 건설된 노후철탑이 도심지를 관통하는 경우가 많아 향후 입지선정위원회 운영 시 주민 의견에 따라 기설 2회선 철탑을 철거하고 마을에서 이격된 위치로 신설 4회선 송전선로 경과지를 선정하게 될 개연성이 높고 이 경우 전북건설지사에서 시행하는 신옥천-신남원 입지선정과 업무가 중복될 수 밖에 없다.

[그림 1] 사업소 간 업무조정 관련 경과대역

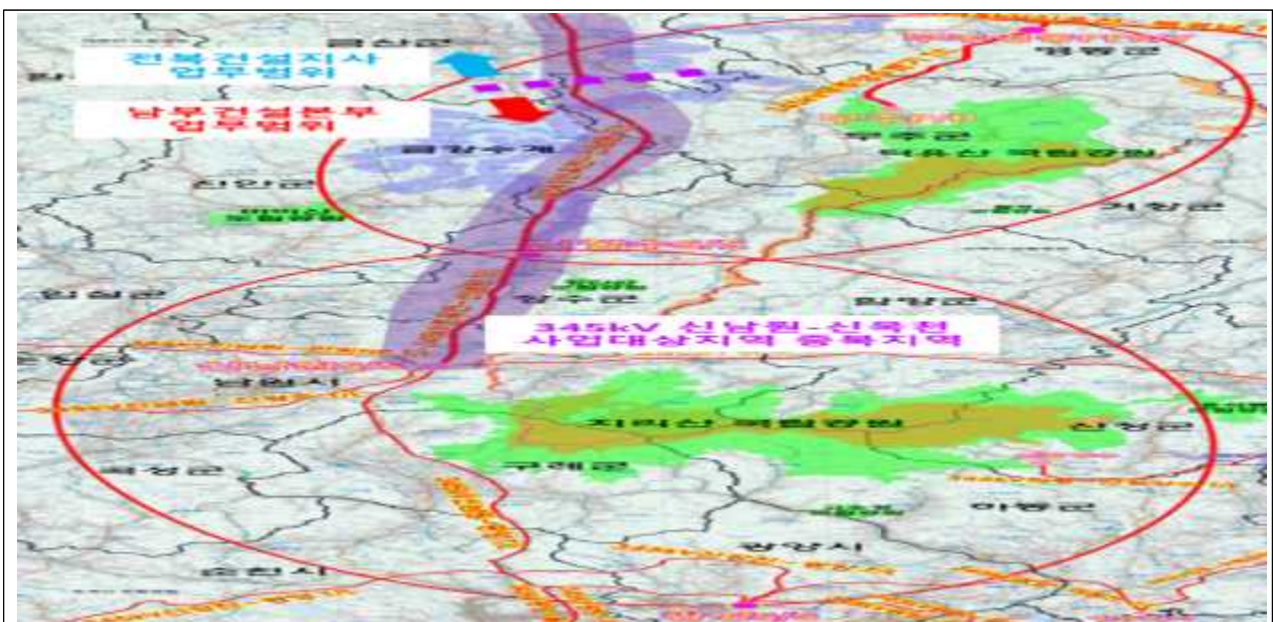

이러한 사실을 인지하고 사업소-본사 협의를 통해 345kV 신옥천-신남원 송전선로 구간 중 신장수-무주영동 건설사업 대상지역인 무주군을 경계로 남부건설 본부-전북건설지사 간 사업 범위 및 업무 조정을 추진하였다. 이러한 업무조정 결과 당초 사업소에서 시행 예정인 장거리 송전선로 전력영향평가 용역의 사업범위가 크게 조정되어 [표 1]과 같이 약 75억 원의 용역비가 절감되어 회사 재무 건전성에 기여하였다.

[표 1] 사업범위 조정 시 전력영향평가 용역비 개략 비교

구 분	업무범위 조정 전	업무범위 조정 후	증 감
광양-신장수T/L	9,614백만원	9,614백만원	-
신장수-무주영동T/L	6,447백만원	6,447백만원	-
신남원-신옥천T/L	10,968백만원	3,401백만원	△7,567백만원
총 계	27,029백만원	19,462백만원	△7,567백만원

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.
