

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

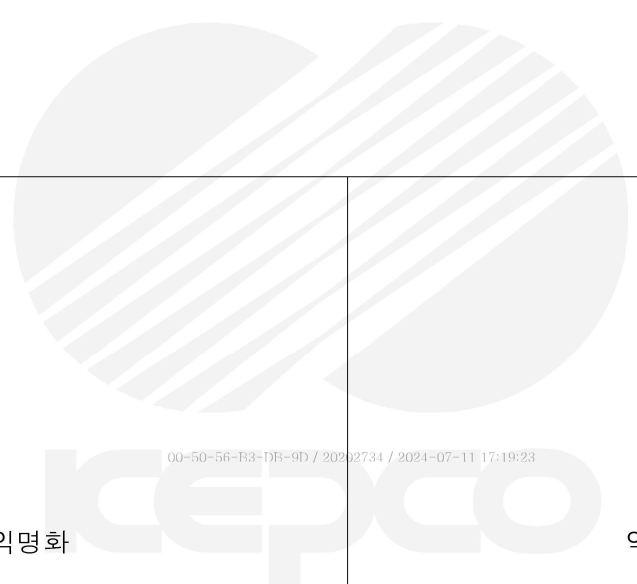
제 목 : [1] <♣ 신축공사 상생 협업 주도 및 투자비 절감
관 계 부 서 : 경영지원처
모 범 직 원 : 경영지원처 사옥건설실 사옥공사부 대리 ■△▽
내 용

위 직원은 2017년 12월부터 사옥건설처(現 경영지원처 사옥건설실)에서 근무하였으며 2018년 7월부터 사옥설계실에서 근무하면서 ☎☐○ 리모델링, <♣ 부대시설 증축 및 <♣ 신축공사 설계를 담당했고 2022년 1월부터는 사옥공사 실로 이동하여 <♣ 신축공사 업무 담당자로 임명되어 현재까지 <♣ 신축공사의 시공품질 확보, 내부고객 만족 및 적기 준공을 위해 업무를 성실히 수행하고 있다.

<♣ 신축공사는 한국전력공사 프로배구단의 통합훈련장 및 부대시설 신축을 통해 타 프로배구단 대비 협소(약 300평, ☐<☒ 배구단 : 600평)하고 노후화된 시설(☐&○◆년 준공) 및 훈련장과 합숙소 원거리 분산운영에 따른 훈련 효율 저하에 대한 문제점을 해소하고 훈련 환경 개선 및 경기력 향상을 위한 목적으로 기존 ♣☐♥변전소 부지 내 건립하도록 추진되었다.

1. ♣️시와 협약 체결 이행을 통한 지역 상생 및 협업 주도

국내 프로배구 발전과 ♣️시민의 편의 증진 및 생활체육 활성화를 위하여 ♣️시 국회의원 및 주민 의견 수렴 등 지속적인 협의 결과 ♣️시와의 협약이 체결(0000년 00월)되었다. 위 직원은 설계 당시부터 협약 내용 이행과 배구선수단 내부고객을 위한 최적 설계를 위하여 체육관 내 부지를 지역 아파트단지 주민들을 위한 주차공간 개방 내용 등 지역주민과의 상생 협업을 위한 설계를 추진했고,

	
1. 배구단 통합 훈련장 건립관련 협약서	1-1. 배구단 통합 훈련장 건립관련 게시물(블로그)

한편, 배구선수단 관계자 등 사용부서 및 운영부서와 설계품질 회의를 통해 의견을 수렴하고 프로배구 선수단의 특성에 맞게 평균신장을 고려한 맞춤 설계

및 훈련 효율 극대화를 위한 최적 동선을 확보하였으며 시공 중에도 지역주민과의 지속적인 협의진행을 통해 민원을 관리하고 관련 담당자들과 인적 네트워크 형성 및 공사관리에 주도적인 역할을 담당하고 있다.

익명화	익명화	익명화
1-2. 1단계 설계품질회의	1-3. 2단계 설계품질회의	1-4. 3단계 설계품질회의
익명화	익명화	익명화
1-5. 선수단 맞춤 특화설계	1-6. 품질회의사진	1-7. 지역주민과 회의사진

2. 방화문 및 방화셔터 품질기준 선제적 검토로 투자비 절감(93백만원)

건축허가 당시 관련 기준인 건축자재 등 품질인정 및 관리기준과 세부운영 지침, 방화문 및 자동방화셔터의 인정 및 관리기준에 따라 인증기관에서 발급한 시험성적서가 있는 방화문 및 대형 스크린 방화셔터를 반영하였으나, 화재안전 및 자재품질관리 강화를 위하여 관련기준이 2022년 4월에 개정되며 건축자재 등 품질인정서가 있는 자재를 사용하도록 변경되었다. (공사입찰공고 : 2022. 3. 31)

개정된 건축자재 등 품질인정 및 관리기준을 충족하기 위해 발생하는 공사 일정 지연(시험인증서 발급 약 6~8개월 소요) 해소 및 시험비용 절감(30백만 원)을 위하여 관련 법령을 재검토하고 국민신문고 질의 및 설계용역사와 협의 등을 통하여 방화구획 및 방화문과 서터의 개선 방법을 도출하였다. 최종적으로 ♣️🀄️♥️ 시청 인허가 담당자와의 협의를 통해 개선 사항에 대한 확인을 받음으로써 63백만 원을 추가 절감하였다.

익명화 00-50-56-B3-DB-9D / 2024-07-11 17:19:23	
2. 방화서터 설치크기 관련 국민신문고 질의회신	익명화
익명화	
2-1. 방화서터 설치크기 관련 국민신문고 질의회신	2-2. 방화구획 완화 검토

[표 1] 방화구획 변경관련 공사비

[단위 : 원]

품명	규격	수량	금액		증감	비고
			변경 전	변경 후		
스크린방화셔터	24.4m×6.3m	1	30,259,000		-30,259,000	삭제
스크린방화셔터	23.85m×3.6m	1	24,903,000		-24,903,000	삭제
스크린방화셔터	21.95m×5.4m	1	26,161,000		-26,161,000	삭제
유리방화문	1.1×2.4m	2		4,580,000	4,580,000	추가
방화문	2.1×3.0m	1		4,005,000	4,005,000	추가
방화문	1.8×2.4m	2		7,315,400	7,315,400	추가
방화문	1.2×2.4m	2		1,308,292	1,308,292	추가
방화문	1.0×2.4m	1		409,030	409,030	추가
스크린방화셔터	7.6m×3.6m	1		6,400,000	6,400,000	추가
스크린방화셔터	3.6m×3.0m	1		5,280,000	5,280,000	추가
스크린방화셔터	2.0m×3.0m	1		4,080,000	4,080,000	추가
직접공사비 소계			81,323,000	33,377,722	-47,945,278	
간접비(일반관리비, 이윤 포함)			26,023,360	10,680,871	-15,342,489	
합 계			107,346,360	44,058,593	-63,287,767	

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)
