

수범사례

제 목 : 원가절감 방안 및 사업성 개선(용인 플랫폼시티 하수처리시설)

□ 하수처리시설 계획 변경(플랫폼→수지레스피아)을 통한 원가절감 및 사업성 개선

○ 추진배경

사업지구 중심공원 내 하수처리장 설치로 인한 사업리스크(공사지연, 구조물 간섭, 공원활용성 저하 등) 발생으로 개선방안 수립필요

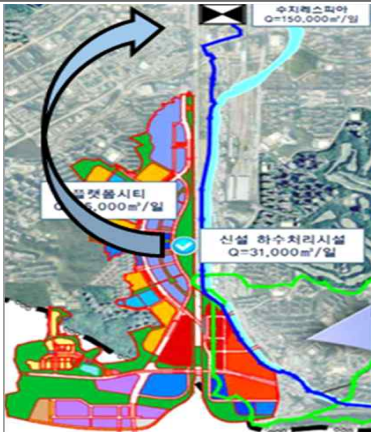
○ 문제점 및 검토방향

(문제점) ① 지하구조물 간섭 ② 공사중 가도설치계획 간섭 ③ 공원 계획 제약 발생
⇒ 각종 간섭에 따른 사업기간 연장 및 토지활용성 제약 등에 따른 사업성 저하
(검토방향) 하수처리계획 적정성 재검토를 통한 토지활용성 최대화, 공사 및 구조물 간섭에 따른 사업리스크 최소화를 통한 사업성 향상 도모

○ 추진내용

(개선방안) 하수처리시설 설치계획 변경(단지내 신규설치→수지레스피아 연계처리)을 통한 사업리스크 제거 및 사업성 개선

(추진내용) 하수연계처리를 위한 관련기관 적극·지속 협의

하수처리계획 변경	용인시 주요 협의내용
	[협의기간] '23.06 ~ '24.05 [협의내용] - 사업지구내 부지협소에 따른 설치 제약사항 설명 - 연계처리에 따른 용인시 내 하수관리 용이성 강조 - 연계처리를 통한 공적비용투입 감소 - 시설물 간섭배제에 따른 안전사고 위험성 제거 - 공기단축에 따른 용인플랫폼시티 조기 활성화 - 사업지구내 공원특화를 통한 랜드마크 조성

(추진결과) 용인플랫폼시티 발생 하수 수지레스피아 연계처리 동의['24.05.2.]

○ 기대효과

- (사업성 제고) 각종간섭 배제에 따른 공사기간 단축 통한 사업성 제고
- (민원해소) 공원내 하수처리시설 설치에 따른 악취 등의 민원 사전해소
- (투입인력 감소) 하수연계처리에 따른 公社 투입인력 감소(5인, 7년)
- (투입비용 절감) 하수처리시설 설치관련 소요비용 절감
- (공원활용성증대) 하수처리시설 배제에 따른 공원 경관성 및 주민활용성 증대
