

■ 지적사항 요약

2 공사·용역·물품 계약 이행 분야 (13건) No. 10~22


(18) ㉠㉡공사 가설사무실 설계변경 관리 미흡

부서경고 - ■단 ◆부 / 권고 - ㉠처 ㉡부

【현황 및 근거】

- 「건설공사 업무수행지침」 제12조에 따라 발주자는 설계변경 등 주요사항 발생시 현지확인 및 검토·보고를 하도록 되어 있고, 특별한 사유가 없는 한 실정보고, 설계변경 방침 결정을 요청일로부터 14일 이내로 해야 함
- ㉠㉡공사 일반시방서 제9항에 따르면 공사용 시설물의 설치, 운용, 유지관리, 이설 및 철거는 설계변경 조건에서 제외되며, 불가피한 가설시설물의 증설이 필요한 경우 발주자 승인 후 설계변경 할 수 있음

< ㉠㉡공사 가설사무실 현황 >

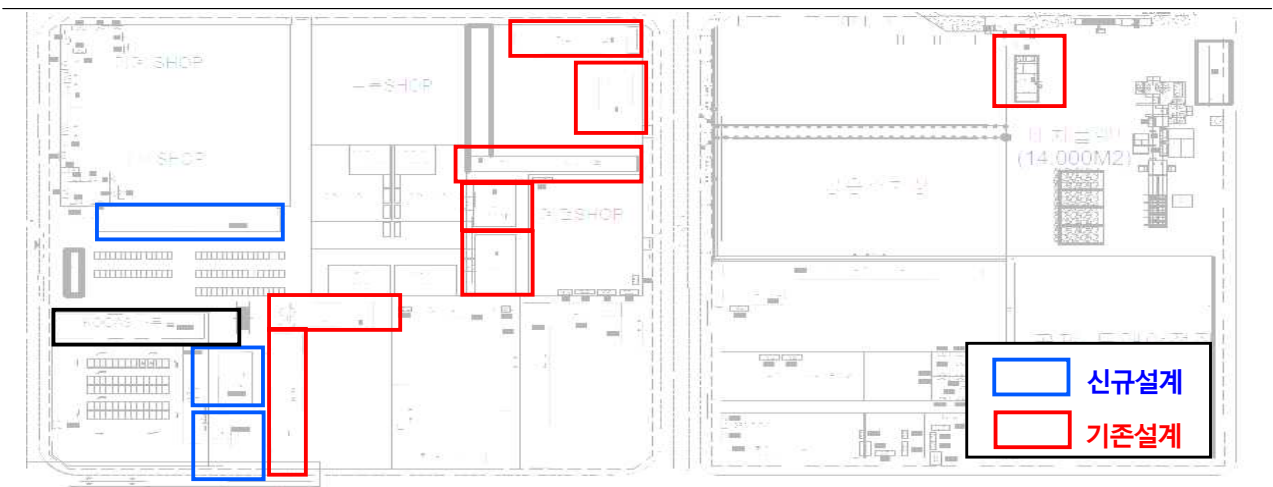

- 「공사계약 종합심사낙찰제 심사기준」 제18조에 따라 고난이도 공사*는 일부공종에 대해 입찰자에게 '물량내역수정 허용공종'을 정하게 할 수 있으며, 이 경우 물량내역서의 누락이나 오류 등을 사유로 계약금액을 증액할 수 없음
 - 당공사 심사기준 제17조에 따라 '물량내역수정 허용공종'은 공사주관부서(㉡부)에서 정하며, 입찰자는 현장 설명시 배부한 물량산출기준*에 따라 산출해야 함
- * (예시) 가설사무실 내부공사의 경우 ①물량산출설명서(연면적, 현장위치도), ②물량산출유의서(설계변경 제한사항), ③물량산출근거를 입찰자에게 제공

【문제점】

- ① (가설사무실 설계변경 관리 미흡) 신규가 아닌 기존 가설사무실은 일반시방서에 설계변경 대상이 아님에도, 계약상대자는 추가시공된 전기자재들(배선, 등기구 등)에 대해 실정보고를 통해 증액 요청 중이나, ㉠㉡기지는 방침 결정 미이행

- 실정보고 2회(2022.00.00., 2023.00.00.)에도 발주자(◆부) 회신 없음

② (물량내역수정 허용공종 개정 필요) 가설사무실 내부시설 공사(대비전기·기계)의 물량을 입찰자가 작성토록 하여 설계서 불분명을 사유로 계약금액이 증액되지 않도록 기준 개정 필요

- 現 물량내역수정 허용공종 산출기준은 가설사무실 공종이 미포함됨

【조치할 사항】

- ▶ ㉠㉡공사의 가설사무실 설계변경 방침을 기한 내 까지 정하지 않고 계약관리에 미흡한 부서에 경고 요구 (부서경고)
- ▶ 가설사무실 내부공사(대비전기·기계)에 대해 실효적인 설계변경 제한이 될 수 있도록 물량내역수정 허용공종에 반영 등 방안마련 조치 (권고)
