

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [2] AMI 보급 및 검침품질 관리를 위한 업무체계 혁신
관 계 부 서 : 부산울산본부 전력사업처 스마트미터링부
모 범 직 원 : 부산울산본부 전력사업처 스마트미터링부 대리 000
내 용

위 직원은 2023년 1월부터 현재까지 부산울산본부 스마트미터링부 AMI운영팀에서 계기-모뎀 동시시공 관리업무를 수행하고 있다. 특히 AMI 보급 확대 및 원격검침 품질 제고를 위해 전반적인 프로세스 개선 방법을 고안하는 등 스마트미터링 인프라 구축 및 관리 효율화에 기여하고 있다.

1. 미터링 인프라 시공 최적화를 위한 계기-모뎀 동시시공 시범운영 추진

통상적으로 AMI 구축 고객의 검정만료로 인한 계기 교체 시 저압협력회사에서 계기 철거·교체 시공 후 전력공급부 ‘내선계기팀’이 해당 고객에 대한 통신 재개통을 요청하고 ICT운영부 ‘AMI통신팀’은 대상을 취합하여 공사계획을 수립, KKK에 통신 모뎀 부설 시공지시를 하였다. 그러나 부서·시공사 간 공사 구역과 일정 상이로 계기 교체 후 통신모뎀 설치 지연에 따른 고객 불편 및 AMI 운영효율이 저하되는 문제가 발생하였다.

이를 해결하고자 부산울산본부는 AMI 전담부서인 스마트미터링부 직제 신설로 AMI 업무 프로세스를 간소화하고 운영 효율성을 증대하고자 계기 교체 시 통신모뎀을 동시에 시공하는 방안을 강구하였다. 주 내용은 내선계기팀이 AMI 구축 여부를 반영하여 검기만료 계기교체 계획을 수립, 정보통신공사업 면허와 통신설비공을 모두 보유한 저압협력회사가 계기와 모뎀을 일괄 시공하고, 통신 성공여부가 확인 되면 노무비를 정산하는 방식이다.

[그림 1] 전력량계-모뎀 시공 업무 프로세스 개선 절차 비교

[기존] 일 반 시 공	저압 전문회사 전력량계 교체·모뎀 → 3.5개월 → KKK 모뎀 신설	
[개 선] 동 시 시 공	저압 전문회사 당일 전력량계-모뎀 교체·부설	검침수수료 3.5개월↓ 시공 노무비 40%↓
모 뎀 재 사 용	저압 전문회사 계기교체시 모뎀 → KKK 연결장치 시공·개통	통신모뎀 철거 노무비 미지급


이에 담당자는 자격이 되는 관내 6개 저압협력회사를 대상으로 사업의 필요성을 설득한 끝에 '23년부터 동시시공 시범운영에 5개 사업소를 참여시켰으며, 그 결과 약 4만여대의 계기가 교체 당일에 원격검침으로 전환되어 종전대비 AMI 구축기간이 약 3.5개월 단축하였을 뿐만 아니라, AMI 서비스를 중단없이 제공하여 고객편익 증진에 기여함과 동시에 노무비와 인력검침수수료 등 '23년 ~ '24년 누계 약 15.7억원을 절감하였다. 이는 전사에 확대하여 적용할 경우 연간 동시시공 물량을 약 60만대로 가정하면 약 106억원/년 절감할 수 있다. 또한 동시시공 시범사업 운영 결과를 바탕으로 관련용어 정의, 시공절차 및 방법, 통신모뎀 작업 시 안전 유의사항 등을 반영한 「전력량계-모뎀 동시시공 절차서」를 '23년 10월에 제정하여 전 사업소에서 확대 시행할 수 있는 기반 마련에 적극 기여하였다.

'23년 시범운영 효과가 검증됨에 따라 '24년에는 검정만료 계기 교체 외에도 1개 사업소를 대상으로 영업일반과 신증설(G-Type 계기와 LTE모뎀 설치대상)에도 동시 시공 적용 범위를 확대하여 운영하는 등 적극적인 업무처리를 통해 약 6.8억원/년을 절감하여 회사 재무건전성 개선에 기여하였다.

2. 검정만료 계기 교체 시 탈착 된 외장형모뎀 계기함 內 보관·재사용 추진

아울러 동시시공 보유 자격이 없는 저압협력회사가 대부분인 점을 고려하여 관내 전 사업소 및 저압협력회사 대상으로 설득한 결과 업체에서 검정만료 계기교체 시 외장형모뎀은 계기함 내 보관 후 봉인하고, 향후 KKK에서 연결장치를 통해 바로 시공할 수 있도록 외장형모뎀 재사용 방식을 '24년부터 추가로 도입하였다. 이는 통신모뎀 재사용 없이 일괄 철거로 인해 발생하는 저압협력회사 철거노무비와 KKK의 통신모뎀 신설 노무비에 대한 지급분 약 1.8억원/년을 절감하였고, 모뎀 분실을 예방하는 데 적극 기여하였다.

[그림 2] 외장형모뎀 재사용 업무 프로세스 비교

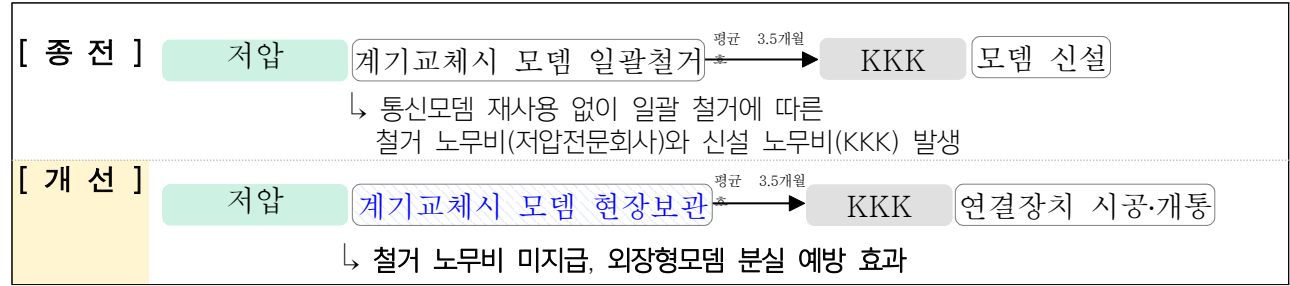

3. 관련 부서와의 협업을 통한 「원격성공률 제고 T/F」 운영

'25년도 관내 동시시공이 가능한 저압협력업체 수(5개 → 2개)가 축소됨에 따라

AMI개소에 대한 원격성공률 관리 강화를 위해 관련 부서의 협업이 필요한 상황이라 판단되어 「원격검침 성공률 관리 T/F」를 구성하여 진행하였고, AMI 고객의 검침일과 KKK의 통신보강 일정 등을 모두 고려한 최적의 계기시공 교체대상 선정 시스템 자체 개발에 참여, 관내 사업소 및 저압협력회사 대상으로 시스템 도입을 통한 검정만료 계기교체 시공프로세스 개선에 이바지 하고 있다.

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)
