

한전KDN(주) 상임감사 개선 요구 · 권고

제 목 안전점검 결과를 반영한 유지보수 계획 수립·이행 미흡

소 관 부 서 ○○○○처(△△△△△△팀)

조 치 부 서 ○○○○처(△△△△△△팀)

구 분 안전관리(안전점검 절차)

내 용

1. 업무 개요

△△△△△△팀은 본사 사옥의 안전점검과 적절한 유지관리를 통하여 시설물의 효율을 증진시킴으로써 공중의 안전을 확보하고자 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 의거하여 시설물의 적절한 안전과 유지관리를 위한 조직·인원 및 장비의 확보에 관한 사항 등을 포함한 “시설물관리계획”을 수립하여 국토교통부 시설물통합정보관리시스템¹⁰⁾에 제출해오고 있다.

2. 관계 법령 · 규정 및 판단기준

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제6조(시설물의 안전 및 유지관리계획의 수립·시행)에 근거하여 관리주체는 기본계획에 따라 소관 시설물에 대한 안전 및 유지관리계획(이하 “시설물관리계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 하며, 시설물관리계획에는 보수·보강 등 유지관리 및 그에 필요한 비용에 관한 사항이 포함되어야 한다.


또한 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(이하 “지침”이라 한다)」

10) 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 정보를 체계적으로 관리하기 위하여 국토교통부에서 운영하는 시스템

제52조(보수·보강의 실시 등)에 의거하여 관리주체는 시설물의 성능 및 기능 등을 지속적으로 유지하고 공중의 안전 확보와 시설물을 사용 가능한 연수가 연장될 수 있도록 안전점검 실시결과 발견된 결함의 종류 및 정도·시설물의 중요도·사용환경 등을 면밀히 검토하여 필요한 보수·보강 방법 및 수준, 우선 순위를 결정하여야 하고, 그에 따라 합리적이고 경제적인 보수·보강 등을 실시하여야 한다.

아울러 건축물은 일반적으로 시간의 경과에 따라 내하기능¹¹⁾이 저하되고, 시공시의 결함 등에 의한 손상에 대하여 적절한 유지보수를 실시하지 않는 경우에는 그 기능 저하가 가속화되기 때문에 본사 사옥의 내구성 및 사용연수 증대를 위하여 안전점검 결과 등에 대한 적절한 유지보수 계획의 수립 및 이행이 요구된다.(그림1 참조)

[그림1] 시간경과에 따른 건축물의 내하기능 저하

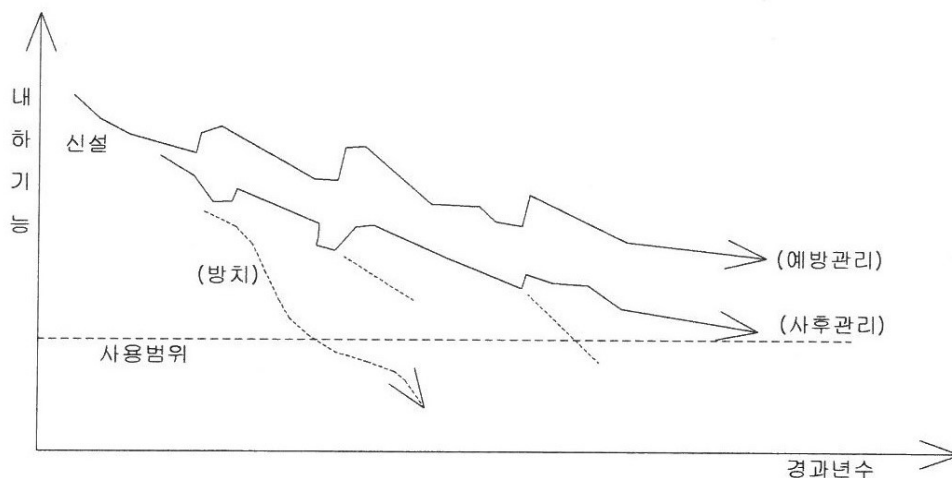

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△팀은 본사 사옥의 생애주기 및 안전점검 결과 등을 고려하여 유지 보수 이행 계획을 수립하여야 하나 감사종료일('21. 11. 19.)까지 안전점검 결과 주요 결함사항 및 보수·보강 권장 사항에 대한 유지보수 이행 계획을 수립하지 않았으며(그림2 참조), 결함의 종류 및 정도·시설물의 중요도 등을 고려하여 보수·

11) 내하기능 : 구조물의 하중 및 하중 변화에 대한 저항기능

보강 방법 및 우선순위를 결정한 후 보수·보강을 실시하여야 하나 이행에 소홀함이 있었다.(그림3·표1 참조)

[그림2] '19년 이후 보수·보강 계획 수립 이력(시설물통합정보관리시스템)

한전KDN 본사

시설물관리대장 유지관리계획 유지관리실적 시설물비용정보 점검진단대가산정

유지관리계획(총괄) 점검진단계획 보수보강계획 총괄표(승인요청)

보고년도: 전체 공사구분: 전체 보수보강부위: 검색 엑셀

공사구분을 클릭하면 보수보강계획 세부내용을 검색할 수 있습니다.

No	공사구분	시작일	종료일	보수보강부위	공사내역	예산(천원)	승인상태	승인(반려)일
등록된 자료가 없습니다.								

새로작성

[그림3] '19년 이후 보수·보강 이력(시설물통합정보관리시스템)

한전KDN 본사

시설물관리대장 유지관리계획 유지관리실적 시설물비용정보 점검진단대가산정

점검진단실적 보수보강실적 사용제한 등 조치 중대결합동사후관리 총괄표(승인요청)

실시년도: 전체 공사구분: 전체 공사명: 검색 엑셀

공사명을 클릭하면 보수보강실적 세부내용을 검색할 수 있습니다.

No	공사명 공사기간	공사구분	보수보강부위 공사내역	설계자 공사비(천원)	시공자 책임기술자	승인상태	보수보강도서
등록된 자료가 없습니다.							

새로작성

[표1] 주요 권고사항에 대한 보수·보강 우선순위 검토 및 이행 여부('19년 이후)

구 분	안전점검 결과보고서상 보수·보강 관련 주요 권고사항	전회 주요 권고사항에 대한 보수·보강 우선순위 검토 여부	전회 주요 권고사항 보수보강 여부
'19년 상반기	• 벽체균열 등 구조체 주요 결함부위 우선적인 보수조치 등	미검토	미시행
'19년하반기 ~ '21년상반기	• 벽체균열 등 구조체 주요 결함부위 우선적인 보수조치 및 추적관리 • 지하주차장 상부 단열재 들뜸 등 우선적 보수조치 필요 등	"	"

※ '21년 하반기 정기안전점검 진행 중('21. 11월 ~ 12월)

그 결과 시간의 경과에 따른 노후화 및 외력 등에 의한 본사 사옥 손상에 대한 대응이 미흡하여 건물 성능의 저하가 가속화될 우려가 있었다.

4. 관계부서 의견

△△△△△△팀에서는 감사종료일('21.11.19) 이후 「2022년도 ‘시설물 안전 및 유지관리 계획’(△△△△△△팀-32, 2022.1.4.)」을 수립하여 CEO에게 보고하는 등 “시설물안전법”에 따른 본사 사옥 유지관리 계획 미수립에 대한 시정 조치를 완료하였다는 의견을 제시하였다. 그러나 既시행된 안전점검에서 결함 및 손상으로 판정된 부분에 대한 보수·보강 등 유지관리 계획과 그에 대응하는 유지관리 실적 등에 대한 내용이 누락된 점을 고려할 때 본사 사옥 유지관리 계획 미수립에 대한 시정 조치를 완료하였다는 △△△△△△팀의 의견을 수용하기에 다소 어려움이 있었다.

5. 조치할 사항

○○○○○처장은

- ① 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 및 관련 지침에 따라 안전점검 실시결과 발견된 결함에 대한 보수·보강 등 유지관리 및 그에 필요한 비용에 관한 사항 등을 포함하여 본사 사옥 유지관리 계획을 수립·이행하여 주시기 바랍니다.(개선)
- ② 본사 사옥의 안전확보 및 사용연수 증대를 위하여 안전점검 실시 결과 발견된 결함 및 손상에 대한 내역과 그에 대한 보수·보강 우선순위 및 방법 등에 대한 이력을 누적하여 관리하는 방안을 마련하여 주시고, 그에 따라 합리적이고 경제적인 보수·보강을 실시하여 주시기 바랍니다.(권고)
