

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 통보

제 목 : [11] 한전:ON 시스템 업무위탁 용역시기 부적정

소 관 부 서 : ICT기획처

조 치 부 서 : 인사처, ICT기획처

내 용

1. 업무 개요

ICT기획처는 영업처의 요구로 한전사이버지점의 민원처리율 제고 및 서비스 향상을 위하여 '22. 3. '사이버지점 전면개편 추진계획'을 수립하고 한전KDN(주)와 용역계약을 체결하여 '23. 1. 한전:ON App¹⁾을 오픈하였고 같은 해 7월 한전:ON Web을 오픈하여 사이버지점에서 한전:ON으로의 전면 개편을 완료하였다.

[표 1] 한전:ON 오픈 현황

시스템명	오픈 전	1차 오픈 ('23. 1. 9.)	2차 오픈 ('23. 7. 17.)
한전:ON (舊 사이버지점)	▪ (모바일) 사이버지점 ▪ (PC) 사이버지점	▪ (모바일) 한전:ON ▪ (PC) 사이버지점	▪ (모바일) 한전:ON ▪ (PC) 한전:ON
• 사업 전·후 명칭 변경 : [기존] (WEB)사이버지점 + (APP)사이버지점 → [변경] (WEB) + (APP) 한전:ON			

자료: ICT기획처 한전:ON 구축 내부분서 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「용역계약일반조건」 제58조(하자보수 등) 제4항에 따르면 “제2항 각호에

1) 한전:ON시스템 : 우리 회사가 제공하는 공식 모바일 및 온라인 고객서비스 플랫폼으로 전기요금 조회, 자동이체 등 주 서비스들을 제공하는 APP과 WEB으로 구성되어 있음


해당하는 유상 유지관리 또는 재개발에 대해서는 발주자가 계약목적물을 인수한 직후부터 계약을 체결하여 시행하여야 한다.”라고 규정되어 있다.

[표 2] 「용역계약일반조건」 제59조 제2항 제1호~4호

- | |
|--|
| 1. 무상하자보수기간 경과 후 발생한 하자에 대한 보수
2. 이미 구매한 물품 또는 이와 연동된 제품을 기초로 추가되는 개발·구축(사용방법 및 환경개선을 위한 요구 사항 추가를 포함한다)
3. 계약서에 명시되지 않은 예방을 위한 현장방문, 상시 근무에 소요되는 인력투입 등
4. 계약서에 명시되지 않은 사용자에게 대한 교육 및 기술지원 |
|--|

그리고 「EA업무절차서」 부록 3(소프트웨어 개발비 산정방식 표준)에 따르면 “위탁운영 담당부서는 운영개시일 전 위탁총괄관리부서에 일상운영 또는 유지보수 위탁 의뢰”하도록 규정되어 있다.

[그림 1] 소프트웨어 개발 완료 이후 유지보수로의 이관 시점

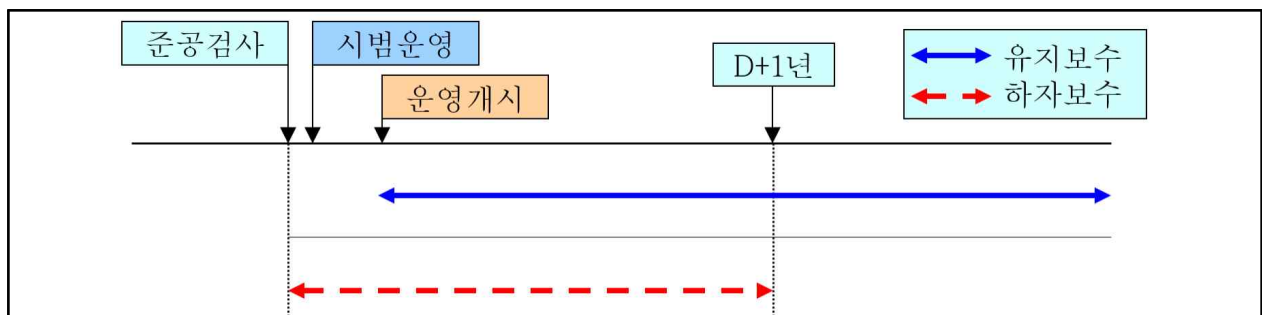

자료: 「EA업무절차서」 발췌

따라서 한전:ON 시스템에 대한 유상 유지관리가 필요한 경우에는 준공검사를 하고 시스템을 인수한 상태에서 유지보수 계약을 체결하여 유지보수를 시행해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 우리 회사가 제공하는 고객센터 플랫폼을 사이버지점에서 한전:ON 시스템으로 전면 개편하는 ‘한전:ON시스템 구축용역’을 시행하면서 시스템 준공 및 인수 이후에 유지보수 용역을 시행했어야 함에도, [표 3]과 같이 한전:ON 시스템의 모바일 분야인 한전:ON App을 준공일('23. 7.)보다 7개월 빠른 '23. 1. 조기 오픈을 하면서 위탁용역을 시행한 결과 [표 4]와 같이 90백만 원의 용역비가 과다 지급되었다.

[표 3] 한전:ON 시스템 위탁용역 시행 시기

구분	단위시스템명	1차 오픈	준공일	최종 오픈	용역시기
1차 (App분야)	한전:ON	'23. 1. 9.	'23. 7. 15.	'23. 7. 17.	준공일 이전
2차 (Web분야)		없음			준공일 이후

자료: 위탁시행 요청 공문 재구성

[표 4] 사이버지점모바일-한전:ON 시스템 위탁금액 비교

단위시스템명	위탁금액(1월~7월)	비고
사이버지점 모바일(기준)	34,549,553원	23. 1. 9.(위탁해지)
한전:ON(변경)	124,709,086원	23. 1. 9.(위탁추가)
차 액	90,159,533원	

자료: 기존 사이버지점(모바일) 위탁을 유지하였을 경우, 7개월간 예상 위탁금액 자체 산출

이에 대하여 한전:ON시스템 구축을 담당한 ICT기획처 <<<(3)은 '22. 2. 참여한 ‘영업·배전분야 디지털화T/F’에서 한전:ON시스템 중 App분야에 대하여 '22년도에 80% 이상으로 구축하기로 하고, 같은 해 6월에 한전KDN(주)와 용역 계약을 체결하고 개발에 착수하였다.

그러나 [표 5]와 같이 한전:ON시스템 App의 1차 오픈('23. 1.) 시 전체의 기능을 발휘하지 못한 상태(전체 기능의 46% 수준)에서 오픈하는 등 관련규정을 위반하고, 위탁비용을 증가시키면서까지 '23. 1.에 오픈하였다.

[표 5] 한전:ON App 분야 업무기능

구분	기존(사이버지점)	1차 오픈('23. 1. 9.)	최종 오픈('23. 7. 17.)
업무 기능	- 요금조회 등 29종 (※ 앱은 13종)	전기사용·복지할인 등 민원 신청 기능 50종	통합청구, 상계거래 등 민원 신청 기능 108종 제공

자료: ICT기획처 제공 자료 재구성

따라서 한전:ON 구축용역 업무를 담당하면서 위탁용역 시행 관련 규정을 위반하고 용역 준공 전 위탁유지보수를 조기 시행하여 위탁용역비 90백만 원을 과다하게 지급한 책임이 있는 <<<(3)에 대하여 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

관계부서 의견

ICT기획처 <<<(3)은 '22. 4. 시행계획 수립단계에서부터 조기 오픈이 예상되었고 업무절차서에서 유지보수용역 시행시기는 준공검사일 이후로 되어 있다는 점 등을 고려하여 용역 설계 시 위탁유지보수 사항을 반영하였어야 했으나, 이를 간과하였고 결과적으로 한전:ON시스템 준공 전 위탁용역을 시행하여 7개월 동안 90백만 원의 위탁비용이 과다지급 되었다는 사실에 대하여 잘못을 인정하였다.

조치할 사항

ICT기획처장은 용역업무 추진 시 준공 전 위탁을 시행하여 비용이 발생하지 않도록 재발방지대책을 마련하여 주시기 바랍니다.(통보)

ICT기획처 차 장 ◁◁◁(주의)

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
11	통 보 [1]	-	주 의 [1]	ICT기획처	인사처 ICT기획처
