

# 국립공원공단 상임감사

## 경고(1), 통보

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 제 목     | 자동제세동기 전달 및 조난자 수색용 드론 구매 감독원 업무 소홀 |
| 소 관 기 관 | △△△△처 △△△△부                         |
| 조 치 기 관 | △△처 △△△△부, △△△△처 △△△△부              |
| 조 치 기 한 | 처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내              |
| 내 용     |                                     |

### 1. 업무개요

공단은 험준하고 광활한 지리·지형적 특성을 극복하고자 드론을 공원관리에 활용하고 있으며, 최초 도입은 '14년 공단 업무계획 수립을 위한 '공단 발전 아이디어 공모'에서 우수과제로 채택(2013년 11월) 된 것을 계기로 시범사업(2014년)을 거쳐 현재 전 공원사무소(원)에서 △△대(일반드론 △△대, 다목적드론 △△대)의 드론을 운용하며 공원관리에 활용하고 있다.

특히, 다목적드론(자동제세동기 전달 및 조난자 수색용 드론)의 경우, 드론의 첨단 ICT(정보통신기술)을 공원관리에 접목하여 탐방객의 안전을 확보하고 공원 자원훼손을 예방하는 등 국립공원 보전에 선제적으로 대응하며, 관리인력의 접근이 어려운 고지대, 급경사지, 섬지역 등에서 안전사고발생시 골든타임 내 구급용품 지원으로 탐방객 생명 보호를 위해 2020년부터 2021년까지 총 △△대를 구매하여 △△개 국립공원사무소(원)에서 운용하고 있다.

## 2. 관계법령 및 판단기준

“「기획재정부계약예규」 물품구매(제조)계약일반조건”제25조(계약기간의 연장) 제1항에 따르면 계약상대자는 제24조제3항 각 호의 어느 하나의 사유가 계약기간내에 발생한 경우에는 계약기간 종료전에 지체없이 계약담당공무원에게 서면으로 계약기간의 연장신청과 제4항에 의한 계약금액 조정신청을 함께 하여야 한다.

다만, 연장사유가 계약기간내에 발생하여 계약기간 경과후 종료된 경우에는 동 사유가 종료된 후 즉시 계약기간의 연장신청과 제4항에 의한 계약금액 조정신청을 함께 하여야 한다.

동예규 제2항에서는 계약담당공무원은 제1항에 의한 계약기간연장 신청이 접수된 때에는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 계약이 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다고 명시하고 있다.

또한 공단 「공사업무집행규칙」 제24조(공사기한 연기)제1항에 따르면 공사감독관은 공사기한의 연기가 필요할 때에는 계약상대자로 하여금 증빙자료를 첨부하여 공사기한연기원(별지 제6호서식)을 공사집행(감독)부서장(공사감독관 경유)의 확인을 받아 계약담당부서의 장에게 제출하고 승인을 받도록 하여야 하고 제2항에서는 제1항에 의거 공사기한연기원 확인 시 공사감독관 및 공사집행(감독)부서의 장은 연기사유 증빙자료 등의 타당성을 검토하여야 하며, 필요 시 의견서를 작성·첨부하여야 한다.

그리고 공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무)제1항에 따르면 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에

대하여는 관계법령 및 공단의 제 규정에서 정하는 바에 따른다고 하고 있으며,

동규칙 제41조(계약이행 내용의 위반 등의 처리)제1항에 따르면 검사자는 준공검사 기간 이내에 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견할 때에는 지체 없이 미준공보고서(별지 제15호서식)를 준공검사보고 절차에 의거 보고하고 공사집행(감독)부서의 장은 계약상대자에게 통보하여야 하며, 제2항에서는 제1항의 규정에도 불구하고 제39조제1항의 검사 기간 이내에 완료될 수 있는 경미한 사항은 검사자가 현장에서 직접 재시공을 명하고 제39조제1항의 절차에 따라 보고하여야 한다.

또한 동규칙 제43조(준공판단)에 따라 공사집행(감독)부서의 장은 준공 전월에 공사 진척이 예정 공정보다 미달하고, 준공 예정일내에 완공이 불가능할 경우 부진 사유 및 그에 대한 대책을 사업총괄부서의 장에게 보고하여야 한다고 명시하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 가. 납품기한 연장 업무 처리 미흡

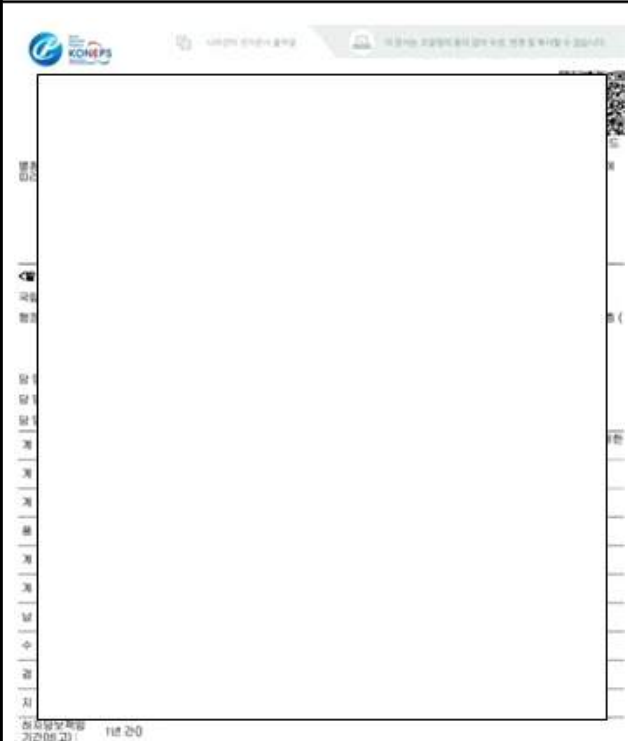
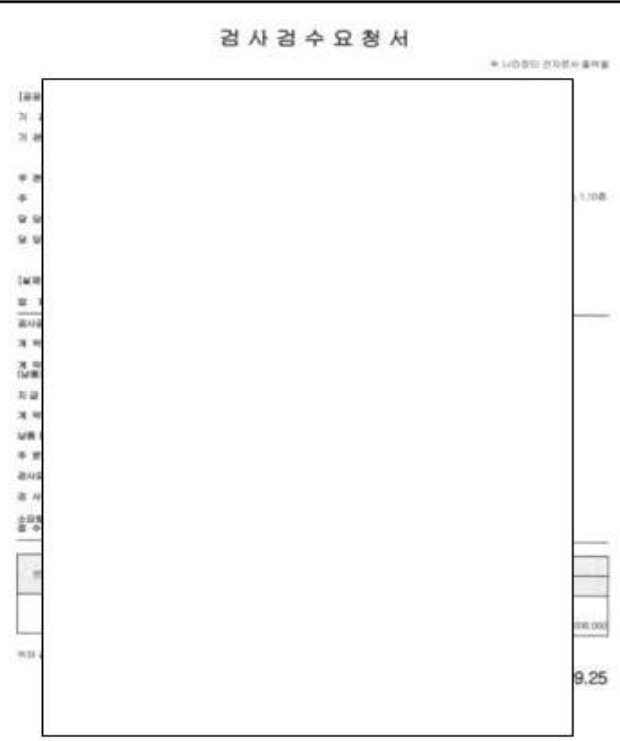
[표1] 자동제세동기 전달 및 조난자 수색용 드론 구매 현황(2020년)

| 계 약 명                     | 계약기간     | 주요 내용                                                  | 계약금액(천원) | 계약업체    |
|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------|---------|
| 자동제세동기 전달 및 조난자 수색용 드론 구매 | △△△△△△△△ | - 드론 △△세트<br>- 드론 보관소 △△세트 설치<br>- 사용자 교육훈련 및 매뉴얼 제작 등 | △△△△△    | △△△△ △△ |

△△△△처 △△△△부에서는 2020년도에 탐방객의 안전을 확보하고 공원 자원훼손을 예방하는 등 국립공원 보전에 선제적으로 대응하도록 관리인력의 접근이 어려운 고지대, 급경사지, 섬지역 등에서 안전사고발생시 골든타임 내 구급용품 지원으로 탐방객 생명을 보호하기 위하여 위 [표1]에서와 같이 「자동제세동기

전달 및 조난자 수색용 드론 구매」 사업을 △△△△ △△와 2020. 6. 25. 총 사업비 금△△△원에 계약을 체결하고 2020. 6. 25.부터 2020. 10. 19.까지 사업을 추진하면서 드론 △△세트, 드론 보관소 △△세트 설치, 교육훈련 및 매뉴얼 제작 등을 완료하였다.

[그림1] 물품계약서 및 검사검수요청서

| 물품계약서(2020. 6. 25.)                                                                | 검사검수요청서(2020. 9. 23.)                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

2020년 드론 구매와 관련하여 위 [그림1]에서와 같이 물품계약서 및 검사검수요청서를 확인한 결과, 최초 물품계약은 나라장터 전자문서를 통하여 2020. 6. 25. 체결[계약번호 △△△]하고 납품기한은 2020. 9. 26.까지였으며, 계약업체 △△△△ △△는 물품 납품기한이 도래되어 2020. 9. 23. 나라장터 전자문서를 통하여 공단에 검사검수요청서[검사검수요청번호 △△△]를 제출[검사검수요청서, 완수검사원, 완수 사업내역(세부), 완수내역서, 청렴이행 공동 확인서 포함]하였다.

이에 공단 △△부에서는 물품검사원 및 입회원 임명[자동제세동기 전달 및 조난자 수색용 드론 구매][△△부-7671호(2020.09.24.)]을 하여(검사원: △△△△부 △급 △△△, 입회원: △△부 △급 △△△) 물품 검사업무를 완료하고 검사조서를 제출할 것을 물품검사원의 소속부서인 △△△△처 △△△△부에 문서로 통보하였다.

그러나 아래 [그림2]와 같이 △△△△ △△에서는 같은 날(2020. 9. 23.) 코로나-19로 인해 해외구매 주요자재 납품 지연을 사유로 당초 납품기한(2020. 9. 26.)을 변경(2020. 10. 19.)요청하는 “자동제세동기 전달 및 조난자 수색용 드론 구매 납품기한 변경 요청의 건(△△△)”을 물품 구매 감독원(△급 △△△)의 소속부서인 △△△△처 △△△△부에 제출하였고, 이와 관련하여 △△△△부에서는 “납품 기한 연장 요청[자동제세동기 전달 및 조난자 수색용 드론 구매][△△△△부-2990호(2020.09.29.)]”을 △△부로 제출하였다.

## **[그림2] 물품계약서 및 검사검수요청서**

납품기한 변경 요청의 건(2020. 9. 23.) ㉮㉮㉮→㉮㉮㉮㉮부

납품기한 연장 요청(2020. 9. 29.) ㉮㉮㉮㉮부→㉮㉮부

감독원인 ㉮㉮직 ㉮급 ㉮㉮㉮은 공단「공사업무집행규칙」제18조(공사감독관 등의 임무)제1항에 따라 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 동규칙 제43조(준공판단)에 따라 공사집행(감독)부서의 장은 준공 전월에 공사 진척이 예정 공정보다 미달하고, 준공 예정일내에 완공이 불가능할 경우 부진 사유 및 그에 대한 대책을 사업총괄부서의 장에게 보고하여야 했다.

그러나 감독원인 ㉮㉮직 ㉮급 ㉮㉮㉮은 드론 구매 납품기한(2020. 9. 26.) 3일 전 ㉮㉮㉮㉮ ㉮㉮에서 같은 날(2020. 9. 23.)에 제출된 “검사검수요청서”(㉮㉮부 제출)와 “드론 구매 납품기한 변경 요청의 건”(㉮㉮㉮㉮부 제출)을 통하여 업체에서 물품 납품 기한준수에 대한 문제점이 있음을 문서로 확인하였으며, 감독

원으로서 사업 진행 기간 동안 물품 제조의 진행 사항을 충분히 알고 있었음에도, 기한내 납품이 불가능할 경우 부진 사유 및 그에 대한 대책을 사업총괄부서의 장에게 보고하지 않고 업체에서 제출한 드론 구매 납품기한 변경 요청의 건을 근거로 납품기한(2020. 9. 26.)이 지난 2020. 9. 29. “납품기한 연장 요청”을 △△부로 제출하여 감독원으로서 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

#### 나. 물품검수 결과에 따른 감독원 업무 처리 소홀

물품 납품업체 △△△△ △△는 나라장터 전자문서를 통하여 2020. 10. 14. 검사검수요청서(검사검수요청번호: 9020116737000)를 제출하고 공단 △△부에서는 물품검사원 및 입회원 재임명[자동제세동기 전달 및 조난자 수색용 드론 구매][△△부-8250호(2020.10.15.)]을 하였다.

이에 따라 △△△△처 △△△△부에서는 2020. 10. 15.~11. 3.(10일간) 총 16개 국립공원사무소에 대해 검사원 및 입회원, 본사 및 사무소 직원, 전문가, 납품업체 등이 참여하여 드론 1차 검사를 실시하였으며, 아래 [표2]에서와 같이 총 3가지 검사 기준을 통과하지 못한 결과를 도출하였다. 「자동제세동기 전달 및 조난자 수색 드론 검사 결과 보고」 [△△△△부-3336호(2020.11.09.)]

[표2] 자동제세동기 전달 및 조난자 수색용 드론 구매 검사결과(1차)


| 구분 | 분야 | 검사결과 | 비고                               |
|----|----|------|----------------------------------|
|    |    |      | △△△△부<br>-3336호<br>(2020.11.09.) |

※ 자료: △△△△부 제출자료 재구성

드론 구매 검사결과(1차)에 따라 아래 [그림3]에서와 같이 물품 납품업체  
△△△△ △△는 환경시험결과는 기 제출한 시험성적서로 인정(공단이 입장 수용)  
하고 광학카메라 조치 필요한 부분과 특수임무장비 조치 필요 부분에 대해서는  
입장을 불수용한다는 입장을 공단으로 2차례 통보(2020. 11. 10., 11. 17.)하였으며,  
이에 따라 「드론 장비 합동 재점검」을 2020. 11. 19. 요청하였다.



[그림3] 지체상금 부과 통보 및 계약이행 촉구 관련 업체 입장 통보, 드론 장비 합동 재점검



이에 따라 △△부에서는 물품검사원 및 임직원 재임명[자동제세동기 전달 및 조난자 수색용 드론 구매][△△부-9315호(2020.11.20.)]을 하고 △△△△처 △△△△부에서는 2020년 11월 25일 △△△△△△△△△△에서 검사원 및 임직원, 본사 및 사무소 직원, 전문가, 납품업체 등이 참여하여 드론 재검사를 실시하였으며, 아래 [표3]과 같이 1가지(특수임무장비)에 대한 오류가 발생하여 다음날인 2020. 11. 26. 드론을 신규교체 하였다고 재검사 결과 보고를 하였다. 「자동제세동기 전달 및 조난자 수색 드론 재검사 결과 보고」[△△△△부-3630호(2020.11.30.)]

[표3] 자동제세동기 전달 및 조난자 수색용 드론 구매 재검사 결과 보고(2차)

| 구분 | 분야 | 검사결과                                          | 비고 |
|----|----|-----------------------------------------------|----|
|    |    | 하위용 차량타는 차량의 안전성 여부 (4.000(3.000)점) 확인 결과, 확인 |    |
|    |    |                                               |    |
|    |    |                                               |    |

※ 자료: △△△△부 제출자료 재구성

[그림4] 납품검수표



그러나 계약관련 증빙자료를 확인한 결과, 감독원인 △△직 △급 △△△은 1차 드론 검사결과 자료에서 3가지 문제점 외에 위 [그림4]에서처럼 전문가 납품검수표에서는 납품 품목 규격 분야에서 드론기체, 특수임무장비, 지상관제시스템(GSC), IR카메라 등 재검사·재측정 필요에 대한 다수의 오류사항에 대하여 문제점이 제기되어 있었음에도 불구하고 조치사항에 대한 근거자료 확보, 내부결재 등 결과보고를 하지 않았으며, 2차 드론 재검사 결과 보고에서도 특수임무장비인 드론에 대한 신규교체를 하고도 세부적인 검사를 실시한 것에 대한 근거자료 확보, 내부결재 등 결과에 대한 근거를 남기지 않은 채 2020. 11. 30. 용역완료 검사조서를 △△부로 제출[△△△△부-3631호(2020.11.30.)]하였다.

이에 따라 감독원 △△직 △급 △△△은 용역감독원으로써 용역검사에 대한

사후조치 결과에 대한 근거자료 없이 용역완료검사조서를 제출하여 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

## 관련부서 의견

△△△△처 △△△△부에서는 감사결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 하도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

이사장(△△처 △△△△부장)에게 자동제세동기 전달 및 조난자 수색용 드론 구매 감독원 업무를 소홀히 한 △△직 △급 △△△에 대하여 “신분상 경고” 처분을 요구합니다.(경고 1)

※ 본 건은 공단 「인사사무규칙」 [별표4] 징계양정기준의 1. 성실 의무 위반(다. 직무 태반)에 해당되어 징계 요구하여야 하나, 징계시효(행위 종료 시점 2020.11.30.로부터 3년) 만료에 따라 신분상 경고 처분을 요구함.

### [관련자]

| 구분 | 직 급    | 성 명 | 담당업무           | 소속<br>(현 근무처)                  | 처분요구   | 비고<br>(담당기간)             |
|----|--------|-----|----------------|--------------------------------|--------|--------------------------|
| 1  | △△직 △급 | △△△ | △△△△△△△△△<br>△ | △△△△처 △△△△부<br>(現 △△△△처 △△△△부) | 신분상 경고 | 2019.1.24.~<br>2021.3.6. |

이사장(△△△△처 △△△△부장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)
