

통 보(우수사례)

1. 제 목: 공공개발 계약기반 사업관리시스템 전산구축을 통한
업무 체계화 및 효율성 제고
2. 소관부점: 공공개발지원처
3. 내 용:

가. 업무개요

공공개발지원처 ○○○ 과장(4급)은 2022. 10. 17.부터 2024. 6. 30.까지 「공공개발사업 관리시스템 구축 추진단」에서 공공개발 건설사업관리 시스템 개발 시 사업프로세스 기반 계약정보 통합관리 및 사업관리 문서·기록 전산화 업무를 수행하였다.

나. 업무 처리 경과

공사는 국·공유재산 및 공공기관 보유재산의 개발업무(개발 기획, 건축, 관리)를 수행하고 있는데 단계별로 진행되는 건설사업관리 소과정을 통합 관리할 수 있는 전산 시스템이 미비하여, 공공개발본부 중장기전략 실행의 일환으로 공공개발지원처는 2022년 11월 「공공개발사업 관리 시스템⁷⁹⁾(이하 “관리시스템”이라 한다) 구축 추진단」을 설치하여 개발사업자 및 감리단을 선정하고 현업 담당자 인터뷰 및 시스템 설계, 전산화면 개발 등을 통해 시스템을 개발하여 2023. 3. 4. 관리시스템을 오픈하였다.

79) 공공개발사업 기획, 건설, 임대, 관리 통합시스템 구축(예산 130억 원, 개발기간 '22. 11월 ~ '24. 5월)

위 직원은 관리시스템의 개발 과정에서 ‘계약정보’ 기반 사업프로세스 통합구축을 담당하였는데, 기존 업무는 건설사업 단계별 업무가 연계되지 않고 K-Wings 전자문서와 일반 수기문서에 의존하여 업무를 처리하고 있어, ①사업이력 및 계약 건별 공정·예산관리가 체계적이지 않고, ②계약 대금 초과지급 및 누락 우려가 있으며, ③수기문서로 인한 기록물 관리에 어려움이 있는 것을 확인하였다.

이에 계약정보 기반 통합관리 전산 체계를 구축하여, ① 계약체결 건에 대해 고유코드인 계약번호를 부여하여 각종 계약 정보를 입력·관리할 수 있게 하였고, 계약정보를 기초로 공정을 관리 및 기성검사·설계변경·대금지급 등 각종 사업관리 업무를 수행하도록 하였으며, 수의계약 이력⁸⁰⁾ 관리가 가능하게 하였다.


[그림 18] 계약정보 통합관리 화면



80) 계약체결 전 업체 기록(계약 횟수, 금액 통계)을 확인하여 특정업체 편중 계약통제 제고


② 또한, 계약건별 대금지급 관리 기능을 추가하여 대금 지급 시 계약데이터를 연계하여 전체 계약금액 확인 후 기지급액 및 미지급잔액을 관리하며 이중지급 발생 가능성을 제거하였고

[그림 19] 계약데이터와 대금지급 업무 연계



③ 건설사 등 외부업체가 접속 가능한 건설관리시스템을 개설하여 기존 수기문서 발수신 업무를 전자문서 작성 및 전자발송이 가능하도록 개선하였으며, 과거 10개년 약 30만 건의 전자문서를 분류·등록하여 업무단위별·사업장별 이력 확인이 가능하도록 통합문서관리시스템을 구축하는 등 건설사업관리 관련 문서와 기록을 전산화하였다.

[그림 20] 외부업체 전산보고 체계 구축

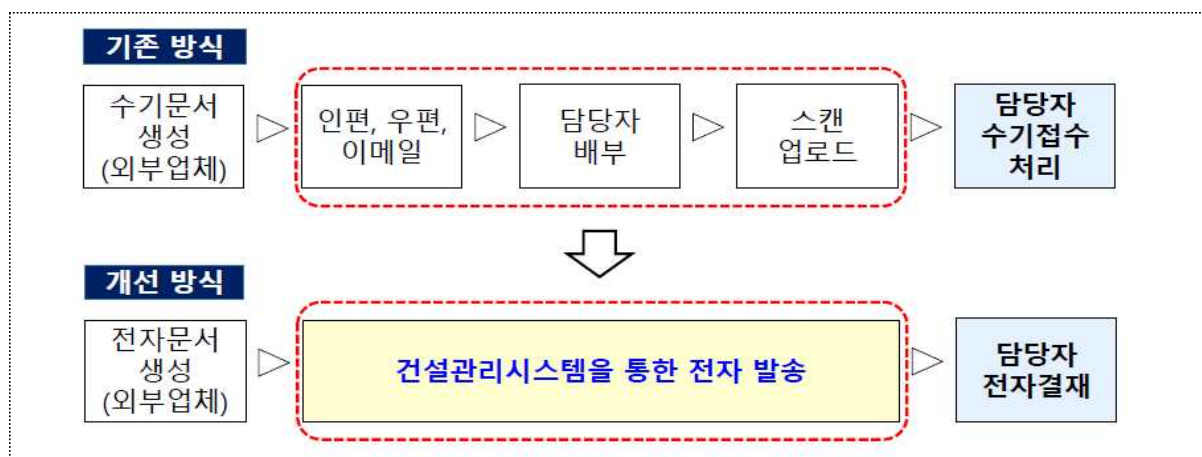

다. 실적 또는 성과

①계약정보 기반 건설사업관리 업무 연계를 강화하여 건설사업관리 업무를 체계화하였고, 수의계약 이력 관리를 통해 특정업체 계약 편중을 사전에 통제 가능하도록 하였으며, ②대금 지급 지연 및 동일계약·동일 차수 대금의 이중지급 발생 가능성을 제거하여 자금 관련 리스크를 예방하였고, ③기록물의 안전한 보존 및 활용이 가능하도록 하여 업무 효율성 제고에 기여하는 등

공공개발 건설사업관리 업무정보 체계화를 통해 ‘운영의 효율성과 효과성’ 관련 공사의 내부통제 강화에 기여하였다.

4. 조치할 사항

공공개발지원처장은 공공개발 관리시스템 개발 시 계약정보 통합 관리 전산 체계 구축 등 건설사업관리 업무정보 체계화를 통해 공사 내부통제 강화에 기여한 ○○○ 과장(4급)을 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다. (통보)
