

## 한전KDN(주) 상임감사 개선 요구

제 목 대내 연구과제 수행 절차 개선 필요

소 관 부 서 □□□□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□□□(△△△△부)

구 분 연구관리(과제관리)

내 용

### 1. 업무 개요

□□□□□□□□ △△△△부는 R&D 전략 기획, 지식재산권 관리, 연구개발과 관련하여 규정, 절차서, 지침서를 제정 및 개정하는 등 대내·외 연구과제를 관리하는 업무를 수행하고 있다.

### 2. 관계 법령·규정 및 판단기준

① 「대내 연구과제 수행 절차서」 6.1.4(연구과제 결과보고서 작성)에 따르면 연구과제 결과보고서는 특별한 경우를 제외하고는 연구기간 종료 후 1개월 이내에 작성하며, 분할과제인 경우에도 연구과제 결과보고서를 작성하여야 한다. 또한 동 절차서 6.2(연구과제 결과평가)에 따라 연구과제 결과 평가는 연구기간 종료 후 3개월 이내에 실시하며, 분할과제인 경우에도 동일하게 하여야 한다. 단 연구개발부문장은 결과평가단 운영의 효율성을 위해 평가회의 개최시기를 조정할 수 있다.


② 그리고 동 절차서 6.2.3(연구과제 결과 평가) 3)에 따르면 결과평가 결과 평가위원의 최고·최저 점수를 제외한 평균점수가 80점 이상 시 연구과제 '성공'으로

규정하고, 60점 이상 80점 미만인 연구과제에 대해서는 ‘미흡’, 60점 미만인 연구과제에 대해서는 ‘실패’로 규정하여 평가를 시행하고 있고, ‘미흡’, ‘실패’인 연구과제는 평가결과 통보 1개월 이내에 “평가 의견에 대한 조치 계획/결과서”를 연구부서에 제출하여야 하며 일정 기간 동안 현장과제를 제안할 수 없도록 규정하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

① □□□□□□□□이 ‘○○년부터 ‘○○년까지 수행한 연구과제 ××건을 확인한 결과 연구기간 종료 후 1개월을 초과하여 결과보고서를 작성한 건이 ××건 확인되었다. 하지만 연구과제 결과보고서를 작성하였다고 연구가 종료되는 것은 아니었으며, 연구과제 결과보고서를 활용하여 연구기간 종료 후 3개월 이내에 결과평가를 시행하는 등 연구과제 결과보고서를 1개월 이내에 작성해야 할 이유가 존재하지 않았으며, 연구과제 종료는 [그림 1]과 같이 결과보고 및 결과 평가 이후 평가 통보일로부터 1개월 이내에 연구과제 수행결과보고서를 작성하고 연구결과를 이관하여야 해당 연구과제가 종료된다.

[그림 1] 대내 연구과제 수행 흐름도

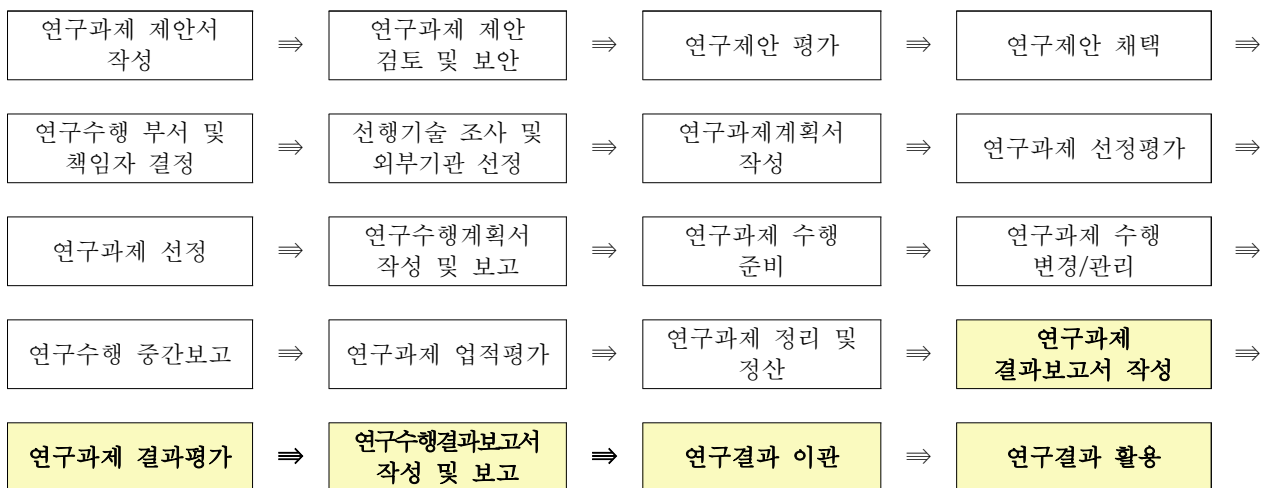

② 그리고 대내연구과제(과제명 : DAS 적용 S/W 보안모듈 최적화 개발) 결과평가 시 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 보안성 검토가 끝나지 않았다는 이유로 평가를 진행하지 않고, 절차서 상에 존재하지 않는 ‘보류’라는 평가결과를 결정하였고, 이와 같은 경우 해당 연구과제에 대해 보안성검토가 완료되는 시점까지 연구기간 연장을 하

거나, 절차 상 ‘보류’가 가능하도록 절차서를 개정하여야 하나 어느 것도 이루어지지 않아 절차상 문제가 발생하였다.

따라서 「대내 연구과제 수행 절차서」의 불필요한 내용을 삭제하거나 개정하여 연구 활동에 전념할 수 있도록 관련 절차를 개선할 필요가 있다.

## 관계부서 의견

□□□□□□□□은 연구과제를 수행하는 절차가 복잡하고 행정절차에 많은 시간을 소모하고 있어 관련 절차를 간소화해야 할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

□□□□□□□□장은

- ① 「대내 연구과제 수행 절차서」의 연구과제 결과보고 기간 및 연구과제 활용 실적 관리 등 불필요하거나 중복되는 절차가 있는지 검토하여 관련 절차서를 개정하시고, (개선)
- ② 통제 할 수 없는 불가피한 사유(인증, 관련 유관기관의 문제 등)으로 연구과제의 평가 지연시에는 ‘평가보류’로 업무 절차를 관리하시고, 관련 내용을 반영하여 절차서를 개정하시기 바랍니다. (개선)
