

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 데이터전략 관련 정보화계획의 이행 불철저
2. 소관부점 : 정보시스템실
3. 내 용 :

가. 업무개요

정보시스템실은 「업무분장세칙」 제10조에 따라 공사의 정보시스템 개발·관리 및 운영(이하 “정보화 업무”라 한다)의 주무부점으로서 「정보화 업무요강」 제5조 및 제6조에 따라 공사의 중장기 정보화전략계획을 수립하고 매년 정보화 수요에 맞게 정보화계획을 수립하여 시행하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「정보화업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제5조에 따르면 정보시스템 실장은 정보기술의 변화와 공사의 중장기 경영전략에 맞추어 중장기 정보화전략계획을 수립¹⁾하여야 하고, 정보화전략위원회²⁾(이하 “위원회”라 한다) 의결을 거쳐 확정한다고 되어 있으며

요강 제6조에 따르면 정보시스템실장은 요강 제5조의 정보화전략

-
- 1) 「전자정부법」 제5조의2 제1항에 따라 5년마다 전자정부 구현·운영 및 발전을 위한 기본 계획 수립이 의무화됨
 - 2) 정보화전략계획, 이사회 부의 대상 정보화사업 등 정보화업무에 관한 주요사항을 심의·의결하기 위하여 설치된 위원회로서 위원장은 부사장으로 함


계획, 공사의 예산 및 경영계획 등을 고려하여 매 연도 정보화대상 사업 계획(이하 “정보화계획”이라 한다)을 수립³⁾하여 시행하여야 한다고 되어 있다.

이러한 정보화계획의 실질적인 시행을 위해 정보시스템실장은 「회계사무세칙」 제82조에 따라 다음연도 정보화사업에 대해 「공기업·준정부기관 예산편성지침」을 준수하여 사업의 범위, 필요성, 도입 추정금액 등을 검토하여 예산집행계획을 수립하고 기획조정실장(예산 관리자)에게 예산요구서를 제출하여 예산을 확보한 후 정보화사업을 착수하여야 한다.

따라서, 정보시스템실장은 중장기 정보화전략계획을 매년 정보화계획에 반영하여 수립하여야 할 뿐만 아니라, 관련 예산을 신청한 후 정보화 사업을 착수하여 정보화전략위원회에서 심의·의결한 정보화계획이 실질적으로 이행되도록 하는 것이 타당하다.⁴⁾

3) 「전자금융거래법 시행령」 제11조의2 제3항에 따라 공사의 정보화계획을 매년 사업연도 초일부터 3개월 이내에 금융위원회에 제출하고 있음

4) 중장기 정보화전략계획 수립과 연간 정보화계획 수립 및 시행 절차도

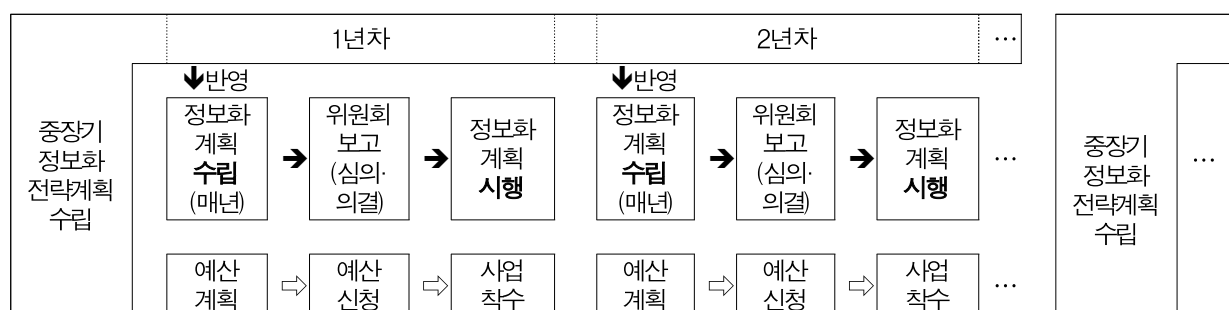


다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2016년 및 2020년 수립한 중장기 정보화전략계획과 이를 반영하여 수립한 매 연도 정보화계획의 이행 실태를 점검한 결과

2016년 수립한 중장기 정보화전략계획은 [그림 1]과 같이 공사 경영비전 달성을 위해 5개 IT전략방향으로 수립하였고, 그 중 ‘적시 의사결정을 지원하는 분석통계정보 제공’ IT전략방향(이하 “데이터전략”이라 한다)은 ‘BI⁵⁾고도화’, ‘통합EDW⁶⁾고도화’, ‘빅데이터 체계 구축’을 각각 2017년, 2018년, 2019년 수행해야할 단계별 이행과제로 구성하였으며

[그림 1] 2016년 수립한 중장기 정보화전략계획 체계도

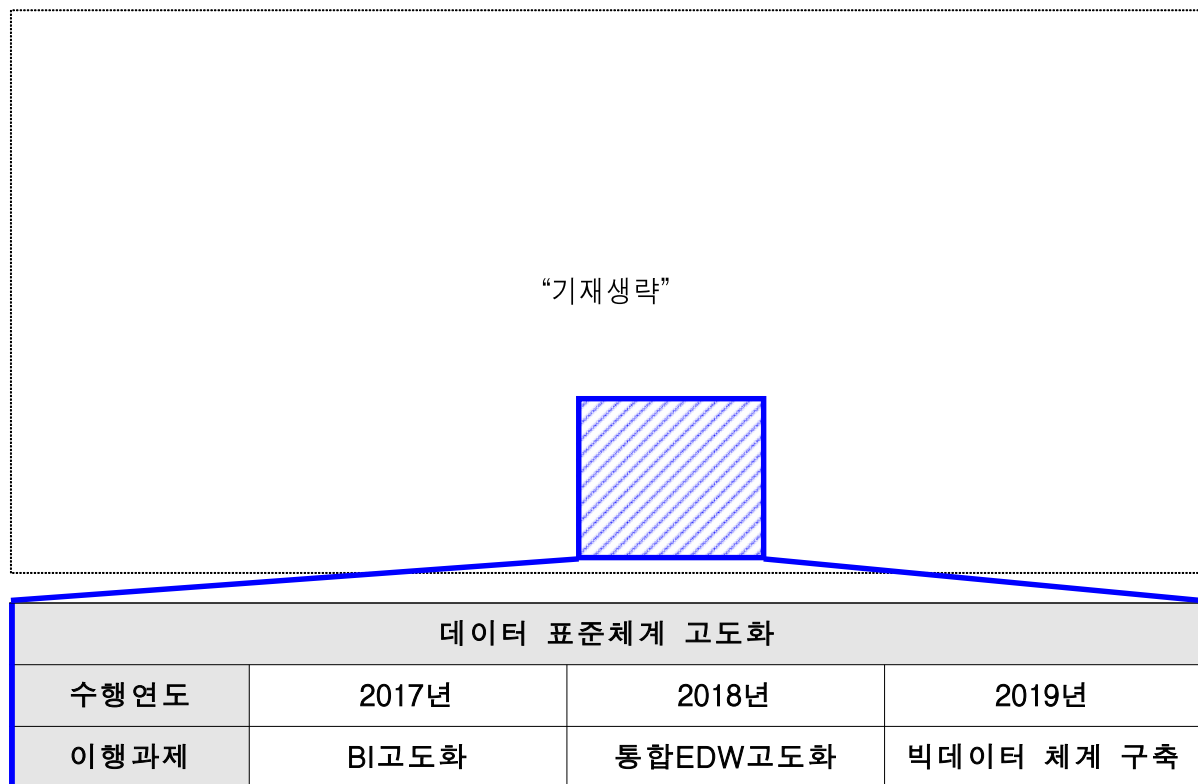

5) BI(Business Intelligence) : 기업의 데이터를 수집, 정리, 분석하고 활용하여 효율적인 의사결정을 돕는 시스템

6) EDW(Enterprise Data Warehouse) : 전사적 데이터를 체계적으로 통합하고 공유하는 시스템

이에 따라 공사의 경영의사결정 지원과 데이터 표준체계 고도화를 위한 데이터전략은 매 연도 정보화계획에 반영하여 위원회에 보고하고, 매년 관련 예산을 신청하여 정보화사업을 착수하는 등 중장기 정보화 전략계획의 데이터전략이 차질 없이 시행되도록 하여야 하는데도

2017년 정보화계획을 수립하면서 데이터전략 관련 3가지 이행과제를 2017년부터 단계적으로 시행할 것을 2017. △. △△. 위원회에 보고하여 심의·의결 받았으나

2017년에 시행 예정이었던 ‘BI고도화’ 이행과제는 2017년 정보화예산 편성 시 예산 신청을 누락하여 관련 정보화사업을 착수하지 못하고 다음 연도로 연기하였으며, 2018년에는 국유업무 소관부점의 요청에 의한 ‘국유 스마트통계(BI)’ 사업만 예산에 반영하여 시행하고 그 외 ‘BI고도화’ 이행과제는 여전히 시행하지 않고 다음 연도로 연기하였으며, 2019년에도 위원회에 보고만 하였을 뿐 관련 예산 신청도 하지 않는 등

[표 9]와 같이 2016년 중장기 정보화전략계획으로 수립한 데이터전략을 매 연도 정보화계획에 반영하여 수립만 하였을 뿐 관련 예산을 신청하고 정보화사업을 착수하는 실질적인 이행은 하지 않은 사실이 있다.⁷⁾

7) 2016년 수립한 중장기 정보화전략계획의 5개 IT전략방향 중 데이터전략을 제외한 4개 IT전략방향은 조세정리시스템 고도화, 임대시설관리시스템 고도화 등 소관부점의 요청에 의한 정보화계획과 망분리 고도화, 그룹웨어 고도화 등 정보시스템실이 주도하는 정보화 계획으로 구성되어 있고 대부분 계획연도에 이행 완료되었음

[표 9] 데이터전략 관련 정보화계획의 이행 현황

이행과제	2017년				2018년				2019년			
	정보화 계획 수립 여부	위원회 보고 여부	예산 신청 여부	사업 착수 여부	정보화 계획 수립 여부	위원회 보고 여부	예산 신청 여부	사업 착수 여부	정보화 계획 수립 여부	위원회 보고 여부	예산 신청 여부	사업 착수 여부

“기재생략”

그 결과 2016년 이후 4년 만에 2020년 중장기 정보화전략계획을 수립하면서 데이터전략 관련 정보화계획의 이행과제를 [그림 2]와 같이 ‘통합 분석 운영 고도화(EDW)’, ‘실시간 의사결정 정보제공 체계 재구축(BI)’, ‘빅데이터 서비스 모델 발굴 및 활용 방안’으로 구성하는 등 2016년 중장기 정보화전략계획의 데이터전략과 유사한 내용으로 다시 계획하게 되었으며

[그림 2] 2020년 수립한 데이터전략 관련 정보화계획

“기재생략”

2020년에 시행 예정인 ‘EDW고도화’ 관련 정보화사업은 ‘BI고도화’ 관련 정보화사업으로 계획을 임의로 변경하여 ‘통합BI보고서 재구축’

사업으로 2020년 정보화예산을 신청하고 2020. △. △△. 타당성 평가를 실시하였으나, 감사일 현재까지 사업 착수를 하지 않는 등 여전히 대부분의 데이터전략 관련 정보화계획이 일정대로 시행되지 않고 있다.

정부는 2020. 6. 5. 「2020 공공기관 혁신 가이드라인」을 발표하며 공공기관이 보유한 데이터의 개방을 확대하고, 빅데이터·IoT·AI 등 데이터를 분석·가공하여 혁신적인 서비스를 제공하는 등 공공기관의 데이터 활용을 강조하는 시점에 있고

공사 내부적으로는 업무시스템의 데이터 부정합, 데이터 비표준화, 통합보고서(BI)의 사용 불편 등 공사의 데이터 활용에 대한 불만이 지속적으로 제기⁸⁾됨에도 불구하고 2016년 중장기 정보화전략계획 수립 이후 ‘국유 스마트통계(BI)’를 제외한 공사의 데이터 관련 정보시스템에 대해 별다른 개선이 이루어지지 않고 있는 실정이다.

이러한 문제점을 해결하기 위해서는 중장기 정보화전략계획의 단계별 이행과제를 계획연도에 미시행한 경우 그 사유를 검토하여 다음연도 정보화전략위원회에 보고하고 정보화전략계획을 수정하도록 하며

정보시스템실에서 주도적으로 수행하는 정보화계획의 경우에도 예산 편성 2개월 전에 타당성 평가를 실시하여 사업의 규모를 확정하고 다음연도 사업 예산을 신청하여 정보화사업 착수가 이루어질 수 있도록 하는 등 정보화계획이 실질적으로 이행될 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

8) 「2016년 중장기 정보화전략계획(ISP) 보고서」(I. 환경 및 현황분석 > 4. 요구사항 분석)의 현업부문 인터뷰 결과를 참고함

「2020년 중장기 정보화전략계획(ISP) 보고서」(II. 현황 분석 > 3. 내부현황 분석)의 내부 직원 인터뷰/설문 결과를 참고함

[소관부점 의견] 정보시스템실은 정부 정책에 따른 긴급한 정보화사업 및 소관부점의 정보화 요구사항을 우선 처리하는데 행정력을 집중하여 공사의 데이터 표준체계를 고도화하는 중장기 정보화전략계획의 수행에는 소홀한 점이 있었으나, 2020년 수립한 중장기 정보화전략계획에 따라 향후 'BI고도화', '통합EDW고도화' 등 데이터전략 관련 정보화사업을 성실히 추진해 나가겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

정보시스템실장은 공사의 중장기 정보화전략계획을 면밀히 검토하여 차질 없이 이행될 수 있도록 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바람 (주의)

데이터전략 관련 중장기 정보화전략계획이 실질적으로 이행될 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)
