

통 보

1. 제 목 : 공유지 위탁개발 사업 추진시 수익성 검토 강화 필요
2. 소관부점 : 남부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공사는 「공유재산 및 물품 관리법」 제43조의2 및 제43조의3에 따라 지자체로부터 위탁받은 공유재산의 자산가치 제고와 공공의 편익을 위하여 관계법령 등에 따라 대상 재산을 개발하는 공유지 위탁개발 사업을 수행하고 있고

남부개발처는 「업무분장세칙」 제28조에 따라 공유지 위탁개발 신규 사업의 추진 여부 검토 기준을 수립하는 등 공유재산 위탁개발 기획 업무를 수행하고 있으며

공유지 위탁개발 사업의 건설관리 업무 효율성 제고와 공사 손익 개선 도모를 위해 2021. 3. 31. 「공유재산 위탁개발 추진대상 최소 사업 규모기준」¹⁾(이하 “최소사업기준”이라 한다)을 수립하여 손익분기 사업비 (△△△억 원) 이상의 사업만 추진하도록 하고 있다.

1) 공사 관점에서의 수익성 측면에 더욱 초점을 맞추어 최대 수취 가능한 개발 수수료가 개별사업 수행 투입비용을 상회하도록 하기 위해 손익분기 사업비 추정치에 변동요인을 고려하여 최소 사업비(건축원가 기준) 규모를 △△△억 원으로 산정하고, 사업비 △△△억 원 이상인 공유 위탁개발 사업만을 추진하는 것을 골자로 하고 있음

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공공개발업무세칙」 제13조에 따르면 공사는 사업타당성을 검토하는 경우 공공성과 수익성 등을 고려하여야 하고, 같은 세칙 제17조에 따르면 공공개발의 재무위험 관리와 지속가능성 제고 등을 위하여 별도 운영 기준을 수립할 수 있다고 되어있다.

따라서, 공유재산 위탁개발 기획 업무를 수행하는 남부개발처에서는 공사의 수익성 및 재무건전성을 유지하기 위해 공유지 위탁개발 추진 대상 사업을 적절히 선정할 수 있는 기준을 수립하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공공개발 협의회²⁾에서 사업계획을 사전 검토하여 추진대상 사업으로 선정한 공유지 위탁개발 사업 △△건(단일사업)을 점검한 결과

공공개발 협의회에서 '21. 2. 23. 검토한 ○○시 ◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇ 위탁개발 사업의 경우 사업비(건축원가 기준)가 △△△억 원으로 남부개발처의 최소사업기준에 따른 기준 사업비 △△△억 원을 충족하여 개발수수료가 투입비용인 직·간접인건비 및 경비를 상회하므로 공사 관점에서 수익성이 있어야 하는데도, [표 5]에서 볼 수 있듯이 공사 관점에서 현금유입의 현재가치에서 현금유출의 현재가치를 뺀 순현재가치(NPV)가 △ △△△억 원으로 나타나는 등

2) 운영기준에서 정하는 사항 및 사업타당성 검토 결과의 사업방향과 사업성 등을 점검

[표 5] 아산시 지중해마을 복합 공영주차타워 개발사업 현금흐름

(단위 : 백만 원)

구분	계	사업기획, 건축			임대 및 건물관리								
		Y-1	Y-2	Y-3	Y-4	Y-5	Y-6	Y-7	Y-8	...	Y-31	Y-32	Y-33

“기재생략”

[표 6]과 같이 공공개발 협의회에서 검토한 공유지 위탁개발 사업 중 ■■군 ◇◇◇ ◇◇◇◇ 등 △건이 남부개발처에서 수립한 손익분기 사업비인 최소사업기준을 충족하였음에도 공사에서 수취하는 수수료 수익이 직·간접인건비 및 경비에 미치지 못하는 것으로 나타났다.

[표 6] 공유지 위탁개발 사업 사전 검토 내역

(단위 : 년, 억 원)


순 번	공공개발 협의회	사 업 명	운영 기간*	협의회 검토결과	사업비 (건축원가)	공사 관점 순현재가치
--------	-------------	-------	-----------	-------------	---------------	----------------

“기재생략”

* 개발사업계획서 기준 사용승인일 익일부터 임대 및 건물 관리 기간의 연수

이는 [표 6]과 같이 공공개발 협의회에서 검토한 공유지 위탁개발 사업 △△건 모두 짧게는 5년, 길게는 30년까지 건물 임대·관리 기간을 준공 후 위탁기간으로 포함하고 있으나³⁾, [표 7]과 같이 최소사업기준의 손익분기 사업비를 계산하는 과정에서는 개별사업 수행 투입비용 산정시 건물 임대·관리를 포함한 전체 사업기간이 아닌 사업기획과 건축관리 등 일부 기간에 투입되는 소요인력만을 사용하고 공사가 위탁자로부터 수취하는 수수료에는 건물 임대·관리의 대가로 발생하는 관리수수료가 제외된 개발수수료만 포함하는 등

[표 7] 최소사업기준 산정 방식

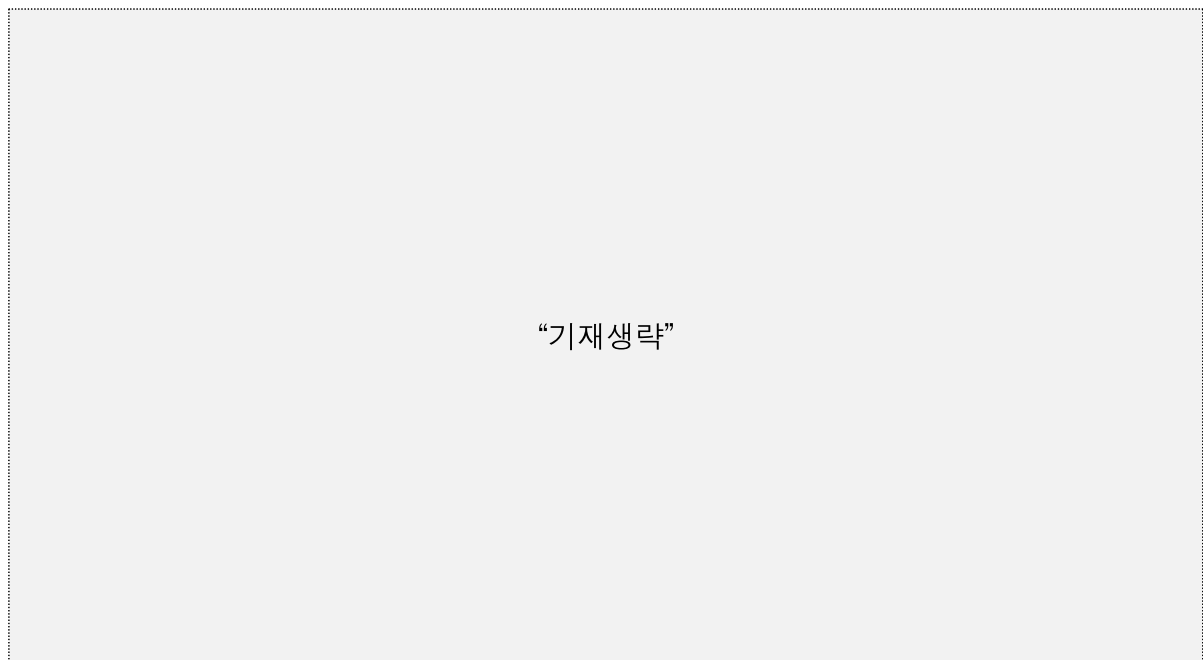

현재 운영 중인 최소사업기준이 사업기획과 건설단계에 한정되어 건설 및 임대·관리 등 전체 공공개발 사업기간 동안의 손익을 반영하여 수익성을 적절히 검토하기에는 미흡한데서 기인하였다.

3) 현재 개발 완료된 공유지 위탁개발 사업장 △△건의 경우에도 위탁기간이 20~30년으로 모두 임대 및 건물 관리가 포함되어 있음

따라서, 공유지 위탁개발의 추진대상 사업 선정시 공사의 손익 개선 도모를 위해 준공 후 건물 임대·관리에 소요되는 투입비용과 수취 수수료 또한 함께 고려하여 실제 공유지 위탁개발 사업을 수행하는 기간에 적합하게 공사의 손익을 예측할 수 있도록 수익성 측면에서의 검토를 강화할 필요가 있는데

특히, 투입비용에 대해서는⁴⁾ 검토하는 공유지 위탁개발 사업 각각의 특성에 맞게 임대 및 건물 관리에 투입되는 인력 및 부대비용 등을 분석하여 직·간접 인건비 및 경비를 적절히 도출하여 공유지 위탁개발 추진대상 사업의 수익성을 면밀하게 검토할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 남부개발처는 최소사업기준은 공사에서 공유지 위탁개발 사업의 건축을 수행할지에 대한 기준이므로 준공 후 임대 및 건물 관리에 대한 것은 따로 보아야 한다고 하면서도, 위탁사업 전체 기간에 대한 공사 관점에서의 손익을 함께 고려해야 한다는 점에 대해서는 동의하였다.

4. 조치할 사항

남부개발처장은 공유지 위탁개발 추진대상 사업 선정시 개발 사업의 현황에 부합하게 사업기획부터 건물 임대·관리까지 공사 관점에서 손익을 반영할 수 있도록 공유지 위탁개발 사업별 투입비용을 분석하고 수익성 검토를 강화할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

4) 수취 수수료에 대해서는, 임대 및 건물 관리 기간 동안의 관리수수료를 기존의 △△~△△% 범위 내에서 지자체와 협의하여 결정하도록 하였던 것에서, 공유지 사업장에 대한 관리업무 분야에 따라 4가지 유형으로 분류하여 적용 수수료 범위를 차등하는 것으로 최근에 기준을 정비하였음(‘공유재산 위탁개발 위탁수수료 적용기준 수립·시행’(남부개발처-5821호, ’21. 6. 15.)
