

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : 적극적인 대관협의를 통한 투자비 절감 및 사업기간 단축
관 계 부 서 : 경인건설본부 구조건설실 구조설계부
모 범 직 원 : 경인건설본부 구조건설실 구조설계부 대리 이승호
내 용

위 직원은 2023년 1월부터 현재까지 경인건설본부 구조건설실 구조설계부에서 전자파 집단민원 및 유관기관 비협조 등 날로 어려워지는 건설환경 여건에도 불구하고 장기 송변전계획에 따라 수립된 전력구 공사의 적기준공을 위하여 많은 노력을 기울이고 있다.

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-12-31 17:00:29

전력구 공사의 도로 및 녹지 점용 관계 법령에 따라 적법한 인허가 업무를 수행함에 있어 해당 지자체의 자의적 해석 또는 주관적 판단 등으로 업무수행에 어려움이 있었으나 이에 적극적으로 대응하여 최적의 지중계통 구성을 가능하도록 함으로써 건설 투자비 절감과 공사기간 단축에 크게 기여하였다.

「인천지역 전기공급시설 전력구공사(르르분기)」는 기설 ㄱ스-○○T/L 분기 후 154kV 르르변전소 연결을 통해 현재 단일계통(신ㄱ스-르르)인 르르변전소의 계통보강을 위한 사업이다.

[그림 1] 르르변전소 인접 계통도 및 청라분기 전력구공사 공사계획도

익명화	익명화
인 접 계 통 도	공 사 계 획 도

ㄱㅅ-ㅇㅇT/L은 르르지구 북부에 위치한 연희공원 내 도로에 위치하며 연희공원부지 점용 인허가관련 업무는 인천광역시 ㄱㅇ공원사업소가 담당하고 있다. 업무 담당자는 수직구 설치를 위해 ㄱㅇ공원사업소와 점용허가 최초 협의를 시작하여 6개월 이상 수차례의 방문협의 및 유선협의 등을 지속하였으나 ㄱㅇ공원사업소는 매번 그 사유를 달리하며 공원점용을 완강히 거부하였다.

[그림 2] 공원 및 도로점용 불가 회신


익명화	익명화
공원점용 불가 회신	도로점용 불가 회신

이에 업무 담당자는 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행령」 제22조 점용허가가 가능한 대상 시설물인 전력구의 공원점용 불허는 인허가 기관의 부당한 처분임을 이해시키고, 적법하게 업무를 처리할 수 있도록 합리적으로 대응한다면 한전의 계획 노선으로 충분히 점용가능 할 것으로 판단하고, 과거 감사원의 「지중송전설비의 도시공원 등 점용관련 법령개정 필요의견」 자료, 인천 관내 공원점용 사례(주소 및 사진), 행정심판 및 소송사례 등을 준비하여 2개월간 재협의를 시행하였고, 최종 지자체의 점용가능 의견을 회신받아 3개월의 공기단축 및 40억원의 투자비 절감에 크게 기여하였다.

[그림 3] 대관협의를 활용 자료

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-12-31 17:00:29 익명화	익명화	익명화
감사원 의견자료	인천 서구 점용사례	행정심판 준비자료

[그림 4] 재협의 전·후 노선 및 공사비 변경사항

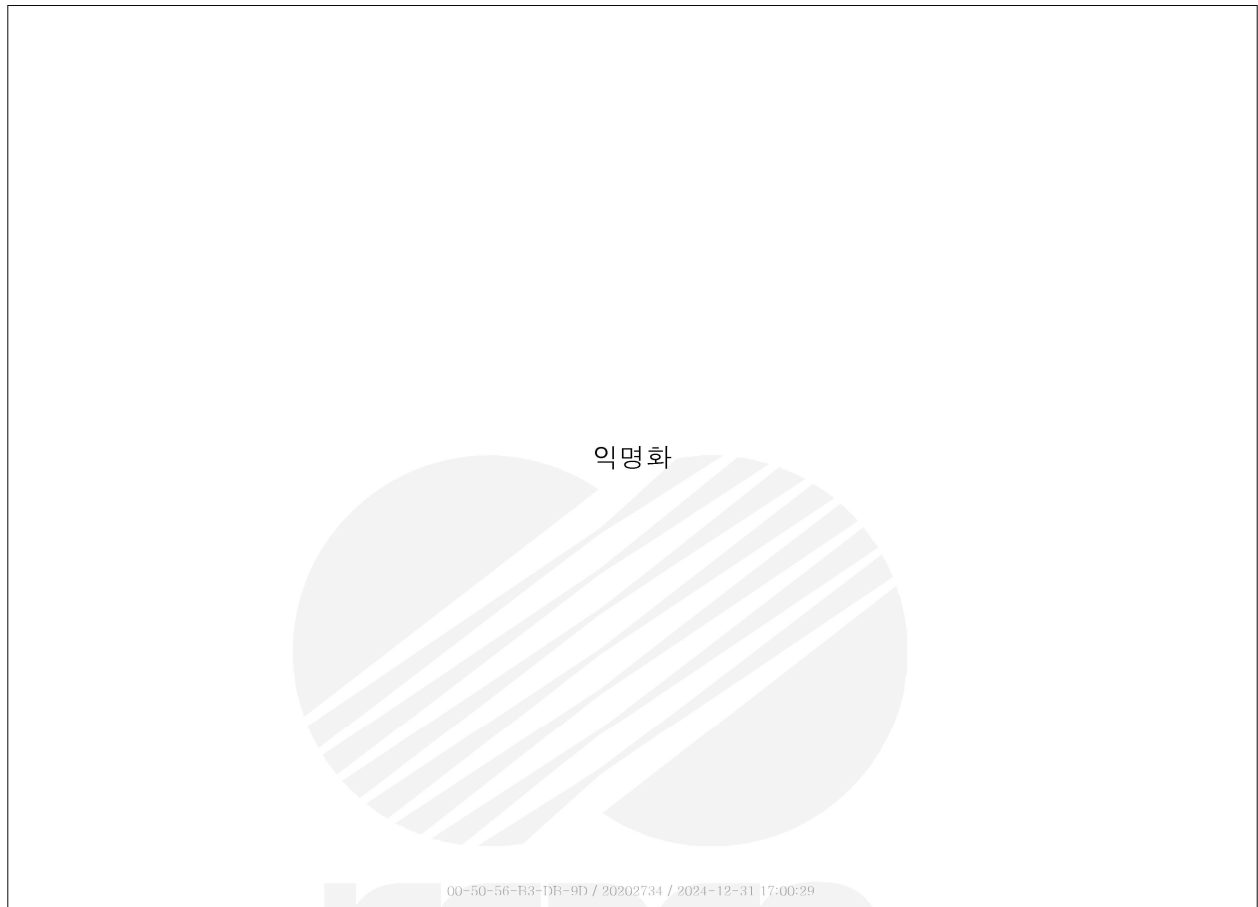

구 분	지자체 요구안	한전 추진안	증 감
터널연장	580m	300m	-280m
공사기간	21개월	18개월	- 3개월
총공사비	179억원	139억원	약 40억원

조치할 사항

경기북부분부장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

(통보)
